



รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง รวม 14 โครงการ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

1






โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผู้รับจ้าง	บริษัท เอกธনীช เพ็ญท์ จำกัด
เลขที่สัญญา	080/2565 ลงวันที่ 16 ก.ย. 65
วงเงินก่อสร้าง	25,300,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	17 ก.ย. 65 - 1 ก.ย. 66 (350 วัน) (อยู่ระหว่างคิดราคางานเพิ่มเติมเพื่อแนบทำยสัญญาครั้งสุดท้าย)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	350 วัน (100%)
ความก้าวหน้างาน	98.00%
งวดงาน	7/8 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	10 คน






1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์




1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิชาการสุนทศศาสตร์

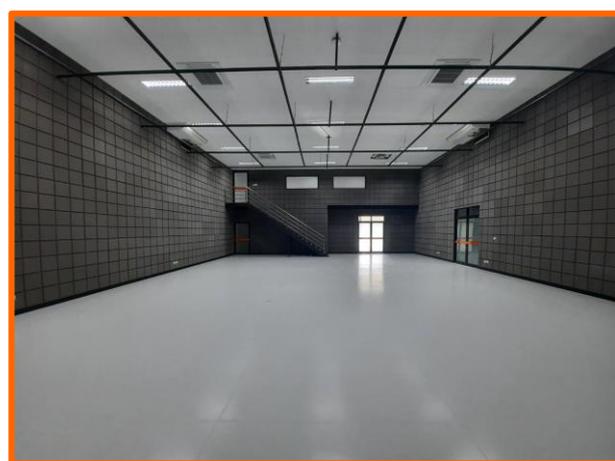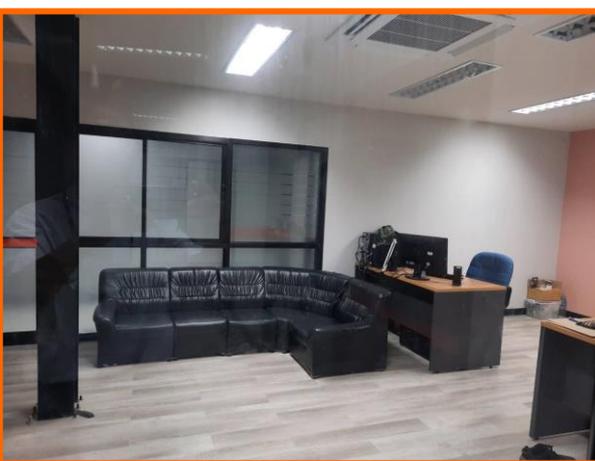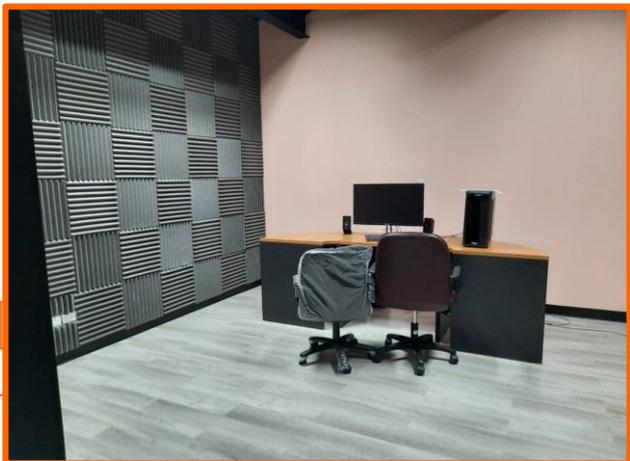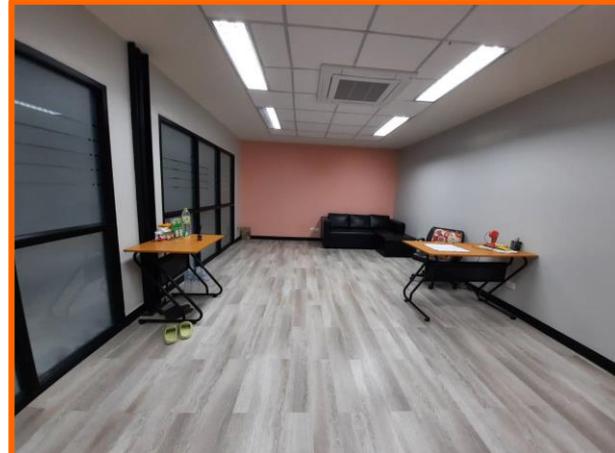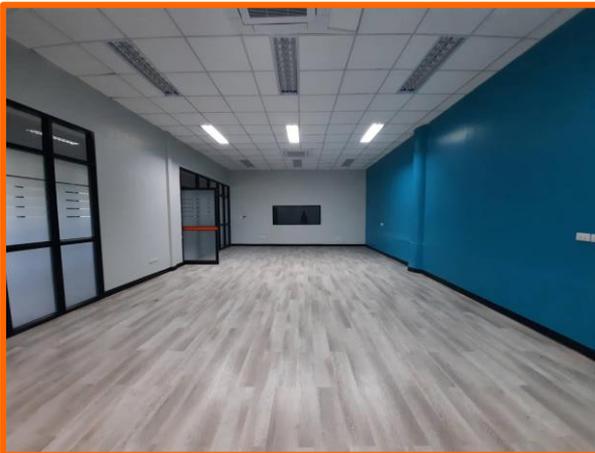

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิชาการสหเวชศาสตร์

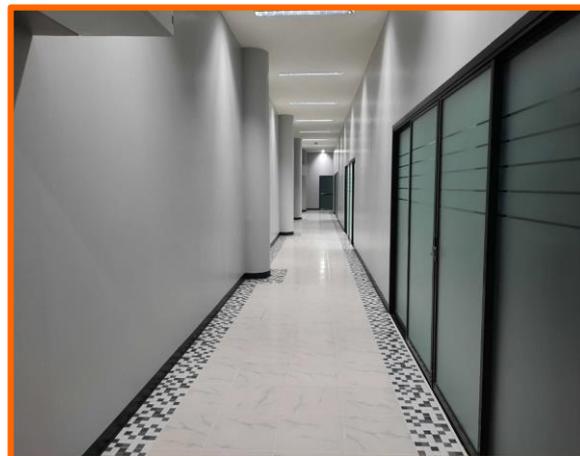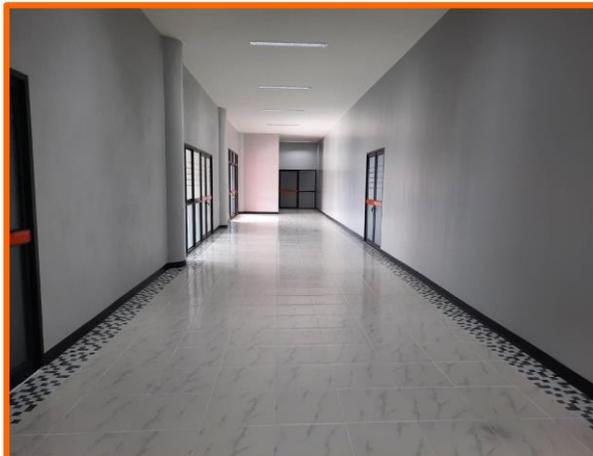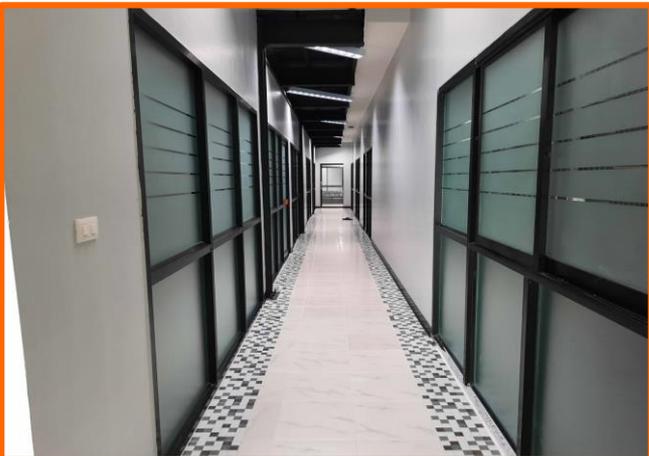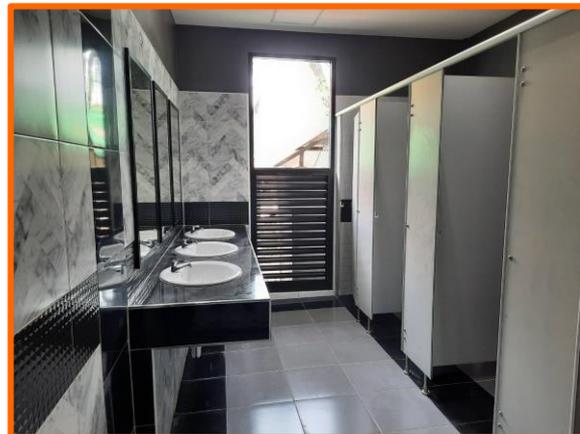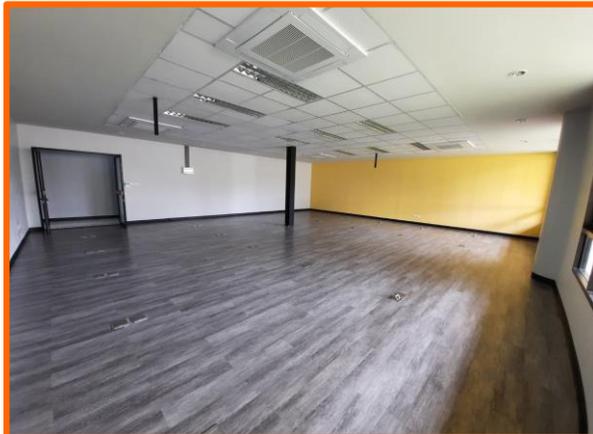

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

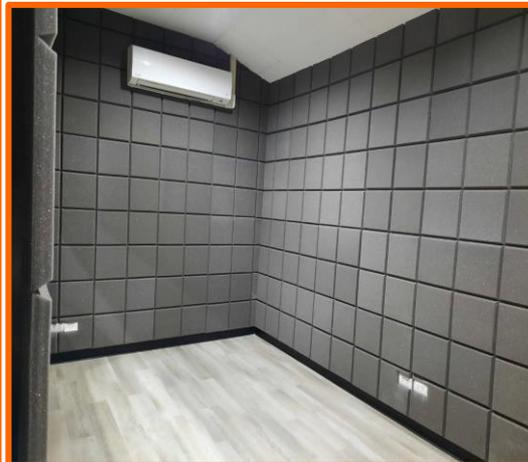

ความก้าวหน้างาน

- เก็บรายละเอียดงานต่างๆ
- งานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศพร้อมใช้งานแล้ว
- ขนย้ายครุภัณฑ์และเริ่มใช้งานอาคารแล้ว
- อยู่ระหว่างการคิดราคางานเพิ่มเติม เพื่อแนบทำสัญญาและตรวจรับงานต่อไป

2

โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง	บริษัท นิธิรัฐกร เอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขที่สัญญา	019/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 65
วงเงินก่อสร้าง	69,860,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	2 ธ.ค. 65 – 8 พ.ค. 67 (524 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	365 วัน (69.66%)
เหลือระยะเวลา	159 วัน (30.34%)
ความก้าวหน้างาน	69.44%
งวดงาน	6/10 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	60 คน

2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



สถานีสูบน้ำดิบ

- งานโครงสร้างคอนกรีต+โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูน แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งราวกันตก แล้วเสร็จ 90 %
- งานเดินท่อเมนสูบน้ำดิบ แล้วเสร็จ 90 %
- ติดตั้งปั้มน้ำดิบ ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด

2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ระบบการผลิตน้ำประปา

งานติดตั้งถังตกตะกอน ถังกรอง ถังเก็บน้ำใส และ
การเดินท่อต่อเชื่อมแล้วเสร็จ 98 %

2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



สถานีโรงผลิต

1. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 80 %
2. งานฉาบปูนผนัง และโครงสร้าง แล้วเสร็จ 70 %
3. งานปูกระเบื้องห้องน้ำ แล้วเสร็จ 50 %

2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



สถานีโรงผลิต

4. งานเดินท่อระบบสูบน้ำแล้วเสร็จ 80 %
5. งานติดตั้งปั๊มลมล้างยอน จำนวน 4 ชุด แล้วเสร็จ 80 %
6. งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 9 ชุด แล้วเสร็จ 80 %
7. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 เครื่องแล้วเสร็จ 80 %

2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานอื่นๆ

1. งานก่อสร้างกำแพง แล้วเสร็จ 3 ด้าน คิดเป็น 65 %
2. งานวางท่อระบายน้ำฝน และบ่อบัก คสล. รอบโครงการ แล้วเสร็จ 85 %

2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานอื่นๆ

3. งานบ่อพัก เชื่อมประสานเมนประปาเดิมกับใหม่ แล้วเสร็จ 95 %
4. ขุดบ่อทิ้งตะกอนแล้วเสร็จ และเทคอนกรีตคานโดยรอบ


ครุภัณฑ์มีแผนการนำเข้าหน่วยงานเพิ่มเติม ดังนี้

- บีมสูบล้างน้ำดี จำนวน 4 ชุด และบีมล้างย้อน 2 ชุด เข้าหน้างาน 15 ธ.ค. 66
- อุปกรณ์จ่ายสารเคมี 7 ชุด เข้าหน้างาน 15 ธ.ค. 66

หมายเหตุ แผนการส่งงานงวดที่ 7 ปลาย ธ.ค. 66

3

โครงการปรับปรุงอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่สัญญา	140/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ. 66
วงเงินก่อสร้าง	64,212,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	7 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 67 (377 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	269 วัน (71.35%)
เหลือระยะเวลา	108 วัน (28.65%)
ความก้าวหน้างาน	60 %
งวดงาน	5/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	75 คน

3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1

1. งานผนังภายใน แล้วเสร็จ 99 %
2. งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 95 %
3. งานทาสีผนัง+ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 80 %
4. งานปูกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ 66 %

3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1

5. งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่างต่าง แล้วเสร็จ 92 %
6. งานติดตั้งกระเบื้องห้องน้ำ แล้วเสร็จ 95 %

3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2

1. งานผนังภายใน แล้วเสร็จ 99 %
2. งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 9 %
3. งานทาสีผนัง+ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 25 %

3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2

4. งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่างต่างแล้วเสร็จ 81 %
5. งานติดตั้งกระเบื้องห้องน้ำ แล้วเสร็จ 70 %

3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3

1. งานผนัง แล้วเสร็จ 98 %
2. งานทาสีผนัง แล้วเสร็จ 40 %
3. งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ 41 %

3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานสถาปัตยกรรมภายนอก

1. งานฉาบผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 99 %
2. งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ 80 %
3. งานติดตั้งคอมโพสิตผนัง แล้วเสร็จ 23 %

3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานระบบไฟฟ้า

1. เดินท่อร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90 % ชั้น 2 แล้วเสร็จ 80 %
ชั้น 3 แล้วเสร็จ 46 %
2. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้น 1 แล้วเสร็จ 85 % ชั้น 2 แล้วเสร็จ 6.5 %
3. งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จ

3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



งานระบบสุขาภิบาล

1. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น1 แล้วเสร็จ 80 %
ชั้น 2 แล้วเสร็จ 80 % ชั้น 3 แล้วเสร็จ 43 %
2. งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาล ชั้น1 แล้วเสร็จ 5 %
ชั้น 2 แล้วเสร็จ 25 %

3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



อาคารนิตินกร (เดิม)

- 1.งานผนังก่ออิฐ และฉาบปูน แล้วเสร็จ 100 %
- 2.งานปูกระเบื้องพื้น ผนังห้องน้ำ 100 %
- 3.งานปูกระเบื้องพื้น 90 %
- 4.งานติดตั้งวงกบ ประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 90 %
5. งานทาสี แล้วเสร็จ 70 %
6. งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 %

งานงวดที่ 6 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน วันที่ 15 ธค. 66


3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์




3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

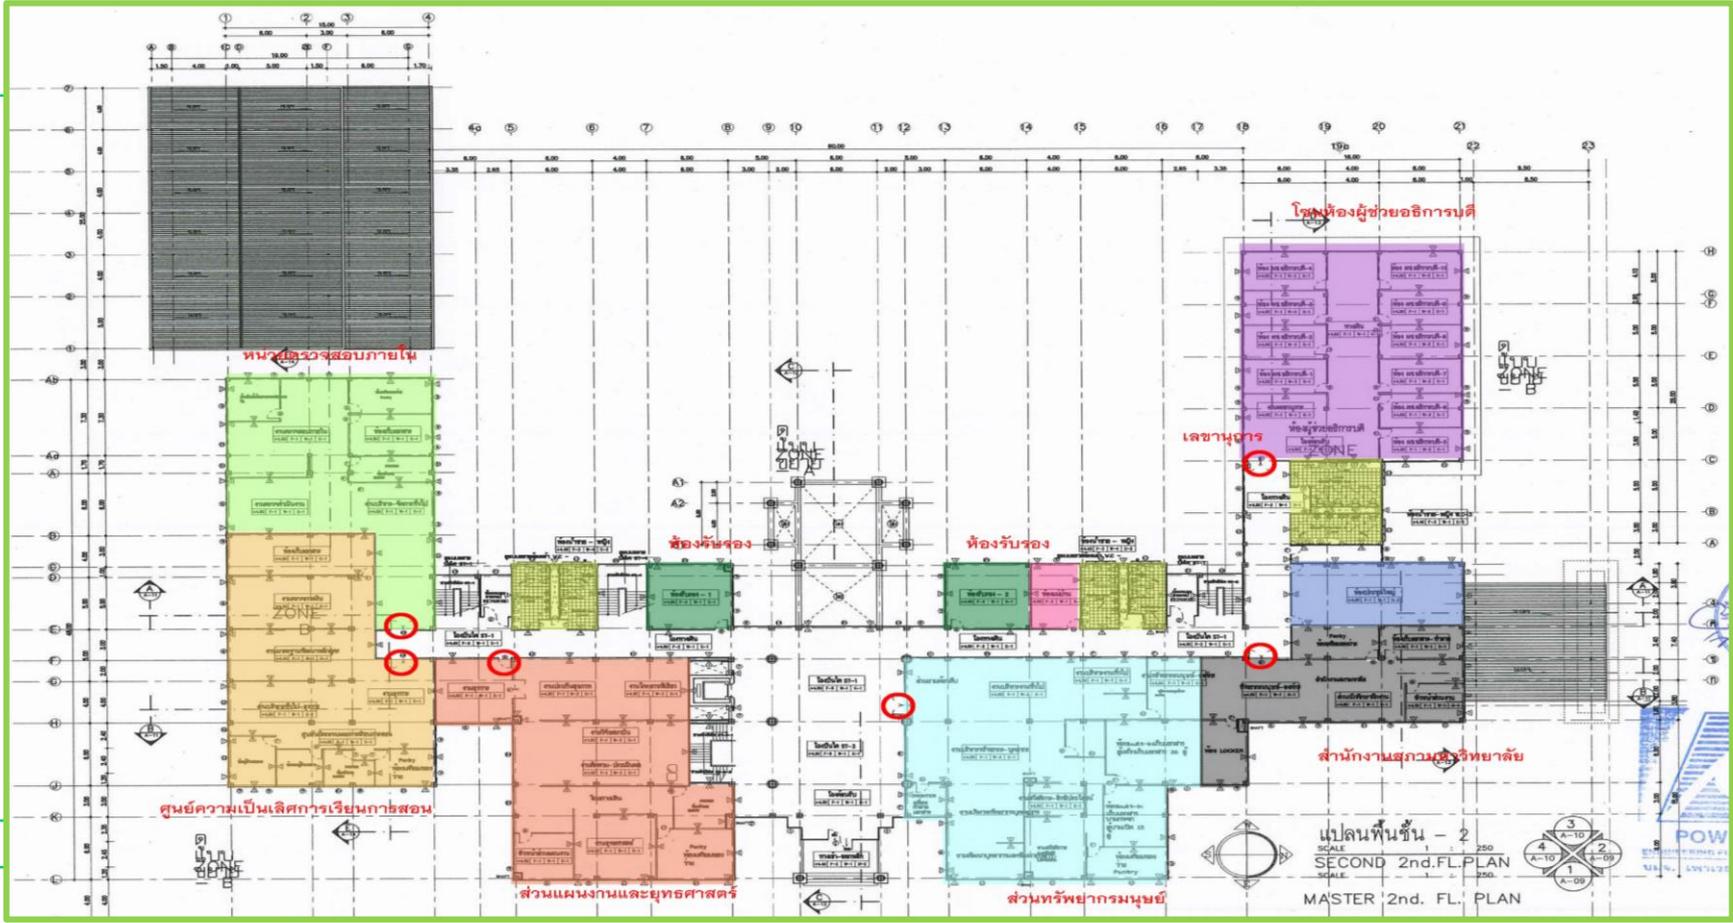


3. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

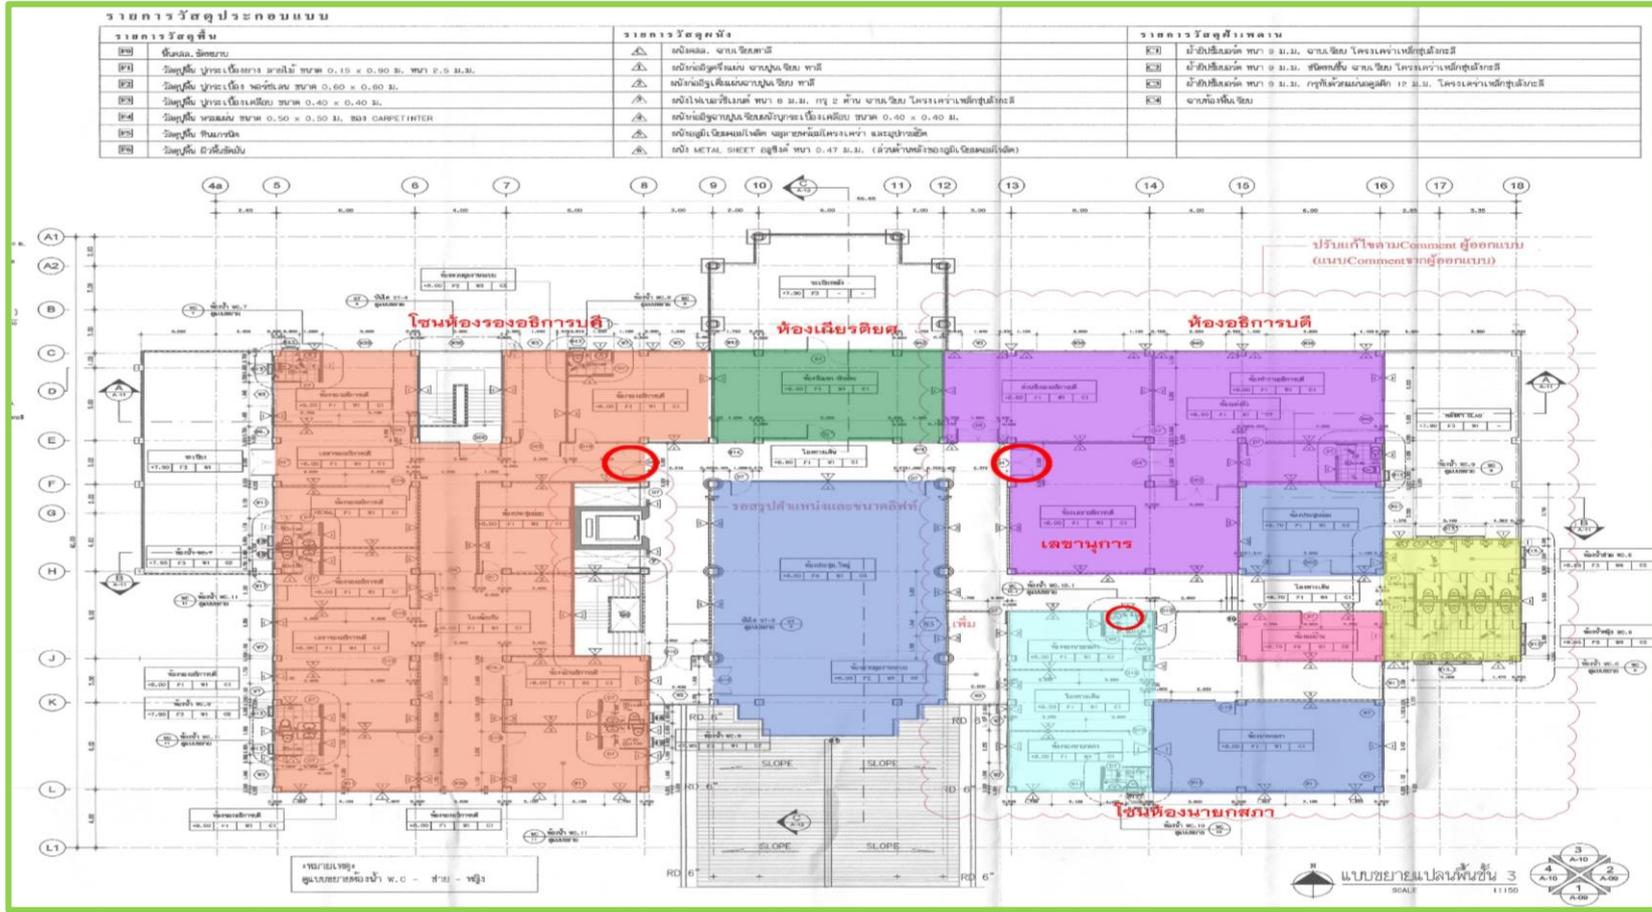

4

โครงการก่อสร้างโรงเรียนกล้วยไม้



ผู้รับจ้าง	บริษัท สุวรรณพงศ์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่สัญญา	159/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ. 66
วงเงินก่อสร้าง	9,097,358.06 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	18 ก.พ. 66 – 31 ม.ค. 67 (348วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	286 วัน (82.42%)
เหลือระยะเวลา	61 วัน (17.58%)
ความก้าวหน้างาน	79.82%
งวดงาน	6/8 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	8 คน

4. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้



4. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้



4. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้



4. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้

โรงเรือน A



โรงเรือน A

1. งานผนังโรงเรือน แล้วเสร็จ 95 %
2. งานทาสี แล้วเสร็จ 90 %
3. งานติดตั้งตาข่ายพลาสติกหลังคา แล้วเสร็จ 25 %
4. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 80 %
5. งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 95 %

4. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้

โรงเรือน B



โรงเรือน B

1. งานผนังโรงเรือน แล้วเสร็จ 100 %
2. งานทาสี แล้วเสร็จ 90 %
3. งานติดตั้งตาข่ายพรางแสงหลังคา แล้วเสร็จ 90 %
4. งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 95 %

4. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้

โรงเรือน C



โรงเรือน C

1. งานติดตั้งผนังโรงเรือน แล้วเสร็จ 100 %
2. งานทาสี แล้วเสร็จ 90 %
3. งานติดตั้งตาข่ายพรางแสงหลังคา แล้วเสร็จ 80 %
4. งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 95 %

4. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้

สำนักงานและห้องเก็บของ



อาคารสำนักงาน และโรงเก็บอุปกรณ์

1. งานผนัง แล้วเสร็จ 100 %
2. งานปูกระเบื้องพื้น แล้วเสร็จ 65 %
3. งานทาสี แล้วเสร็จ 80 %
4. งานติดตั้งบันไดเหล็ก แล้วเสร็จ 70 %
5. งานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ 50 %
6. งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 95 %
7. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 85 %

4. โครงการก่อสร้างโรงเรียนกล้วยไม้

งานลานจอดรถและห้องน้ำ



ความก้าวหน้างานลานจอดรถ

1. งานถนน และลานจอดรถ แล้วเสร็จทั้งหมด


ความก้าวหน้างานห้องน้ำ

1. งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ 90 %
2. งานบุกระเบื้องผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ 90 %
3. งานบุกระเบื้องพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ 50
4. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 70 %
5. งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 95 %

หมายเหตุ งวดที่ 7 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ 15 ธ.ค. 66

5

โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
เลขที่สัญญา	204/2566 ลงวันที่ 12 เม.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	38,999,800.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	13 เม.ย. 66 – 11 เม.ย. 67 (365 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	232 วัน (63.56%)
เหลือระยะเวลา	133 วัน (36.44%)
ความก้าวหน้างาน	36.00%
งวดงาน	4/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	55 คน

5. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



5. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ความก้าวหน้างาน ชั้น 1

1. ผนังก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
2. งานฉาบปูนผนังภายใน ภายนอก แล้วเสร็จ 80 %
3. งานติดตั้งวงกบไม้ แล้วเสร็จ 90 %
4. งานติดตั้งท่อเพื่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 %
5. งานเดินท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 60 %

5. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ความก้าวหน้างาน ชั้น 2

1. ผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 80 %
2. งานฉาบปูนผนังภายใน ภายนอก แล้วเสร็จ 60 %
3. งานติดตั้งวงกบไม้ แล้วเสร็จ 80 %
4. งานติดตั้งท่อเพื่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 40 %
5. งานเดินท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 30 %

5. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ความก้าวหน้างาน ชั้น ดาดฟ้า

1. พื้นซีเมนต์ขัดมัน แล้วเสร็จ 90 %
2. งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ 80 %

หมายเหตุ

งานงวดที่ 5 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานกลางเดือน มค. 67

6

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ผู้รับจ้าง	บริษัท ชุมพร คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่สัญญา	219/2566 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	27,050,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 มิ.ย. 66 – 8 เม.ย. 67 (298 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	168 วัน (56.37%)
เหลือระยะเวลา	130 วัน (43.63%)
ความก้าวหน้างาน	35.00%
งวดงาน	2/7 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	45 คน

6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

1. งานโครงสร้างคอนกรีตตัวอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด (ยกเว้นพื้นส่วน สนามแบดยังไม่ได้ดำเนินการ)
2. งานประกอบติดตั้งโครงหลังเหล็ก+มุงหลังคา แล้วเสร็จ 95 %
3. งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูน+ฉาบโครงสร้าง แล้วเสร็จ 95 %
4. งานติดตั้งโครงเหล็กรับผนัง METAL SHEET แล้วเสร็จ 95 %
5. งานติดตั้งผนัง SIDING METAL SHEET แล้วเสร็จ 20 %

6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

- 6.. งานปูกระเบื้องพื้น แล้วเสร็จ 10 %
7. งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ 30 %
8. งานเดินท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 40 %
9. งานเดินท่อไฟฟ้าเพื่อร้อยสาย แล้วเสร็จ 20 %

* งานงวดที่ 3 ส่งงานกลางเดือน มค . 67

7

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน้ำ และงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา)

ผู้รับจ้าง	บริษัท สุวรรณพงศ์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่สัญญา	214/2566 ลงวันที่ 15 พ.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	16,287,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 พ.ค. 66 – 29 ก.พ. 67 (290 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	199 วัน (68.62%)
เหลือระยะเวลา	91 วัน (31.38%)
ความก้าวหน้างาน	67.03%
งวดงาน	4/8 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	25 คน

7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ชั้น 1




สรุปความก้าวหน้างาน ชั้น 1

1. งานผนังก่อฉาบ และผนังเบา แล้วเสร็จ 98 %
2. งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ 90 %
3. งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
4. งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ 70 %
5. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 98 %
6. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 30 %
7. งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 98 %

7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ชั้น 1

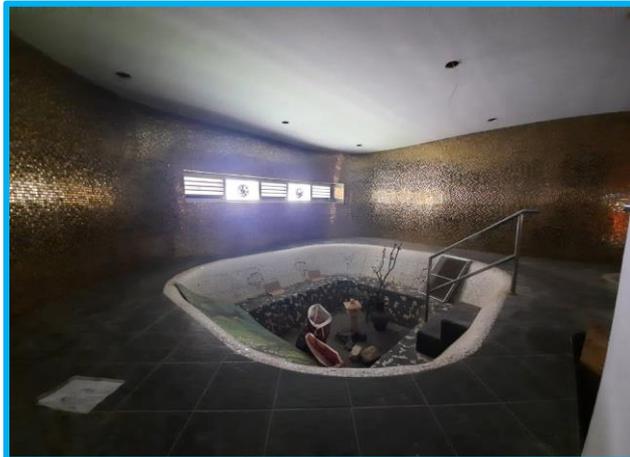

สรุปความก้าวหน้างาน ชั้น 1

8. งานปูกระเบื้องห้องน้ำ แล้วเสร็จ 90 %
9. งานปูกระเบื้องผนังและพื้นห้องนวด แล้วเสร็จ 75 %
10. งานปูกระเบื้องโมเสคผนังห้องอ่างน้ำวน แล้วเสร็จ 90 %
11. งานจัดทำห้องชาวด้าน+อุปกรณ์ประกอบ 4 ห้อง แล้วเสร็จ 90 %

7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ชั้น 2



สรุปความก้าวหน้างาน ชั้น 2

1. งานผนัง แล้วเสร็จ 98 %
3. งานติดตั้งลูมึนเียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ 95 %
4. งานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างลูมึนเียมแล้วเสร็จ 70 %
5. งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 80 %
4. งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ 40 %
5. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 60 %

หมายเหตุ

งานงวดที่ 5 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ต้นเดือน มค. 67

8

โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง	บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด
เลขที่สัญญา	130/2566 ลงวันที่ 24 ม.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	17,390,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	25 ม.ค. 66 – 20 ธ.ค. 66 (330วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	310 วัน (93.93%)
เหลือระยะเวลา	20 วัน (6.07%)
ความก้าวหน้างาน	98.00%
งวดงาน	5/6 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	10 คน


8. โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



8. โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



8. โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์




8. โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



- ความก้าวหน้างาน
- งานเฟอร์นิเจอร์ประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งป้ายชื่อห้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่ 15 ธค. 66 จะแล้วเสร็จ

9

โครงการก่อสร้าง Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ



ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006)
เลขที่สัญญา	234/2566 ลงวันที่ 3 ส.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	2,730,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	8 ส.ค. 66 – 20 ธ.ค. 66 (135 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	101 วัน (84.17%)
เหลือระยะเวลา	19 วัน (15.83%)
ความก้าวหน้างาน	26.93%
งวดงาน	1/4 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	4 คน

9. โครงการก่อสร้าง Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ



9. โครงการก่อสร้าง Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ



9. โครงการก่อสร้าง Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ



9. โครงการก่อสร้าง Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ



ความก้าวหน้างาน

1. งานติดตั้งผนังเบา+ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100 %
2. งานติดตั้งผนัง ประตู อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 90 %
3. งานติดตั้งผนังตกแต่ง คอมโพสิต แล้วเสร็จ 90 %
4. งาน Built - In แล้วเสร็จ 30 %
5. งานเดินท่อไฟฟ้า แล้วเสร็จ 60 %

หมายเหตุ

งานงวดที่ 2 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ

10

โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราเทพการโยธา
เลขที่สัญญา	240/2566 ลงวันที่ 15 ส.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	20,400,000. บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 ส.ค. 66 – 12 พ.ค. 67 (270 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	107 วัน (39.62%)
เหลือระยะเวลา	163 วัน (60.38%)
ความก้าวหน้างาน	20.52%
งวดงาน	2/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	15 คน


10. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



ความก้าวหน้างาน

1. งานคาน+พื้นโครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
2. งานเสาโครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
3. งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 1 แล้วเสร็จ 70 %
4. เทคอนกรีตพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายลานด้านหน้าอาคาร
แล้วเสร็จ 90 %
5. ผูกเหล็กคาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 60 %
6. งานก่ออิฐกำแพงรั้วด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ 15 %

งานงวดที่ 3 ผู้รับจ้างจะส่งงานปลายเดือน มค. 67



ผู้รับจ้าง	บริษัท เหล็กตราง จำกัด
เลขที่สัญญา	217/2566 ลงวันที่ 22 พ.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	127,000,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	23 พ.ค. 66 – 22 พ.ย. 67 (550 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	192 วัน (34.91%)
เหลือระยะเวลา	358 วัน (65.09%)
ความก้าวหน้างาน	8.54 %
งวดงาน	2/18 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	48 คน

11. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ความก้าวหน้างาน

1. งานหล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 100%
2. งานวางพื้นสำเร็จรูป + TOPPING ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 100%
3. พื้นหล่อในที่ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 50%
4. งานเทคอนกรีตเสาชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
5. ผูกเหล็กคานชั้น 2 แล้วเสร็จ 20 %
6. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 แล้วเสร็จ 15 %

งานงวดที่ 3 ผู้รับจ้างได้ส่งงานแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการ
ตรวจรับ

งานงวดที่ 4 จะส่งงานประมาณ กลางเดือน มค. 67

โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาบริเวณร้านค้าชุมชน โรงอาหารช่อประดู่

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์อ่อนิ่ง (1995)
เลขที่สัญญา	08/2567 ลงวันที่ 1 พ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	2,110,888 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	1 พ.ย. 66– 29 ก.พ. 67 (120 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	29 วัน (24.17%)
เหลือระยะเวลา	91 วัน (75.83%)
ความก้าวหน้างาน	26.17%
งวดงาน	0/4 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	8 คน

12. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาบริเวณร้านค้าชุมชน โรงอาหารช่อประดู่




ความก้าวหน้างาน

1. งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
2. งานติดตั้งเสาเหล็กรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
3. งานติดตั้งอะเส และจันทันเหล็ก แล้วเสร็จ 100 %
4. งานที่กำลังดำเนินการ ติดตั้งแปเหล็ก แล้วเสร็จ 90 %

งานงวดที่ 1 และ 2 จะส่งงาน 15 ธค. 66


โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออก ของสนามกีฬาากลางตุมปัง



ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โยธากิจ (2000)
เลขที่สัญญา	270/2566 ลงวันที่ 6 พ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	2,940,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	7 พ.ย. 66– 4 พ.ค. 67 (180 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	24 วัน (13.33%)
เหลือระยะเวลา	156 วัน (86.67%)
ความก้าวหน้างาน	%
งวดงาน	0/3 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	คน

13. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง





งบประมาณ 70,000,000 บาท

ราคากลาง 62,670,000 บาท

อยู่ระหว่างการเสนอราคาและพิจารณาในวันที่ 14 ธันวาคม 2566


จำนวนห้องพักทั้งสิ้น 94 ห้อง แบ่งเป็น ห้องโสด 78 ห้อง

ห้องครอบครัว 16 ห้อง (ชั้น 1)

14. โครงการงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ




14. โครงการงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ

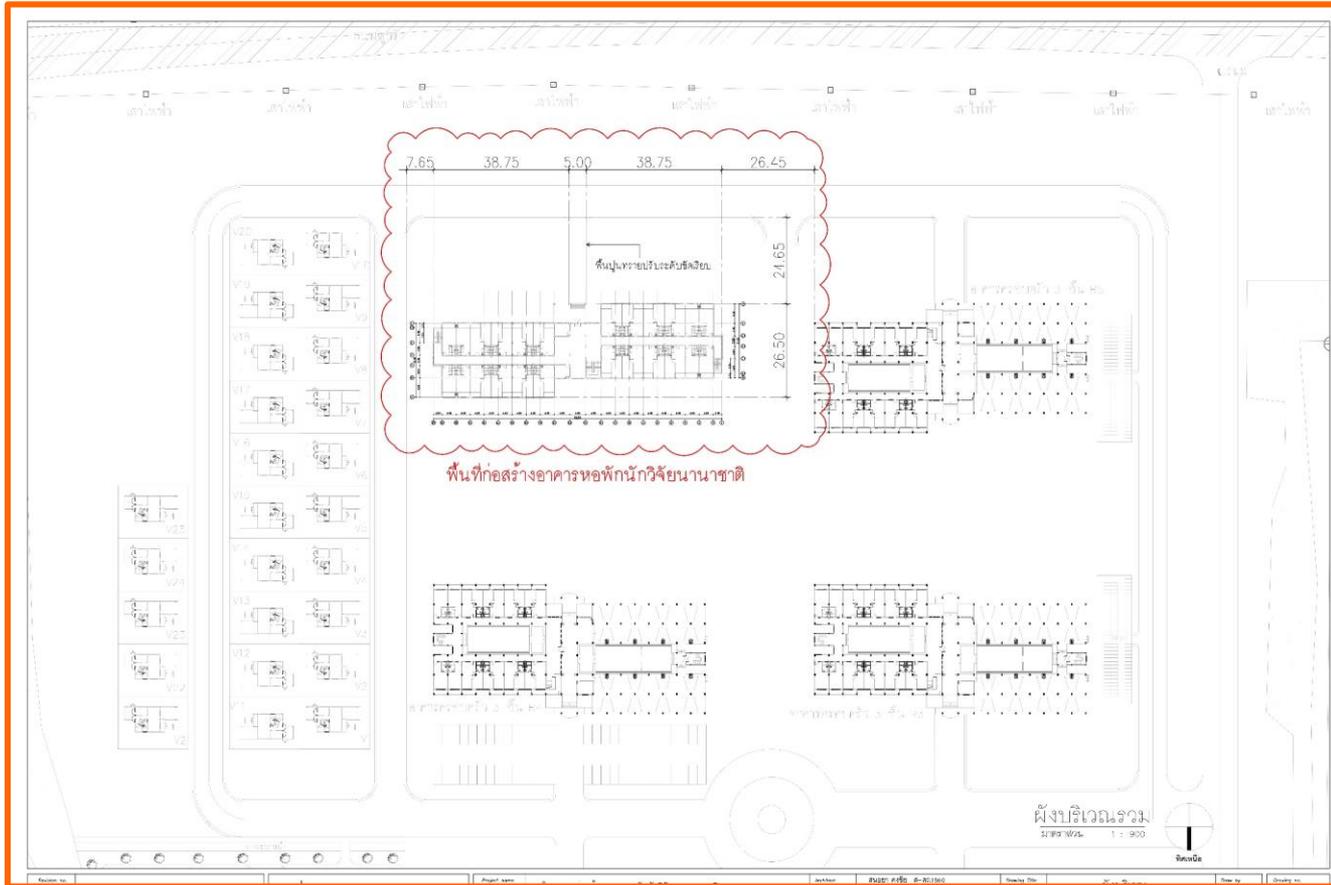


14. โครงการงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ

ชั้น 1



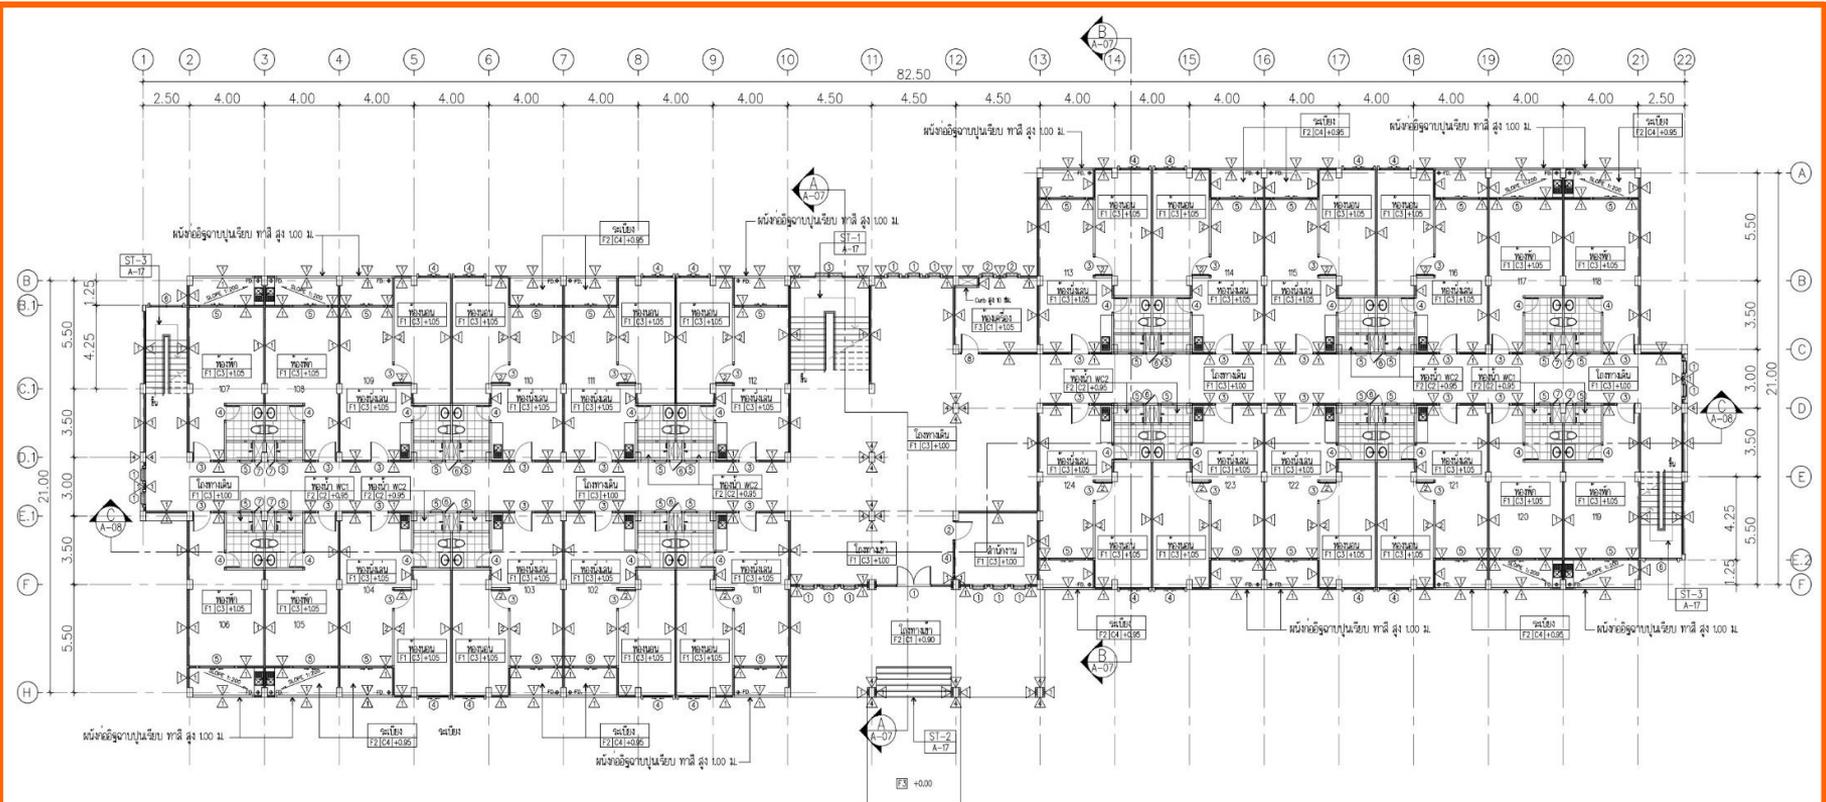


14. โครงการงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ

ชั้น 2/3

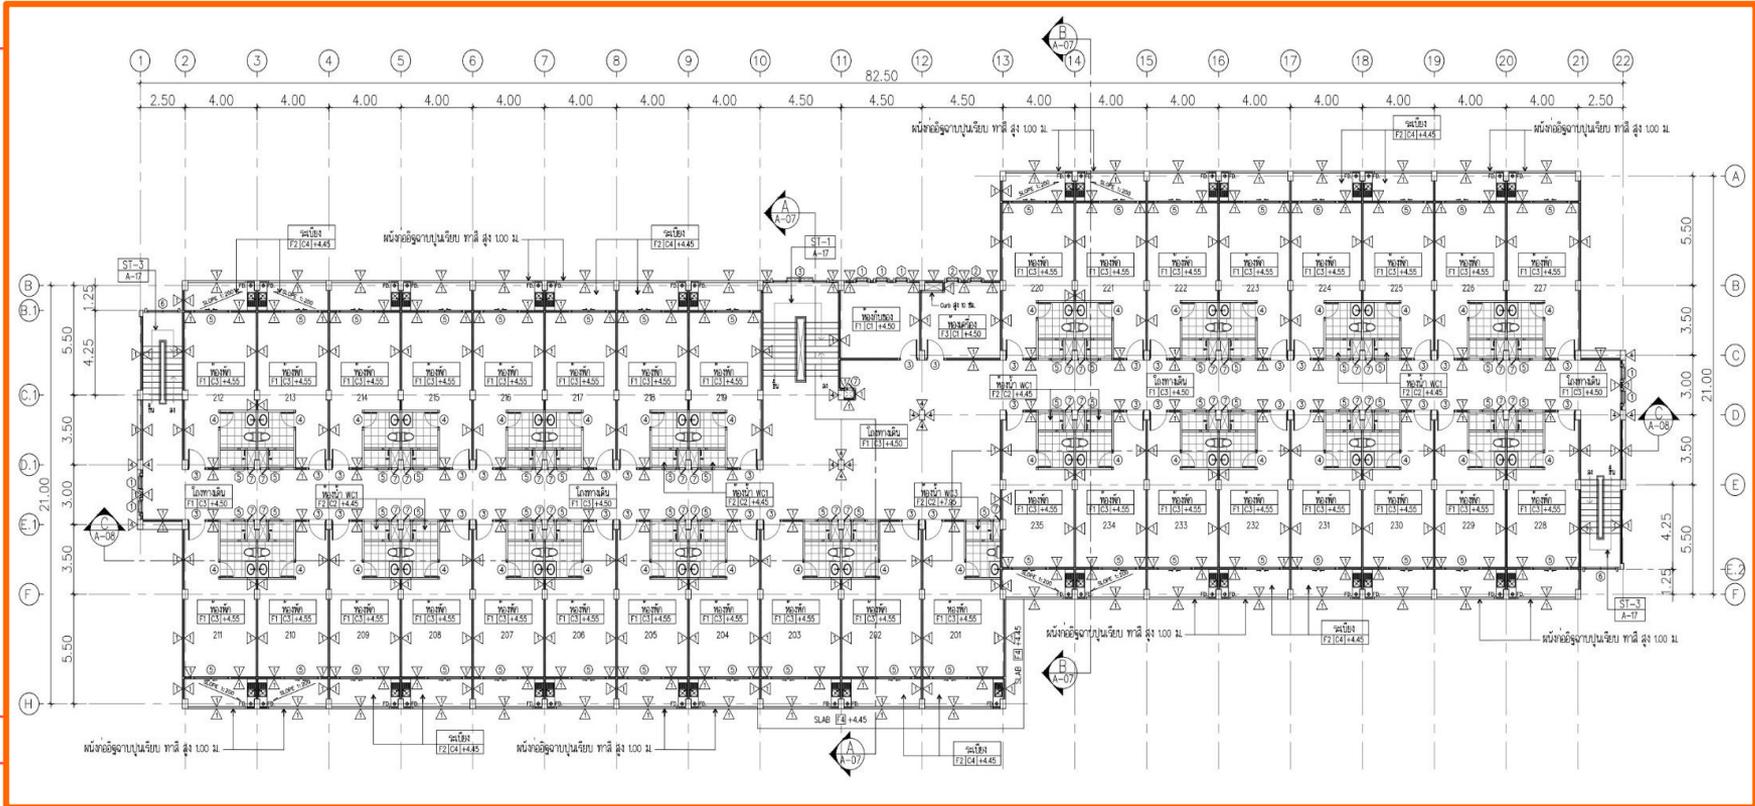

14. โครงการงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ

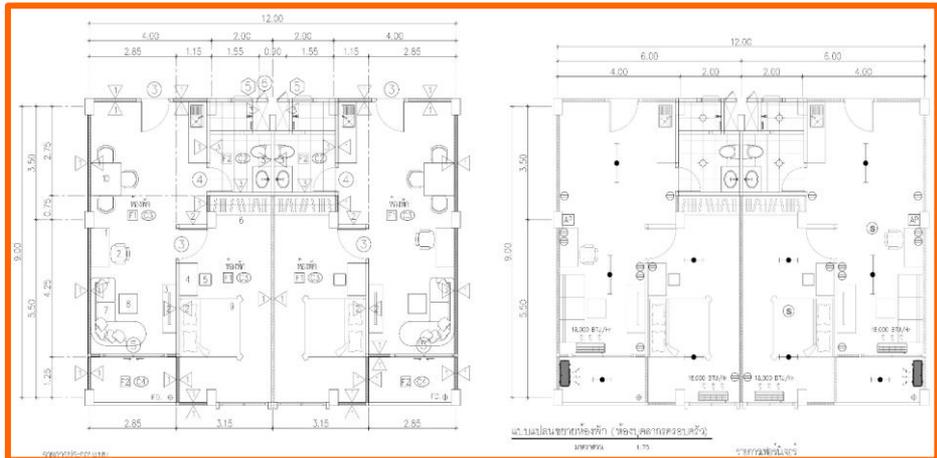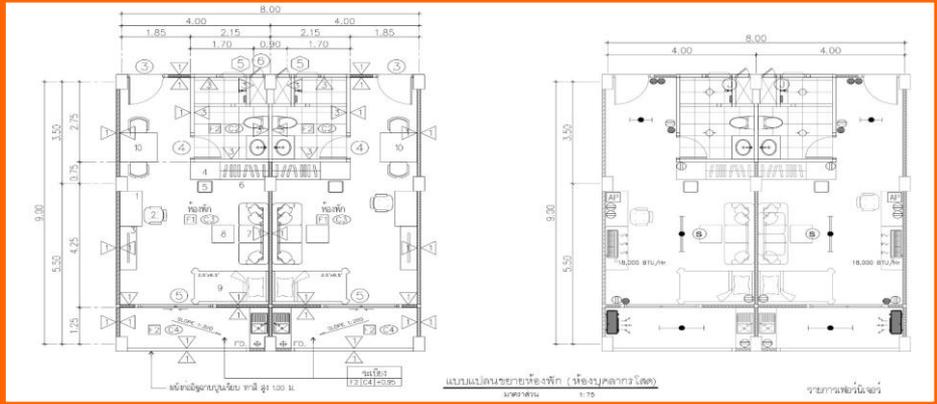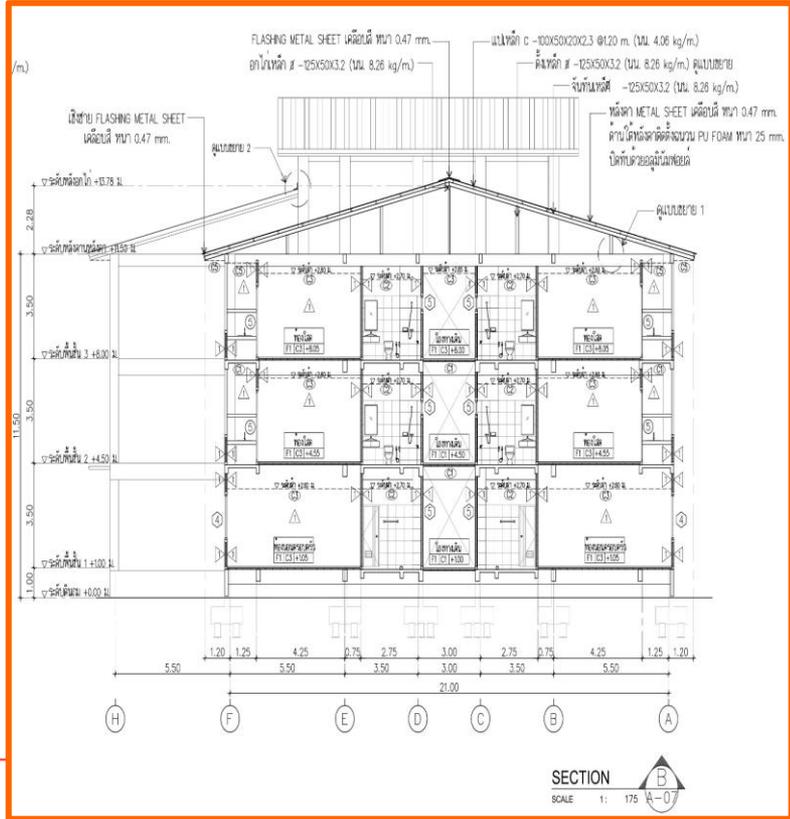

กิจกรรมในรอบเดือน

- การประชุมประจำสัปดาห์โครงการก่อสร้างต่างๆ



การประชุมประจำสัปดาห์

(ผู้ร่วมประชุม ผศ.ดร. นุกูล สุขสุวรรณ เป็นประธาน ,กรรมการ
ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง)

- โครงการวิทยุกีฬา+โรงเรียนกล้วยไม้
- โครงการวิจัยกัวหน้ำ+สนามแบด
- โครงการโรงผลิตน้ำประปา ศกพ.
- โครงการปรับปรุงอาคารบริหาร
- โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรม
- Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรม

เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาในการทำงาน
รวมถึงหาข้อสรุปในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง

กิจกรรมในรอบเดือน

- การประชุมประจำสัปดาห์โครงการก่อสร้างต่างๆ



กิจกรรมในรอบเดือน

-การจัดทำท่าลอยกระทง ได้รับความอนุเคราะห์จาก บ.นิธิรัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในการก่อสร้าง



กิจกรรมในรอบเดือน

-การจัดทำท่าลอยกระทง ได้รับความอนุเคราะห์จาก บ.นิธิรัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในการก่อสร้าง



กิจกรรมในรอบเดือน

- ตรวจการจ้างงานปรับปรุงอาคารบริหาร งบที่ 5 และ หัวหน้าหน่วยงานส่วนต่างๆเข้าดูพื้นที่ก่อสร้าง



กิจกรรมในรอบเดือน

- ตรวจการจ้างงานปรับปรุงอาคารบริหาร งบที่ 5 และ หัวหน้าหน่วยงานส่วนต่างๆเข้าดูพื้นที่ก่อสร้าง



กิจกรรมในรอบเดือน

- งานตรวจการจ้างงานปรับปรุงอาคารวิทยุกีฬา และหลังคาคลุมสระ งวดที่ 4



กิจกรรมในรอบเดือน

- ตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงเรียนกล้วยไม้ งวดที่ 6



กิจกรรมในรอบเดือน

- ตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้าง Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ งามที่ 1



กิจกรรมในรอบเดือน

- งานตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ งวดที่ 2



กิจกรรมในรอบเดือน

- ตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า งวดที่ 4



กิจกรรมในรอบเดือน

- ตรวจการจ้างงานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศกพ. งวดที่ 6



กิจกรรมในรอบเดือน

- ตรวจสอบจ้างงานก่อสร้างกำแพง เฟส 5 (สวนไฟ-สะพานคลองเกียบ) งวดที่ 2



กิจกรรมในรอบเดือน

- ตรวจสอบจ้างงานก่อสร้างกำแพง เฟส 8 (คลองดิน-สะพานคลองเกียบ) งวดที่ 3



กิจกรรมในรอบเดือน

- ท่านอธิการบดี ตรวจสอบความก้าวหน้างานปรับปรุงอาคารบริหาร



กิจกรรมในรอบเดือน


- ท่านอธิการบดี ตรวจสอบความก้าวหน้างานปรับปรุงอาคารบริหาร



กิจกรรมในรอบเดือน

- ท่านอธิการบดี ตรวจสอบความก้าวหน้างานปรับปรุงอาคารบริหาร





**ความก้าวหน้างานก่อสร้างกำแพง
และทำคันดินพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย
รวม 8 โครงการ**

แผนงานก่อสร้างกำแพงและทำคันดินพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระยะทาง 2.2 กม. (น. S-ZONE)

แล้วเสร็จเมื่อ 2564

1

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตด้านทิศตะวันตกพื้นที่ฟาร์ม (แปลง 4) (1.35 กม.)

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง : 1,705,500 บาท

เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 65

สิ้นสุดสัญญา 1 เม.ย. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไอคอน - บ้านปลักจอก (7 กม.)

ผู้รับจ้าง : บริษัท ทุพี ธรกิจ จำกัด

ค่าก่อสร้าง : 11,679,000 บาท (7 กม.)

เริ่มสัญญา 15 มิ.ย. 66

สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย 67

ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน

7

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำชานสรณ์

- สถานีไฟฟ้าย่อย (1.7 กม.)

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น เอส ซี อาร์ (2009) จำกัด

ค่าก่อสร้าง : 2,600,000 บาท

เริ่มสัญญา 05 ก.ค. 66

สิ้นสุดสัญญา 02 พ.ย. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

6

2

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากซอย 8

ถึงสะพานคลองเกียบ (3 กม.)

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง : 4,352,000 บาท

เริ่มสัญญา 20 ธ.ค. 65

สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ขยายสัญญาถึง 22 พ.ค. 66

5

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่แปลงสวนไม้

- สะพานคลองเกียบ (2 กม.)

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น เอส ซี อาร์ (2009) จำกัด

ค่าก่อสร้าง : 3,750,000 บาท

เริ่มสัญญา 05 ก.ค. 66

สิ้นสุดสัญญา 02 พ.ย. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

3

งานจ้างทำคันดินปรับระดับเพื่อเป็นคันกันน้ำป้องกันน้ำท่วม

จากสะพานบ้านคลองดิน-ทิศใต้ของที่ทับकुคการ-แปลงสวนไม้ (4.1 กม.)

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง : 1,250,000 บาท

เริ่มสัญญา 10 ม.ค. 66

สิ้นสุดสัญญา 3 มิ.ย. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

8

ก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานคลองดิน - ทิศใต้ของที่ทับकुคการ-แปลงสวนไม้ (4.185กม.)

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง : 4,070,000 บาท

เริ่มสัญญา 24 ก.ค. 66

สิ้นสุดสัญญา 21 ธ.ค 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

4

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัด

คลองดิน - อ่างเก็บน้ำชานสรณ์ (1.5 กม.)

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง : 2,880,000 บาท

เริ่มสัญญา 17 ก.พ. 66


สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

SOUTH

1

โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตด้านทิศตะวันตกพื้นที่ฟาร์ม (แปลง 4)

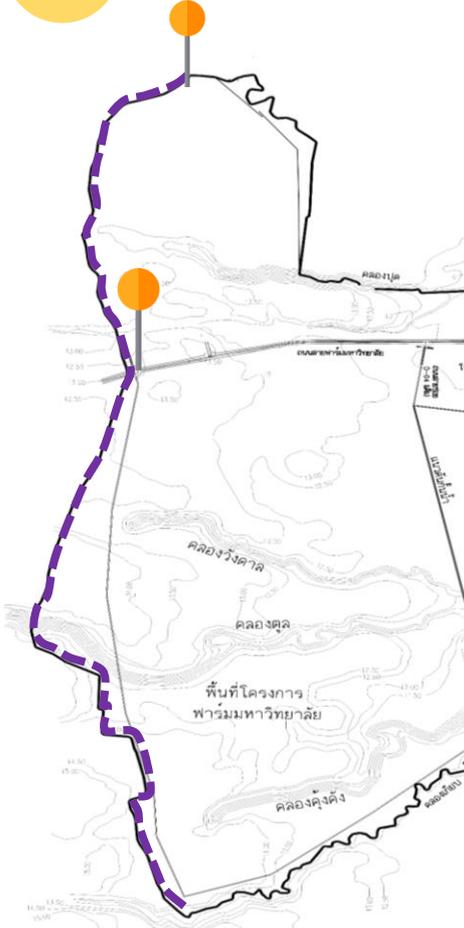

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (1.35 กม.)

ค่าก่อสร้าง : 1,705,500 บาท

เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 65

สิ้นสุดสัญญา 1 เม.ย. 66


ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ความก้าวหน้างาน : 100%

ปัจจุบันงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 100%

- ยกเว้นช่วงที่เว้นไว้ เนื่องจากกรณีพื้นที่พิพาทกับราษฎร ระยะทางประมาณ 380 เมตร

โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากซอย 8 ถึงสะพานคลองเกียบ

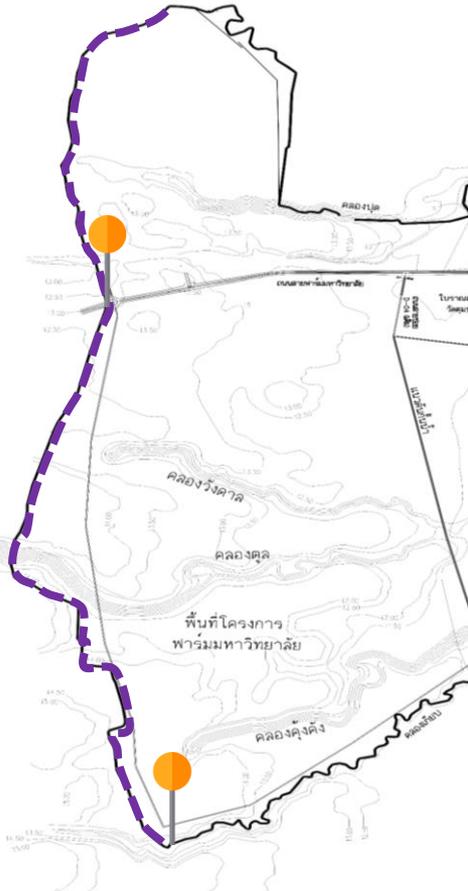

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (3 กม.)

ค่าก่อสร้าง : 4,352,000 บาท

เริ่มสัญญา 20 ธ.ค. 65

สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ค. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ความก้าวหน้างาน : 100%

- ยกเว้นช่วงที่เว้นไว้ เนื่องจากกรณีพื้นที่พิพาทกับราษฎร ระยะทาง ประมาณ 250 เมตร

โครงการงานจ้างทำคันดินปรับระดับเพื่อเป็นคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมจากสะพานบ้านคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไฟ

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (4.1 กม.)

ค่าก่อสร้าง : 1,250,000 บาท

เริ่มสัญญา 10 ม.ค. 66

สิ้นสุดสัญญา 3 มิ.ย. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ความก้าวหน้างาน : 100 %

- ในส่วนของคันดินที่เว้นไว้ในบางจุด จะอยู่ในงานของเฟส 8 (บ.หนึ่งบุญถาวร) ที่จะทำรั้วคาวบอย และแนววางเสาเข็มเพื่อป้องกันการกัดเซาะแนวตลิ่ง (ช่วงวังหมาก)



4

โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัดคลองดิน - อ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์



ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (1.5 กม.)

ค่าก่อสร้าง : 2,880,000 บาท


เริ่มสัญญา 17 ก.พ. 66

สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ความก้าวหน้างาน : 100%

- เว้นช่วงระยะสุดท้ายที่ติดกับรั้วโปร่งของอ่างชลประทาน ระยะทางประมาณ 40 เมตร (งานเพิ่มของเฟส 8)

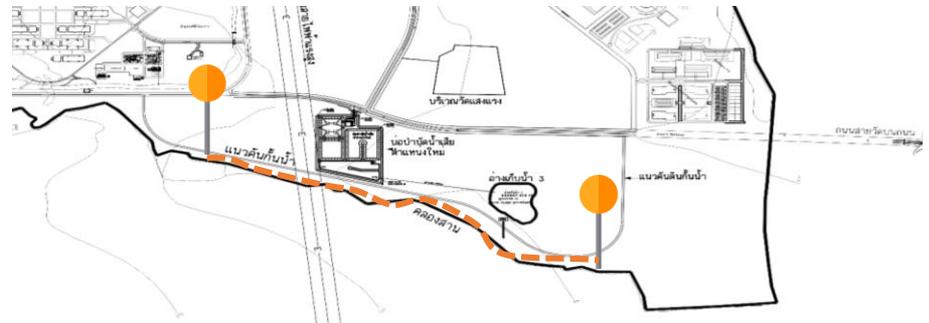

โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัดคลองดิน - อ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์



โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัดคลองดิน - อ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์

เฟส#4 : ช่วงวัดคลองดิน - อ่างชลานุสรณ์
(ช่วงต่อรั้วอิฐบล็อก กับ รั้วโปรงของชลประทาน
ระยะทางประมาณ 40 เมตร *งานเพิ่มเฟส#8)



เฟส#4 : ช่วงวัดคลองดิน - อ่างชลานุสรณ์
(ทางระบายน้ำป้มน้ำคลองสวน)



เฟส#4 : ช่วงวัดคลองดิน - อ่างชลานุสรณ์
(ทางระบายน้ำป้มน้ำคลองสวน)



เฟส#4 : ช่วงวัดคลองดิน - อ่างชลานุสรณ์



โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัดคลองดิน - อ่างเก็บน้ำชลาบุรี


งานเพิ่มถมดินปรับพื้นที่บริเวณหอพักศูนย์การแพทย์

- ปัจจุบันถมดินแล้วเสร็จ 100%



5

โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่แปลงสวนไม้ - สะพานคลองเกียบ

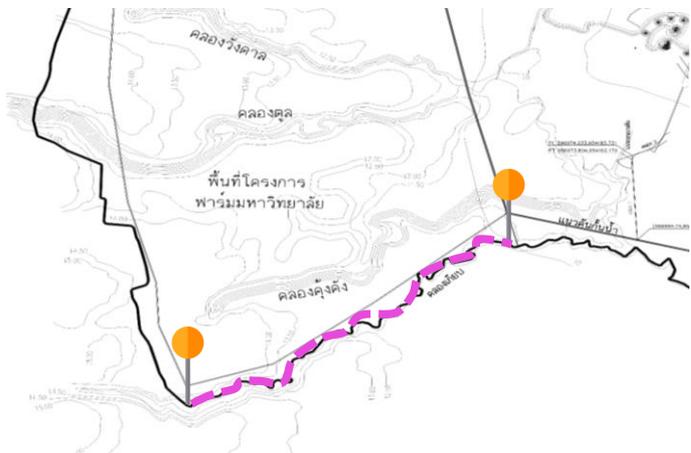

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น เอส ซี อาร์ (2009) จำกัด

งบ : 3,750,000 บาท (2 กม.)

เริ่มสัญญา 05 ก.ค. 66

สิ้นสุดสัญญา 02 พ.ย. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ความก้าวหน้างาน : 70.00%

5

โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่แปลงสวนไม้ - สะพานคลองเกียบ



6

โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่ อ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์ – สถานีไฟฟ้าย่อย



ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น เอส ซี อาร์ (2009) จำกัด
งบ : 2,600,000 บาท (1.7 กม.)
เริ่มสัญญา 05 ก.ค. 66
สิ้นสุดสัญญา 02 พ.ย. 66
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
ความก้าวหน้างาน : 95.00%

6

โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่ อ่างเก็บน้ำชลประทาน - สถานีไฟฟ้าย่อย (ต่อ)



โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่ อ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์ - สถานีไฟฟ้าย่อย (ต่อ)



7

โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก

ผู้รับจ้าง : บริษัท ทูพี ธรูกิจ จำกัด


ค่าก่อสร้าง : 11,679,000 บาท (7 กม.)

เริ่มสัญญา 15 มิ.ย. 66

สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย. 67

ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน

ความก้าวหน้างาน 64.00 %

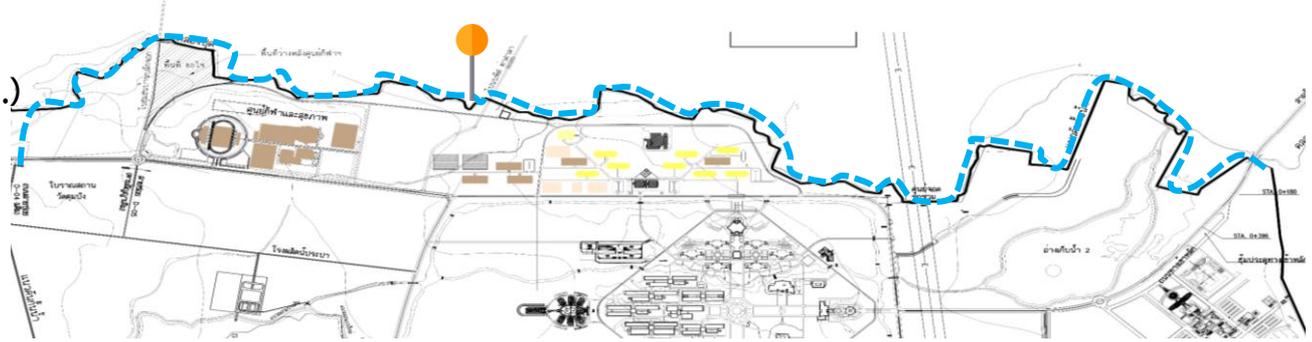

เฟส#7 : ช่วง SICON - ปลักจอก (ทางออกบ้านปลักจอก)




เฟส#7 : ช่วง SICON - ปลักจอก

โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก (ต่อ)



โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก (ต่อ)

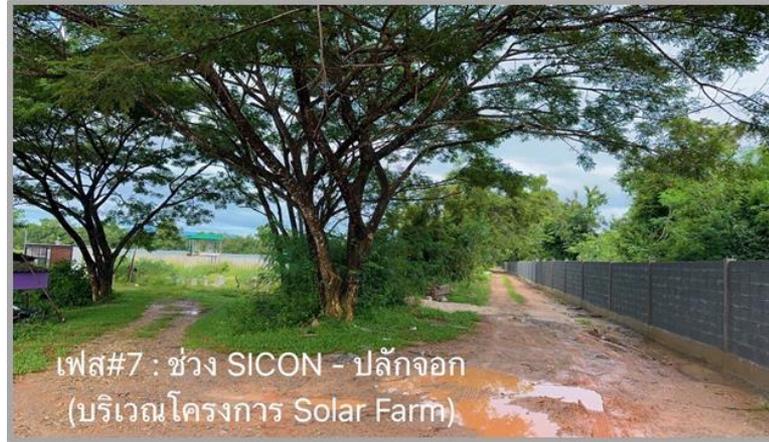

โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไฟ



เฟส#8 : ทางโค้งช่วงทางออกสะพานวัดคลองดิน



เฟส#8 : ช่วงต่อเนื่อง กับประตูตลาดศุกร์

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง


ค่าก่อสร้าง : 4,070,000 บาท

เริ่มสัญญา 24 ก.ค. 66

สิ้นสุดสัญญา 21 ธ.ค. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

ความก้าวหน้างาน 55.00%

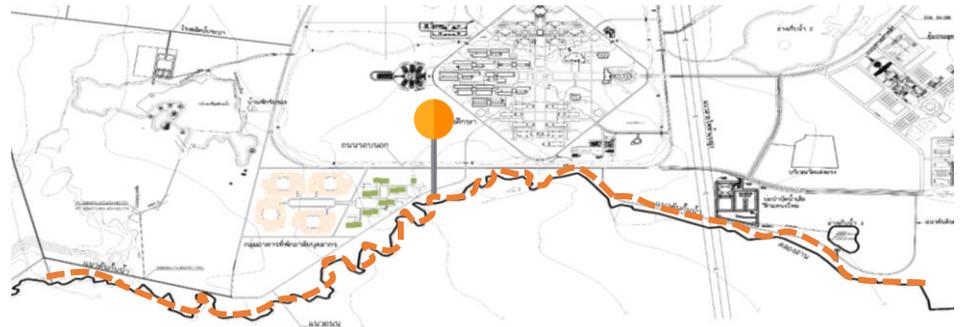





งานรั้วคาวบอย เฟส#8 ช่วงวัดคลองดิน-ตลาดศูกร์
(บริเวณแก้มลิงวลัยนิवास)



งานทำประตูแนวรั้วรอบอ่างเก็บน้ำชลประทาน ของชลประทาน



THANK YOU
