



# รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง รวม 14 โครงการ

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

1

# โครงการก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไฟ และโรงเรือนเพาะชำ



ผู้รับจ้าง	บริษัท สุวรรณพงศ์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่สัญญา	057/2565 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 65
วงเงินก่อสร้าง	12,627,766.59 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	17 มิ.ย. 65 - 20 ก.ย. 66 (461 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	449 วัน (97.40%)
เหลือระยะเวลา	12 วัน (2.60%)
ความก้าวหน้างาน	99.75 %
งวดงาน	9/10 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	5 คน

# 1. โครงการก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไฟและโรงเรือนเพาะชำ



## โรงเรือนสะสมพันธุ์ไฟ และทางเดิน

- อยู่ระหว่างการแก้ไขและเก็บรายละเอียดของงานก่อนส่งงานงวดสุดท้าย



# 1. โครงการก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไฟและโรงเรือนเพาะชำ



## โรงเรือนเพาะชำ

1. ปรับระดับพื้นด้วยหินเกล็ด แล้วเสร็จ ทั้ง 6 โรงเรือน
2. ทมดินปรับระดับทางเดินระหว่างโรงเรือน แล้วเสร็จ 80 %
3. แกะไขรายนะเอียดงาน ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย



## 2

## โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการ สตูดิโอ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผู้รับจ้าง	บริษัท เอกธনীช เพ็ญท์ จำกัด
เลขที่สัญญา	080/2565 ลงวันที่ 16 ก.ย. 65
วงเงินก่อสร้าง	25,300,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	17 ก.ย. 65 - 1 ก.ย. 66 (350 วัน) (อยู่ระหว่างคิดราคางานเพิ่มเติมเพื่อแนบท้ายสัญญาครั้งสุดท้าย)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	350 วัน (100%)
ความก้าวหน้างาน	87.00%
งวดงาน	6/8 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	25 คน

## 2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์



## 2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์



### ความก้าวหน้างาน

#### งานสถาปัตยกรรม

1. งานผนัง ฝ้าเพดาน และติดตั้งลูมಿನိเยม ประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ 90 %
2. งานวัสดุปูผิวพื้น แล้วเสร็จ 85 %


#### งานระบบต่างๆ

1. งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร แล้วเสร็จ 90 %
2. ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90 %
3. ระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 95 %



## 3

# โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง	บริษัท นิธิรัฐกร เอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขที่สัญญา	019/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 65
วงเงินก่อสร้าง	69,000,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	2 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 67 (400 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	281 วัน (70.25%)
เหลือระยะเวลา	119 วัน (29.75%)
ความก้าวหน้างาน	46.19%
งวดงาน	3/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	60 คน

### 3. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์





### 3. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



สถานีสูบน้ำดิบ

1. งานเทคอนกรีตคาน  
แล้วเสร็จ 100 %
2. งานเทคอนกรีตพื้นสถานี  
แล้วเสร็จ 60 %



### 3. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



#### ระบบการผลิตน้ำประปา

งานติดตั้งถังตกตะกอน ถังกรอง ถังเก็บน้ำใส และ การเดินท่อต่อเชื่อม แล้วเสร็จ 90 %

### 3. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



#### สถานีโรงผลิต

1. งานโครงสร้างคอนกรีต ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 100 %
2. เสาคอนกรีตรับคานหลังคา คานหลังคาแล้วเสร็จ 100 %
3. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 30 %



### 3. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ




#### งานอื่นๆ

1. งานก่อสร้างกำแพง แล้วเสร็จ 20 % และกำลังขุดวางฐานรากฝังด้านหน้า
  2. งานวางท่อระบายน้ำฝน และบ่อพัก คสล. รอบ โครงการแล้วเสร็จ 80 %
- \* งานงวด 4-5 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำหนังสือส่งงาน และงวด 6-7 จะส่งอีก 1 เดือน ข้างหน้า



## 4

# โครงการปรับปรุงอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่สัญญา	140/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ. 66
วงเงินก่อสร้าง	60,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	7 มี.ค. 66 – 1 ธ.ค. 66 (270 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	185 วัน (68.52%)
เหลือระยะเวลา	85 วัน (31.48%)
ความก้าวหน้างาน	27.16%
งวดงาน	3/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	71 คน

## 4. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์





## 4. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### งานโครงสร้าง

1. งานเทคอนกรีตโครงสร้างอาคาร แล้วเสร็จ 90 %
2. งานโครงหลังคาเหล็ก และมุงหลังคา แล้วเสร็จ 100 %



## 4. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1

1. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 96 %
2. งานฉาบผนังภายใน แล้วเสร็จ 83 %
3. งานติดตั้งผนังเบา แล้วเสร็จ 90 %
4. งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่างต่างแล้วเสร็จ 19 %
5. งานทาสีผนัง แล้วเสร็จ 3 %
6. งานติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 34 %

## 4. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2

1. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 92 %
2. งานฉาบผนังภายใน แล้วเสร็จ 80 %
3. งานติดตั้งผนังเบา แล้วเสร็จ 59 %
4. งานทาสีรองพื้นผนัง แล้วเสร็จ 29 %



### งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3

1. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 71 %
2. งานฉาบผนังภายใน แล้วเสร็จ 10 %



## 4. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### อาคารบริหาร

#### งานระบบไฟฟ้า

1. เดินท่อร้อยสาย ชั้น1 แล้วเสร็จ 45 %  
ชั้น2 แล้วเสร็จ 30 %
2. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้น 1 แล้วเสร็จ 1 %

#### งานระบบสุขาภิบาล

- ชั้น1 แล้วเสร็จ 20 %  
ชั้น2 แล้วเสร็จ 10 %  
ชั้น3 แล้วเสร็จ 3 %



## 4. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### อาคารนิทรรศการ


#### งานสถาปัตยกรรม

- 1.งานผนังก่ออิฐ และฉาบปูน แล้วเสร็จ 100 %
- 2.งานปูกระเบื้องพื้น ผนังห้องน้ำ 100 %
- 3.งานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ 80 %
4. งานทาสีผนัง แล้วเสร็จ 50 %

งานงวดที่ 4 จะส่งต้นเดือนตุลาคม

# 5

## โครงการก่อสร้างโรงเรียนกล้วยไม้



ผู้รับจ้าง	บริษัท สุวรรณพงศ์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่สัญญา	159/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ. 66
วงเงินก่อสร้าง	9,700,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	18 ก.พ. 66 – 15 ก.ย. 66 (210 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	203 วัน (96.67%)
เหลือระยะเวลา	7 วัน (3.33%)
ความก้าวหน้างาน	67.14%
งวดงาน	4/7 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	15 คน

## 5. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้





## 5. โครงการก่อสร้างโรงเรียนกล้วยไม้



### ความก้าวหน้างานโรงเรียน

1. งานโครงสร้างคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานติดตั้งโครงหลัง แล้วเสร็จ 95 %
3. งานมุงหลังคาด้วยแผ่นใส แล้วเสร็จ 85 %
4. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 95 %
5. งานฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ 80 %

## 5. โครงการก่อสร้างโรงเรียนกล้วยไม้




### ความก้าวหน้างานลาน และห้องน้ำ

1. งานเทคอนกรีต ถนน และลาน แล้วเสร็จทั้งหมด
  2. งานเทคอนกรีตพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
  3. งานโครงหลังคาเหล็กห้องน้ำ แล้วเสร็จ 90 %
  4. งานผนังก่ออิฐห้องน้ำ แล้วเสร็จ 70 %
  5. เจาะบ่อบาดาล แล้วเสร็จ ( ความลึก 68 เมตร )
- \* ส่งงานงวดที่ 5 อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ



## 6

# โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
เลขที่สัญญา	204/2566 ลงวันที่ 12 เม.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	37,368,029.04 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	13 เม.ย. 66 – 6 ก.พ. 67 (300 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	149 วัน (55.19%)
เหลือระยะเวลา	121 วัน (44.81%)
ความก้าวหน้างาน	15.33%
งวดงาน	2/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	30 คน

## 6. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### ความก้าวหน้างาน

1. งานโครงสร้างคอนกรีต ชั้น 1 เสา คาน พื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานเทคอนกรีตบันได ชั้น1 ชั้น 2 แล้วเสร็จ 50 %



## 6. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### ความก้าวหน้างาน

1. งานติดตั้งเหล็กคาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 80 %
2. งานเทคอนกรีตคาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 60 %
3. งานพื้นคอนกรีต ชั้น 2 แล้วเสร็จ 60 %
4. งานเทคอนกรีตเสารับคานหลังคา แล้วเสร็จ 60 %

## 7

## โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ผู้รับจ้าง	บริษัท ชุมพร คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่สัญญา	219/2566 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	25,490,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 มิ.ย. 66 – 12 ธ.ค. 67 (180 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	85 วัน (47.22%)
เหลือระยะเวลา	95 วัน (52.78%)
ความก้าวหน้างาน	14.80%
งวดงาน	1/6 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	30 คน

## 7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามเบดมินตัน)



### ความก้าวหน้า งานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้างคอนกรีต ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 % ยกเว้นพื้นสนามเบดมิงตันยังไม่ได้ดำเนินการ
2. งานคอนกรีต ชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานเสา-คาน รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ 80 %
4. งานประกอบโครงหลังเหล็ก แล้วเสร็จ 90 % อยู่ระหว่างทำสีเพื่อประกอบติดตั้ง



# 7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามเบดมินตัน)



## ความก้าวหน้า งานสถาปัตยกรรม

1. งานผนังก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 30%

\* งานงวดที่ 2 ต้องประกอบติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ

## 8

# โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน้ำ และงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา)

ผู้รับจ้าง	บริษัท สุวรรณพงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่สัญญา	214/2566 ลงวันที่ 15 พ.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	15,900,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 พ.ค. 66 – 11 พ.ย. 66 (180 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	116 วัน (64.44%)
เหลือระยะเวลา	64 วัน (35.56%)
ความก้าวหน้างาน	36.71%
งวดงาน	1/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	12 คน

## 8. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 1

1. งานผนังก่อฉาบ และผนังเบา แล้วเสร็จ 90 %
2. งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ 80 %
3. งานปรับระดับพื้นเพื่อปูกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ 90 %
4. งานจัดทำห้องซาวด์น้ำ 4 ห้อง แล้วเสร็จ 80 %
5. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 %
6. งานเดินท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90 %



## 8. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 2

1. งานโครงหลังคาเหล็ก และมุงหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
2. งานก่ออิฐและปูนฉาบ แล้วเสร็จ 80 %
3. งานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ 80 %

### ความก้าวหน้างานหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม

1. งานเชื่อมประกอบโครงหลังคา แล้วเสร็จ 80 % และกำลังยกติดตั้ง ( งานหลังคา+มุง จะแล้วทั้งหมด 15 ตค. 66 )

\* งานงวดที่ 2 ผู้รับจ้างได้ทำเรื่องขอส่งงานมาแล้ว

9

## โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างถนน)

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขศรีรัมย์
เลขที่สัญญา	227/2566 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	4,478,500 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	27 มิ.ย. 66 – 24 ก.ย. 66 (90 วัน)
ความก้าวหน้างาน	100%
งวดงาน	3/3 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	12 คน

# 9. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กักขังไฟฟ้าและสุขภาพ ( งานก่อสร้างถนน )





10

## โครงการก่อสร้างงานก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬา และสุขภาพ (งานถมดินก่อสร้างสนามเบดมินตัน)

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ อาร์ 2013
เลขที่สัญญา	236/2566 ลงวันที่ 19 ก.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	499,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	20 ก.ค. 66 - 2 ต.ค. 66 (75 วัน)
ความก้าวหน้างาน	100 %
งวดงาน	3/3 งวด


## 10. โครงการก่อสร้างงานก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานถมดินก่อสร้างสนามเบดมินตัน)






## 11

# โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง	บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด
เลขที่สัญญา	130/2566 ลงวันที่ 24 ม.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	10,900,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	25 ม.ค. 66 – 6 ต.ค. 66 (255วัน) (ยังไม่รวมระยะเวลาที่จะขยายเพิ่มเติมเนื่องจากงานเพิ่ม)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	227 วัน (89.02%)
เหลือระยะเวลา	28 วัน (10.98%)
ความก้าวหน้างาน	98.00%
งวดงาน	4/5 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	20 คน

# 11. โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

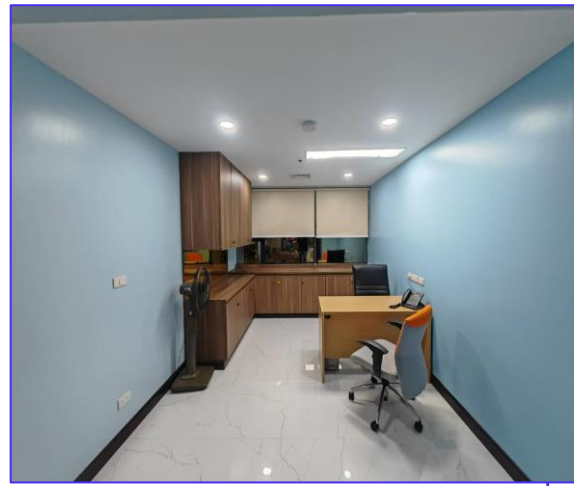



# 11. โครงการปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



2566.09.10 09:07

## ความก้าวหน้างาน

### งานสถาปัตยกรรม

- งานพื้น ผนัง ประตูหน้าต่าง ฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์บิวอิน สุขภัณฑ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จ 98 %

### งานระบบต่างๆ

- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และกำลัง แล้วเสร็จ 98 %
- งานระบบเตือนอัคคีภัย แล้วเสร็จ 98 %
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 98 %

### งานครุภัณฑ์

- ระบบสื่อสารและ Network แล้วเสร็จ 98 %
- ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 98 %
- เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว แล้วเสร็จ 12 %

### งานเพิ่มเติมจากสัญญา

- แล้วเสร็จ 95 %

## 12

## โครงการก่อสร้าง Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ



ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006)
เลขที่สัญญา	234/2566 ลงวันที่ 3 ส.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	2,730,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	8 ส.ค. 66 – 5 ธ.ค. 66 (120 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	32 วัน (26.67%)
เหลือระยะเวลา	88 วัน (73.33%)
ความก้าวหน้างาน	4.52%
งวดงาน	0/4 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	6 คน

## 12. โครงการก่อสร้าง Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ




### ความก้าวหน้างาน

1. งานเสาเหล็ก และโครงเหล็ก รับฝ้าเพดานโซนกลางแล้วเสร็จ 100 %
2. อยู่ระหว่างการทาสีเหล็กกับหน้า และหวางรอบพื้นที่ด้านหน้า เพื่อทำผนังต่อไป



13

## โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัย ลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารเทพการโยธา
เลขที่สัญญา	240/2566 ลงวันที่ 15 ส.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	20,400,000. บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 ส.ค. 66 – 11 พ.ค. 67 (270 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	24 วัน (8.89%)
เหลือระยะเวลา	246 วัน (91.11%)
ความก้าวหน้างาน	2.73%
งวดงาน	0/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	13 คน

# 13. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรม วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)




## ความก้าวหน้างาน

1. งานเทคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อแล้วเสร็จ 100 %
2. อยู่ระหว่างการปรับระดับ เพื่อผูกเหล็กคาน ชั้น 1

# 14

## โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ผู้รับจ้าง	บริษัท เหล็กตราง จำกัด
เลขที่สัญญา	217/2566 ลงวันที่ 22 พ.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	127,000,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	23 พ.ค. 66 – 22 พ.ย. 67 (550 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	108 วัน (19.64%)
เหลือระยะเวลา	442 วัน (80.36%)
ความก้าวหน้างาน	4.17%
งวดงาน	1/18 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	27 คน



## 14. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C





### ความก้าวหน้างาน

1. งานตอกเสาเข็ม                                  แล้วเสร็จ 100%
2. งานหล่อคอนกรีตฐานราก                      แล้วเสร็จ 100%
3. งานหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ                    แล้วเสร็จ 100%
4. งานหล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 1                   แล้วเสร็จ 16%

หมายเหตุ

งานงวดที่ 2 ผู้รับจ้างจะส่งงานประมาณวันที่ 25 ก.ย. 66 และจะเพิ่มจำนวนแรงงานเป็น 50-60 คน ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเร่งรัดงาน



**ความก้าวหน้างานก่อสร้างกำแพง  
และทำคันดินพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย  
รวม 8 โครงการ**

## แผนงานก่อสร้างกำแพงและทำคันดินพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



**1**

ระยะทาง 2.2 กม. (น. S-ZONE)  
แล้วเสร็จเมื่อ 2564

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตด้านทิศตะวันตกพื้นที่ฟาร์ม (แปลง 4) (1.35 กม.)  
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้าง : 1,705,500 บาท  
เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 65  
สิ้นสุดสัญญา 1 เม.ย. 66  
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

**2**

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากซอย 8  
ถึงสะพานคลองเกียบ (3 กม.)  
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้าง : 4,352,000 บาท  
เริ่มสัญญา 20 ธ.ค. 65  
สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย. 66  
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน  
\*ขยายสัญญาถึง 22 พ.ค. 66\*

**5**

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่แปลงสวนไม้  
- สะพานคลองเกียบ (2 กม.)  
ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น เอส ซี อาร์ (2009) จำกัด  
ค่าก่อสร้าง : 3,750,000 บาท  
เริ่มสัญญา 05 ก.ค. 66  
สิ้นสุดสัญญา 02 พ.ย. 66  
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไอคอน - บ้านปลักจอก (7 กม.)  
ผู้รับจ้าง : บริษัท ทูพี ธุรกิจ จำกัด  
ค่าก่อสร้าง : 11,679,000 บาท (7 กม.)  
เริ่มสัญญา 15 มิ.ย. 66  
สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย 67  
ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน

**7**

**3**

งานจ้างทำคันดินปรับระดับเพื่อเป็นคันกันน้ำป้องกันน้ำท่วม  
จากสะพานบ้านคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไม้ (4.1 กม.)  
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้าง : 1,250,000 บาท  
เริ่มสัญญา 10 ม.ค. 66  
สิ้นสุดสัญญา 3 มิ.ย. 66  
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

**8**

ก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานคลองดิน - ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไม้ (4.185กม.)  
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้าง : 4,070,000 บาท  
เริ่มสัญญา 24 ก.ค. 66  
สิ้นสุดสัญญา 21 ธ.ค 66  
ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำชลประทาน  
- สถานีไฟฟ้าย่อย (1.7 กม.)  
ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น เอส ซี อาร์ (2009) จำกัด  
ค่าก่อสร้าง : 2,600,000 บาท  
เริ่มสัญญา 05 ก.ค. 66  
สิ้นสุดสัญญา 02 พ.ย. 66  
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน


**6**

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัด  
คลองดิน - อ่างเก็บน้ำหลังศูนย์การแพทย์ (1.5 กม.)  
ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้าง : 2,880,000 บาท  
เริ่มสัญญา 17 ก.พ. 66  
สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค. 66  
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

**4**



# โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตด้านทิศตะวันตกพื้นที่ฟาร์ม (แปลง 4)

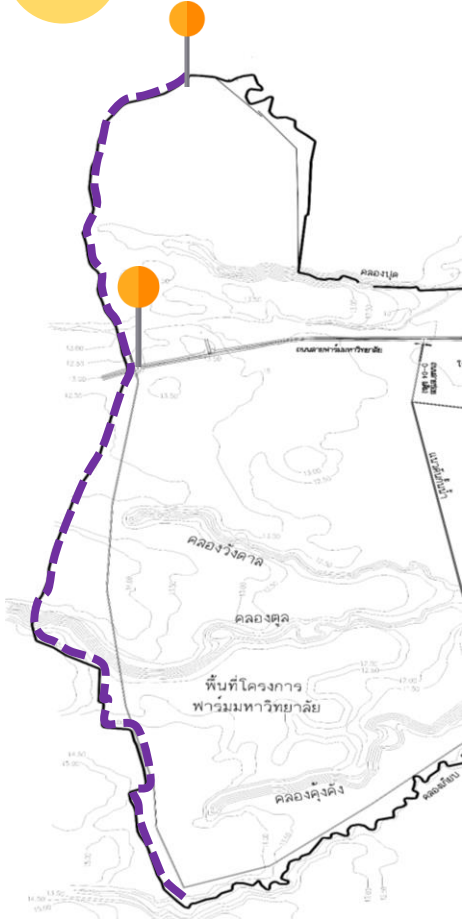

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (1.35 กม.)

ค่าก่อสร้าง : 1,705,500 บาท

เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 65

สิ้นสุดสัญญา 1 เม.ย. 66


ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ความก้าวหน้างาน : 100%

ปัจจุบันงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 100%

- ยกเว้นช่วงที่เว้นไว้ เนื่องจากกรณีพื้นที่พิพาทกับราษฎร ระยะทาง ประมาณ 380 เมตร และวางแผนงานไว้ว่าจะให้เป็นงานเพิ่ม กับผู้รับจ้างในเฟส 4 เข้าดำเนินการได้ในช่วงเดือนกันยายน

## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากซอย 8 ถึงสะพานคลองเกียบ

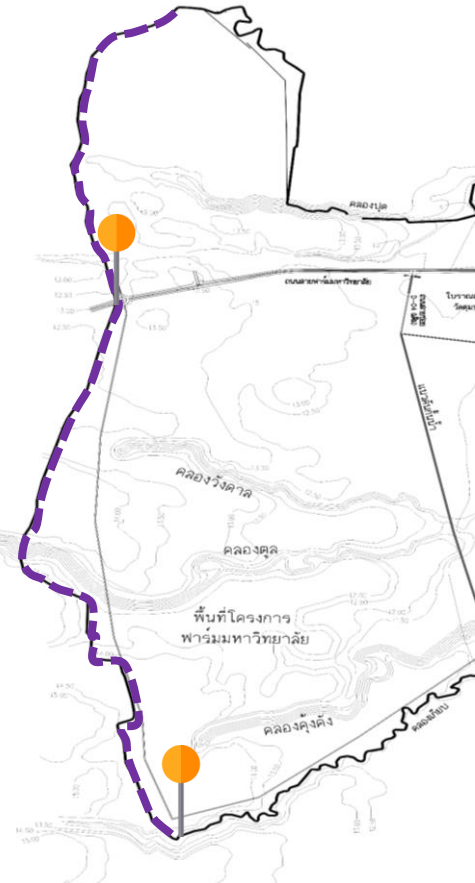

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (3 กม.)

ค่าก่อสร้าง : 4,352,000 บาท

เริ่มสัญญา 20 ธ.ค. 65

สิ้นสุดสัญญา 22 พ.ค. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ความก้าวหน้างาน : 100%

- ยกเว้นช่วงที่เว้นไว้ เนื่องจากกรณีพื้นที่พิพาทกับราษฎร ระยะทาง ประมาณ 250 เมตร และวางแผนงานไว้ว่าจะให้เป็นงานเพิ่ม กับผู้รับจ้างในเฟส 4 เข้าดำเนินการได้ ในช่วงเดือนกันยายน



## โครงการงานจ้างทำคันดินปรับระดับเพื่อเป็นคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมจากสะพานบ้านคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักรับพัสดุ-แปลงสวนไฟ

ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (4.1 กม.)

ค่าก่อสร้าง : 1,250,000 บาท

เริ่มสัญญา 10 ม.ค. 66

สิ้นสุดสัญญา 3 มิ.ย. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ความก้าวหน้างาน : 100 %

- ในส่วนของคันดินที่เว้นไว้ในบางจุด จะอยู่ในงานของ เฟส 8 (บ.หนึ่งบุญถาวร) ที่จะทำรั้วคาวบอย และ แนววางเสาเข็มเพื่อป้องกันการกัดเซาะแนวตลิ่ง (ช่วงวังหมาก)





## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัดคลองดิน - อ่างเก็บน้ำชลาสูตรณ์



ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง (1.5 กม.)

ค่าก่อสร้าง : 2,880,000 บาท


เริ่มสัญญา 17 ก.พ. 66

สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ความก้าวหน้างาน : 85.00%

- สัปดาห์นี้ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 3 และแนบท้ายสัญญา 1 งวด

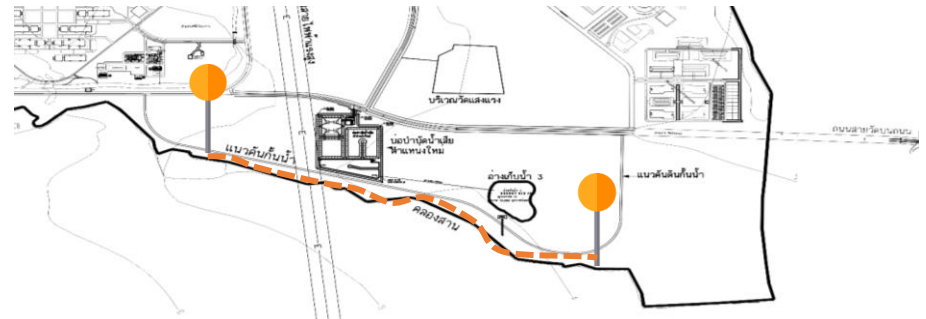

4

## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัดคลองดิน - อ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์



## 4 โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัดคลองดิน - อ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์ งานเพิ่มถมดินปรับพื้นที่บริเวณหอพักศูนย์การแพทย์

Before : 📍




ปัจจุบัน 📍 ถมดินได้ประมาณ 90%





## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่แปลงสวนไม้ - สะพานคลองเกียบ

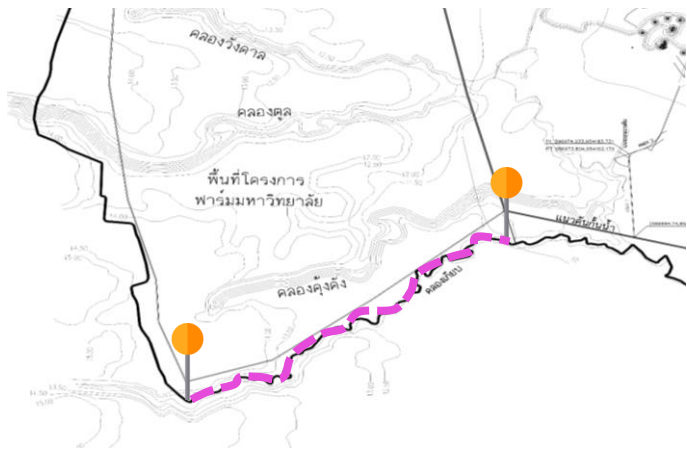

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น เอส ซี อาร์ (2009) จำกัด

งบ : 3,750,000 บาท (2 กม.)

เริ่มสัญญา 05 ก.ค. 66

สิ้นสุดสัญญา 02 พ.ย. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ความก้าวหน้างาน : 25.00%

- ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 18 กันยายน 2566



5

## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่แปลงสวนไม้ - สะพานคลองเกียบ





5

## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่แปลงสวนไม้ - สะพานคลองเกียบ





5

## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่แปลงสวนไม้ - สะพานคลองเกียบ



## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่ อ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์ - สถานีไฟฟ้าย่อย



ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น เอส ซี อาร์ (2009) จำกัด

งบ : 2,600,000 บาท (1.7 กม.)


เริ่มสัญญา 05 ก.ค. 66

สิ้นสุดสัญญา 02 พ.ย. 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ความก้าวหน้างาน : 63.00%

- ส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 11 กันยายน 2566

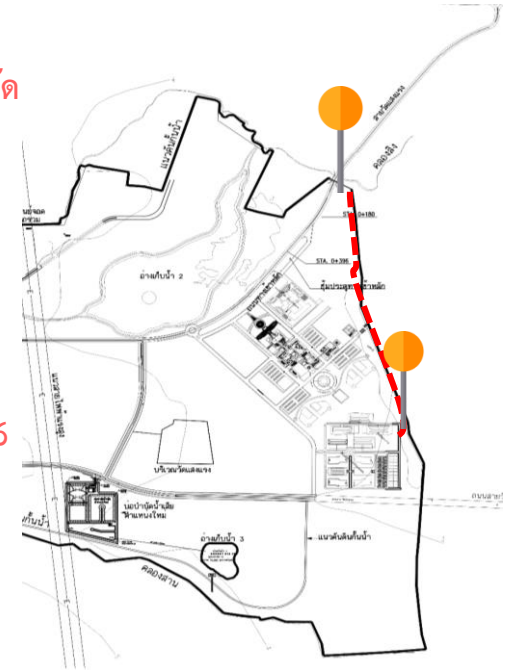







6

## โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่ อ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์ – สถานีไฟฟ้าย่อย (ต่อ)



## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก

ผู้รับจ้าง : บริษัท ทูพี ธรุกิจ จำกัด


ค่าก่อสร้าง : 11,679,000 บาท (7 กม.)

เริ่มสัญญา 15 มิ.ย. 66

สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย 67

ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน

- งานทั้งหมด 10 งวด เบิกไปแล้ว 3 งวด (23.50%) ความก้าวหน้างาน 43.00 %  
ผู้รับจ้างจะเบิกงานงวดที่ 4,5 และ 6 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 (53.50%)

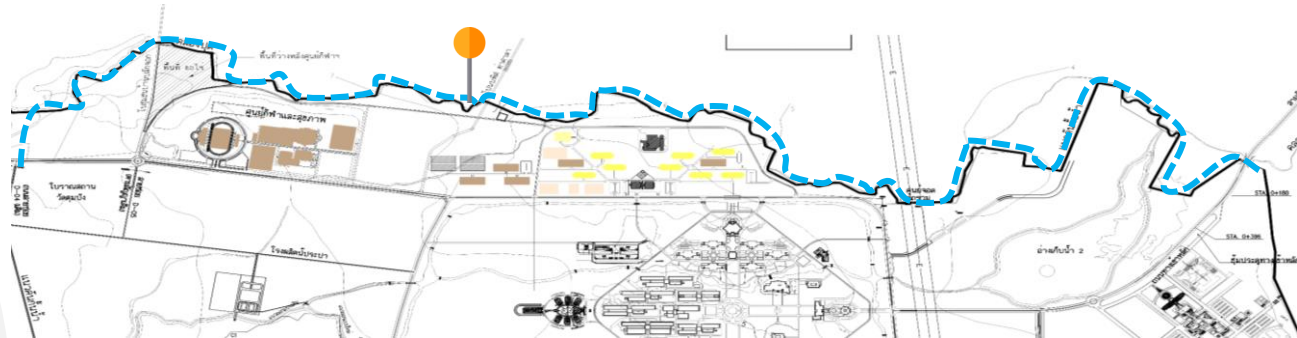



## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก (ต่อ)





# โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไฟ



ผู้รับจ้าง : หจก. หนึ่งบุญถาวรก่อสร้าง


ค่าก่อสร้าง : 4,070,000 บาท

เริ่มสัญญา 24 ก.ค. 66



สิ้นสุดสัญญา 21 ธ.ค 66

ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งผลิตเสาสำเร็จรูป และรั้วควายบอย

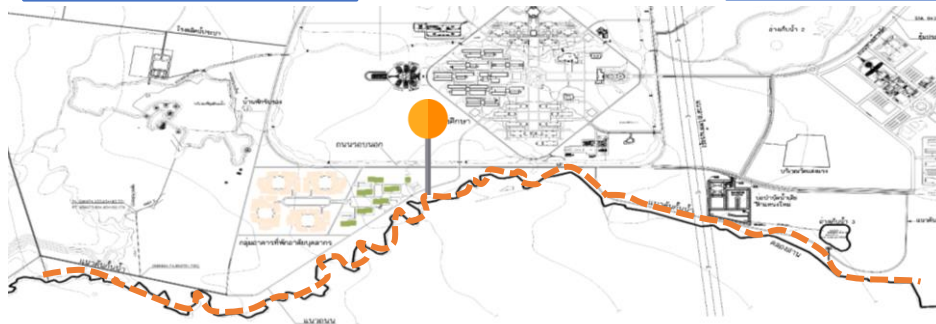

## งานรั้วคาวบอย

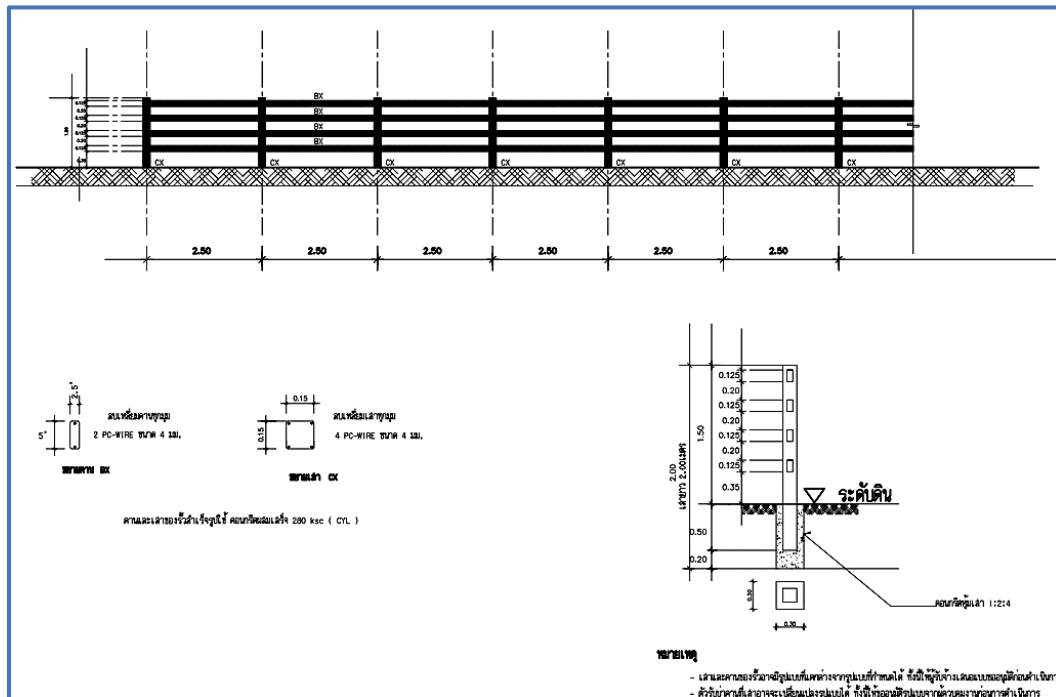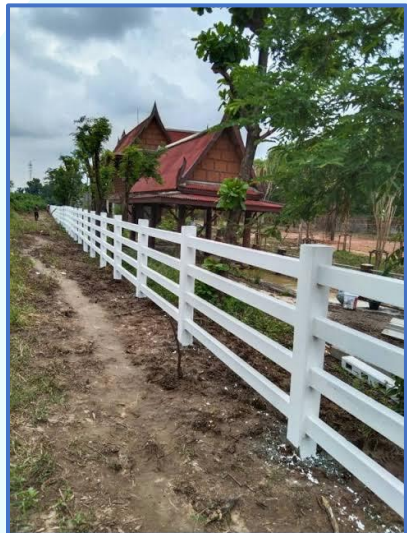



## เพิ่มเติม

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11:00 น.

ฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจออกแบบโครงการแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชน 114 ไร่ และ

วัดแสงแรง เสนอของบโครงการฯ ในปี 2567

วงเงินงบประมาณ 8.0 ล้านบาท

- จุดคลองชักน้ำโดยรอบ ส่งลงแก้มลิง
- ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ขนาด 0.3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง (ไฟฟ้า 1 , เครื่องยนต์ 1)
- จุดคลองส่งน้ำ ระบายลงสู่คลองเกียบ





ชุมชน 114 ไร่

วัดแสงแรง




แก้มลิง & สถานีสูบน้ำ



โรงผลิตน้ำประปา



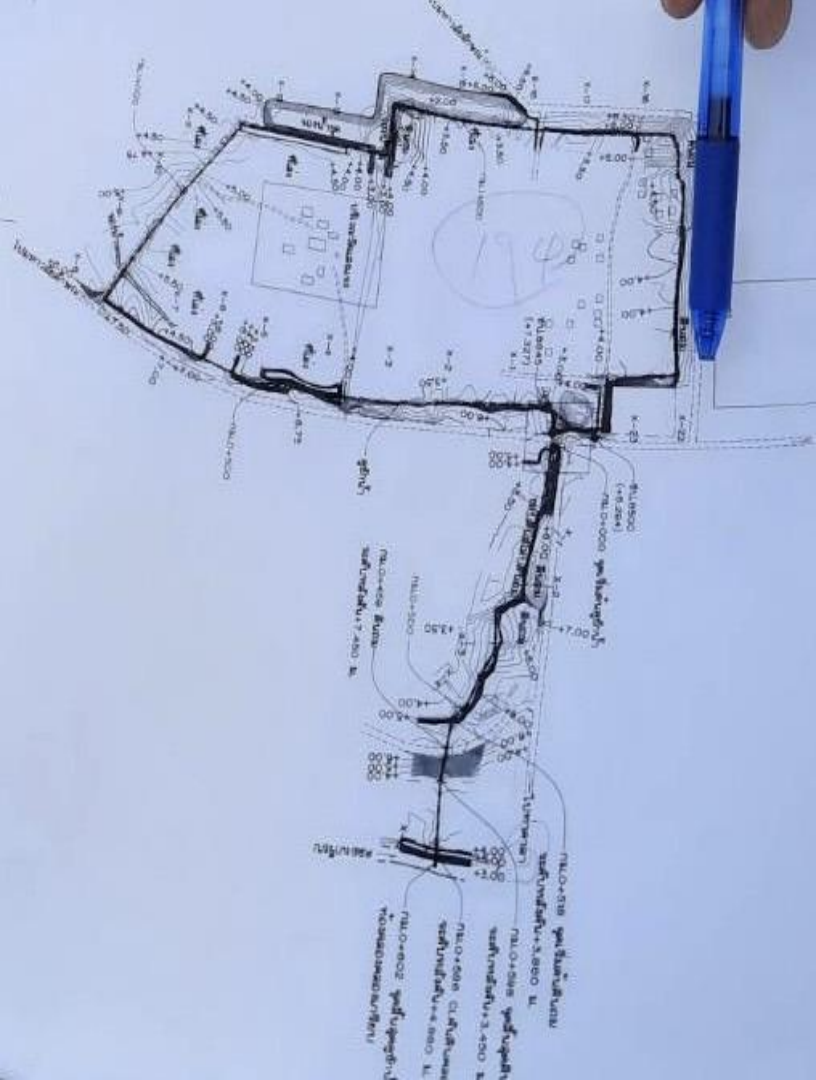

**THANK YOU**
