




# รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง รวม 11 โครงการ

ประจำเดือน เมษายน 2567

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

1

# โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง	บริษัท นิธิรัฐกร เอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขที่สัญญา	019/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 65
วงเงินก่อสร้าง	69,917,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	2 ธ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 67 (577 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	512 วัน (88.73%)
เหลือระยะเวลา	65 วัน (11.27%)
ความก้าวหน้างาน	97.14%
งวดงาน	8/10 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	35 คน


# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

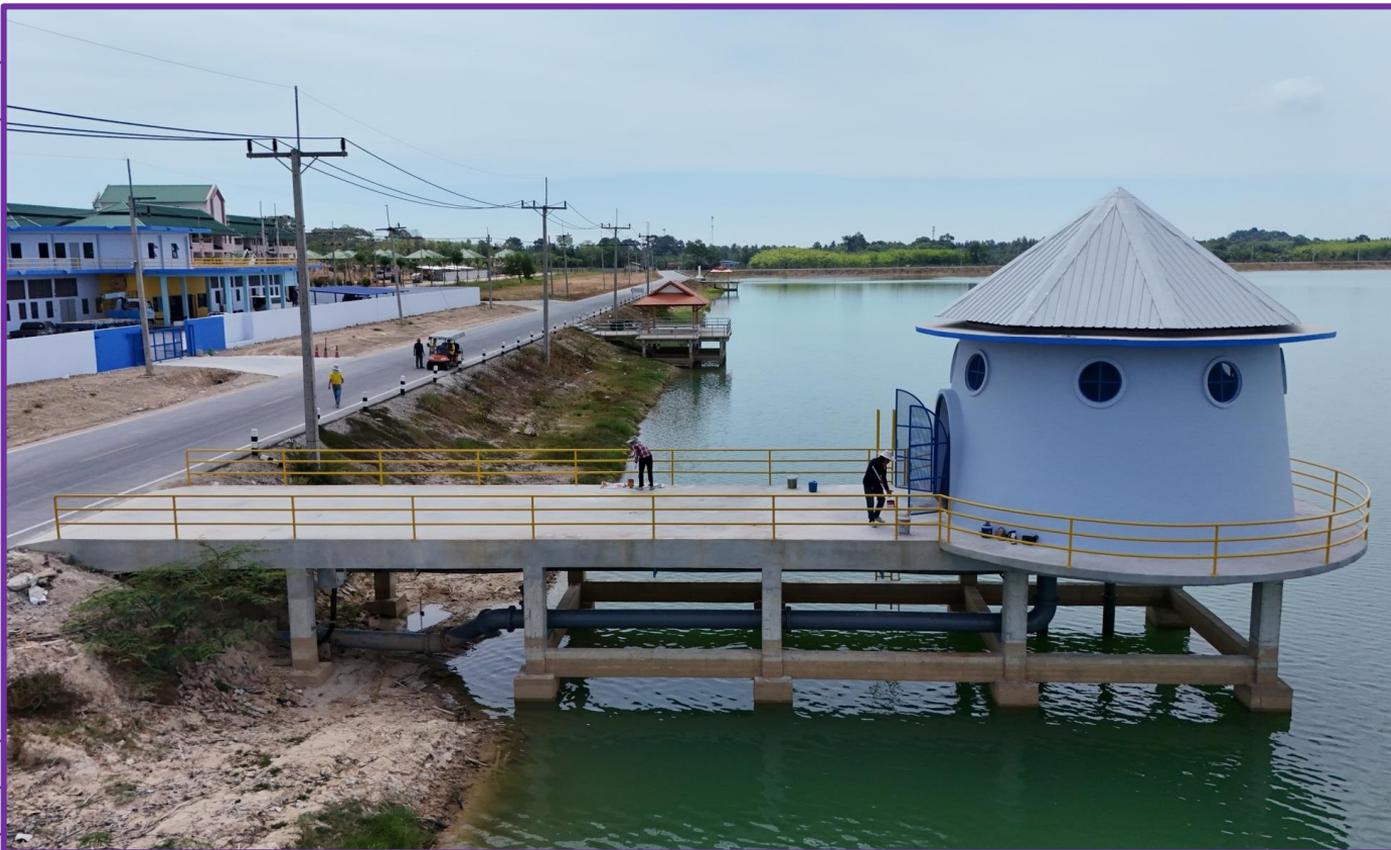

สถานีสูบน้ำดิบ

-งานระบบสูบน้ำดิบ แล้วเสร็จทั้งหมด

# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ระบบการผลิตน้ำประปา

งานติดตั้งถังตกตะกอน ถังกรอง  
ถังเก็บน้ำใส และการเดินท่อ  
ต่อเชื่อมแล้วเสร็จทั้งหมด


# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

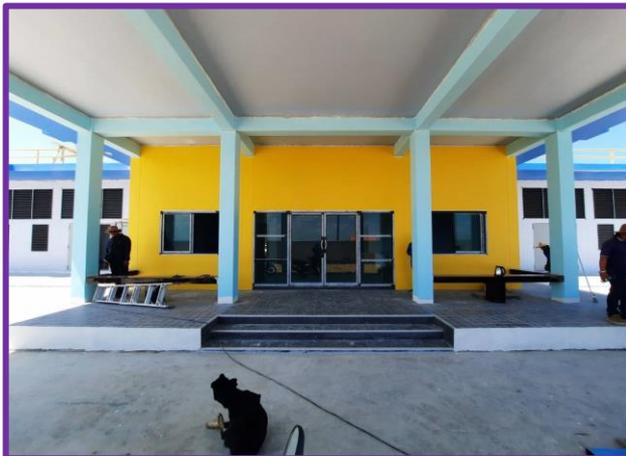

# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## สถานีโรงผลิต

1. งานโดยรวมแล้วเสร็จ 98 % เหลือการเก็บรายละเอียดของงาน
2. อยู่ระหว่างกระบวนการทดสอบระบบการผลิต การจ่ายสารเคมีเพื่อให้น้ำประปาที่ผลิตได้คุณภาพ

# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## งานภายนอก

- 1.-งานก่อสร้างกำแพง  
-ระบบระบายน้ำฝน  
-งานก่อสร้างถนน ลานจอดรถ  
และทางเดิน  
-งานก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ  
-งานก่อสร้างบ่อทิ้งตะกอน  
แล้วเสร็จทั้งหมด
2. อยู่ระหว่างงานปรับดินรอบ  
โครงการ ก่อนส่งมอบงานต่อไป



- งานงวดที่ 9 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ  
แล้วอยู่ระหว่างกระบวนการ  
ตรวจรับ  
งานงวดที่ 10 จะส่งมอบงาน  
ปลายเดือน พ.ค. 67

# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศกพ. ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศกพ. ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 8



## 2

### โครงการปรับปรุงอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่สัญญา	140/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ. 66
วงเงินก่อสร้าง	68,023,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	7 มี.ค. 66 – 7 ก.ค. 67 (488วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	416 วัน (85.25%)
เหลือระยะเวลา	72 วัน (14.75%)
ความก้าวหน้างาน	92.58 %
งวดงาน	8/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	50 คน

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 1

1. งานผนังภายใน+ฝ้าเพดาน+ประตู-หน้าต่าง+งานปูกระเบื้อง  
ยางภายในห้อง + งานทาสี แล้วเสร็จ 98 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ความก้าวหน้างาน ชั้น 1

2. งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิคทางเดินและภายในห้อง  
แล้วเสร็จ 95 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 1

3. งานติดตั้งกระเบื้องห้องน้ำ+ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ  
แล้วเสร็จ 98 %
4. งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 96.5 %
5. งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 67.50 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 2

1. งานผนังภายใน+ฝ้าเพดาน+ประตู-หน้าต่าง+งานปูกระเบื้องยางภายในห้อง + งานทาสี แล้วเสร็จ 98 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ความก้าวหน้างาน ชั้น 2

2. งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิกทางเดิน และภายใน  
ห้องต่างๆ แล้วเสร็จ 72 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 2

3. งานติดตั้งกระเบื้องห้องน้ำ+ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ  
แล้วเสร็จ 98 %
4. งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 95.5 %
5. งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 95.50 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 3

1. งานผนัง+งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ต่าง แล้วเสร็จ 90 %
2. งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 10 %
3. งานทาสีผนัง แล้วเสร็จ 58 %
4. งานทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 7 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 3

5. งานติดตั้งกระเบื้องห้องน้ำ แล้วเสร็จ 98 %
6. งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จ 90 %
7. งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 70.50 %
8. งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 95.50 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### งานสถาปัตยกรรมภายนอก

1. งานทาสี แล้วเสร็จ 92 %
2. งานติดตั้งคอมโพสิตผนัง แล้วเสร็จ 95 %
3. งานติดตั้งคอมโพสิตผนังฉลุลาย แล้วเสร็จ 85 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์






อาคารนิตินทร ( เดิม )

- งานปรับปรุงอาคารภาพรวม แล้วเสร็จ 98 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลานเสาธง หน้าอาคาร

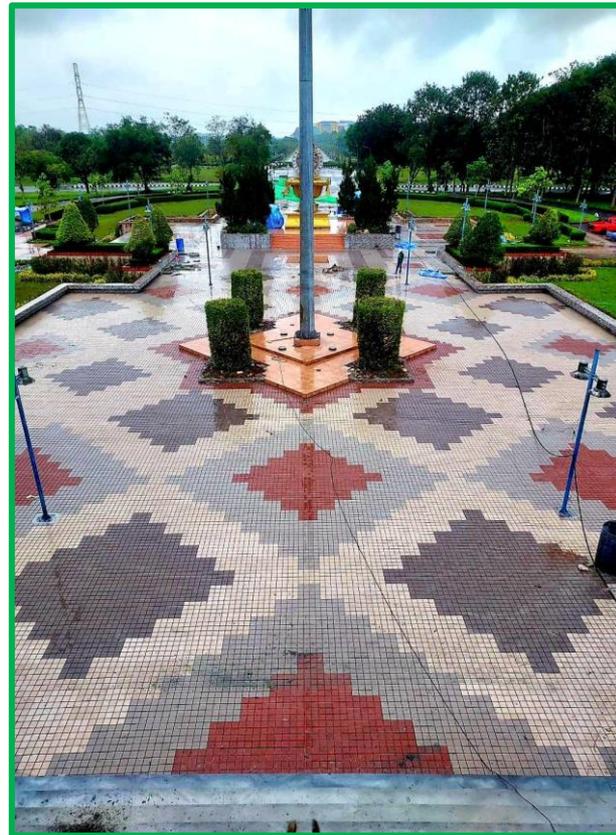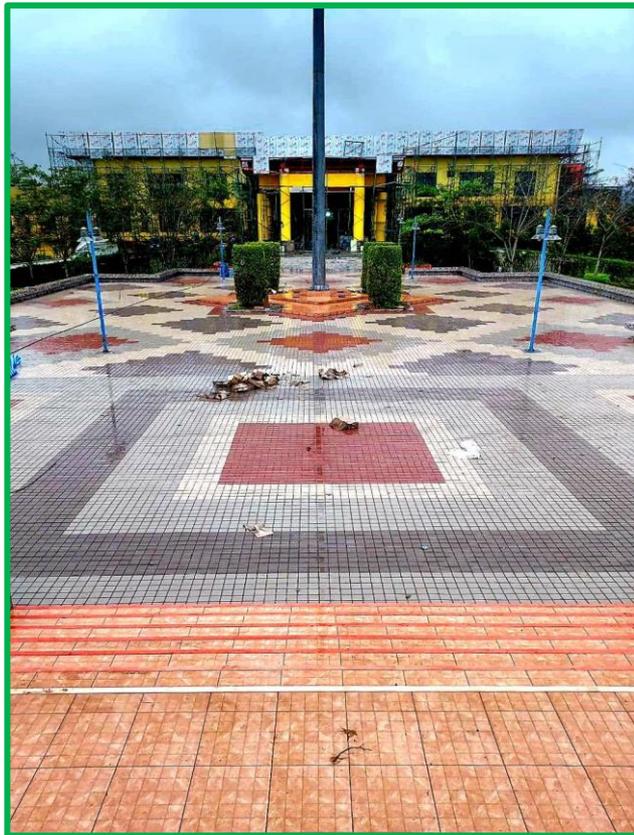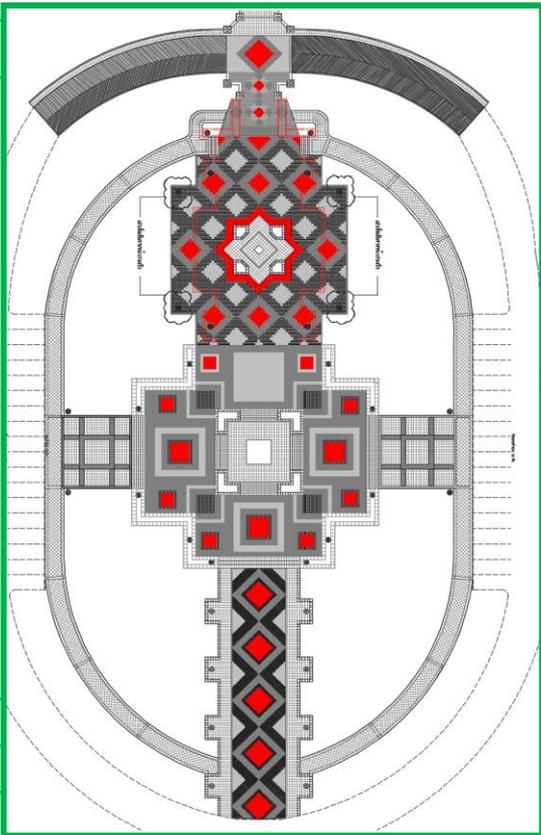

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### ลานเสาธง หน้าอาคาร


1. งานปูกระเบื้องเคนไซด์  
แล้วเสร็จ 98 %
2. งานปูกระเบื้องเซรามิค  
แล้วเสร็จ 98 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์





## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

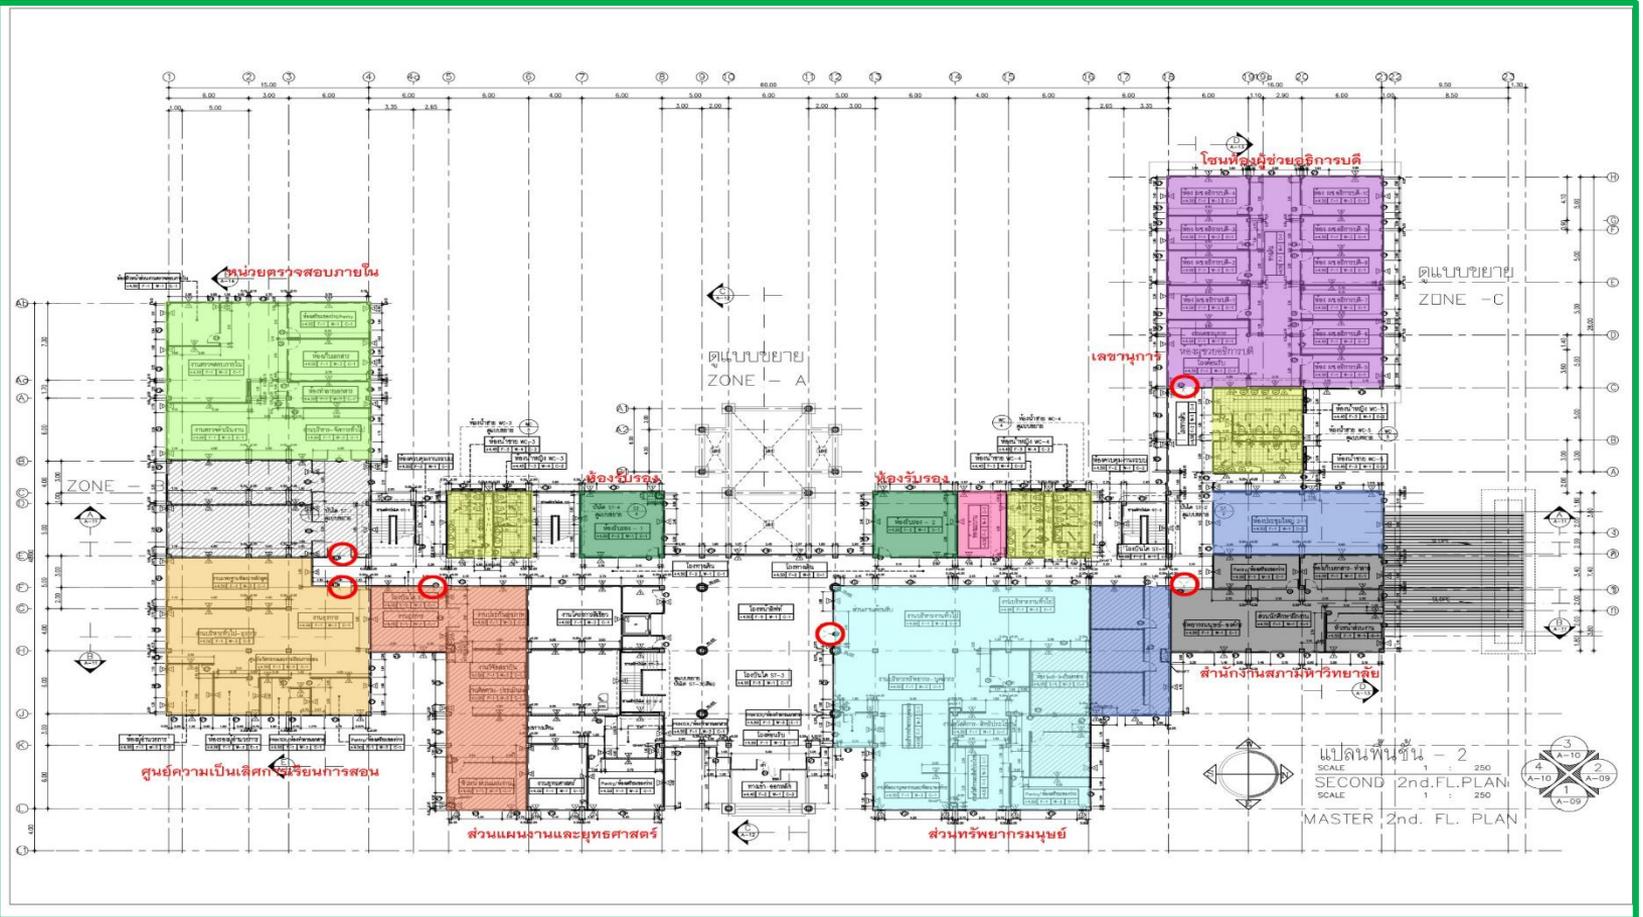



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมประจำเดือนติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจการจ้าง งานงวดที่ 8




## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจการจ้าง งานงวดที่ 8



# 3

## โครงการก่อสร้างโรงเรียนกล้วยไม้



ผู้รับจ้าง	บริษัท สุวรรณพงศ์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่สัญญา	159/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ. 66
วงเงินก่อสร้าง	9,453,949.96 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	18 ก.พ. 66 – 2 เม.ย. 67 (410วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	410 วัน (100 %)
เหลือระยะเวลา	0 วัน ( - %)
ความก้าวหน้างาน	100%
งวดงาน	9/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	- คน

### 3. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้



### 3. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้



### 3. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้



### 3. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้

โรงเรือนจัดแสดง



โรงเรือนเร่งดอก



โรงเรือนอนุบาล



### 3. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้

สำนักงานด้านหน้า



### 3. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้

สำนักงานกลาง



### 3. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้

ห้องน้ำส่วนกลาง



### 3. โครงการก่อสร้างโรงเรียนกล้วยไม้ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 9 ( งานงวดสุดท้าย )



### 3. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 9 ( งานงวดสุดท้าย )



### 3. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 9 ( งานงวดสุดท้าย )




## 4

# โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
เลขที่สัญญา	204/2566 ลงวันที่ 12 เม.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	38,119,908.99บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	13 เม.ย. 66 – 30 ก.ค. 67 (475วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	380 วัน (80.00%)
เหลือระยะเวลา	95 วัน (20.00%)
ความก้าวหน้างาน	65.58%
งวดงาน	5/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	30 คน

# 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

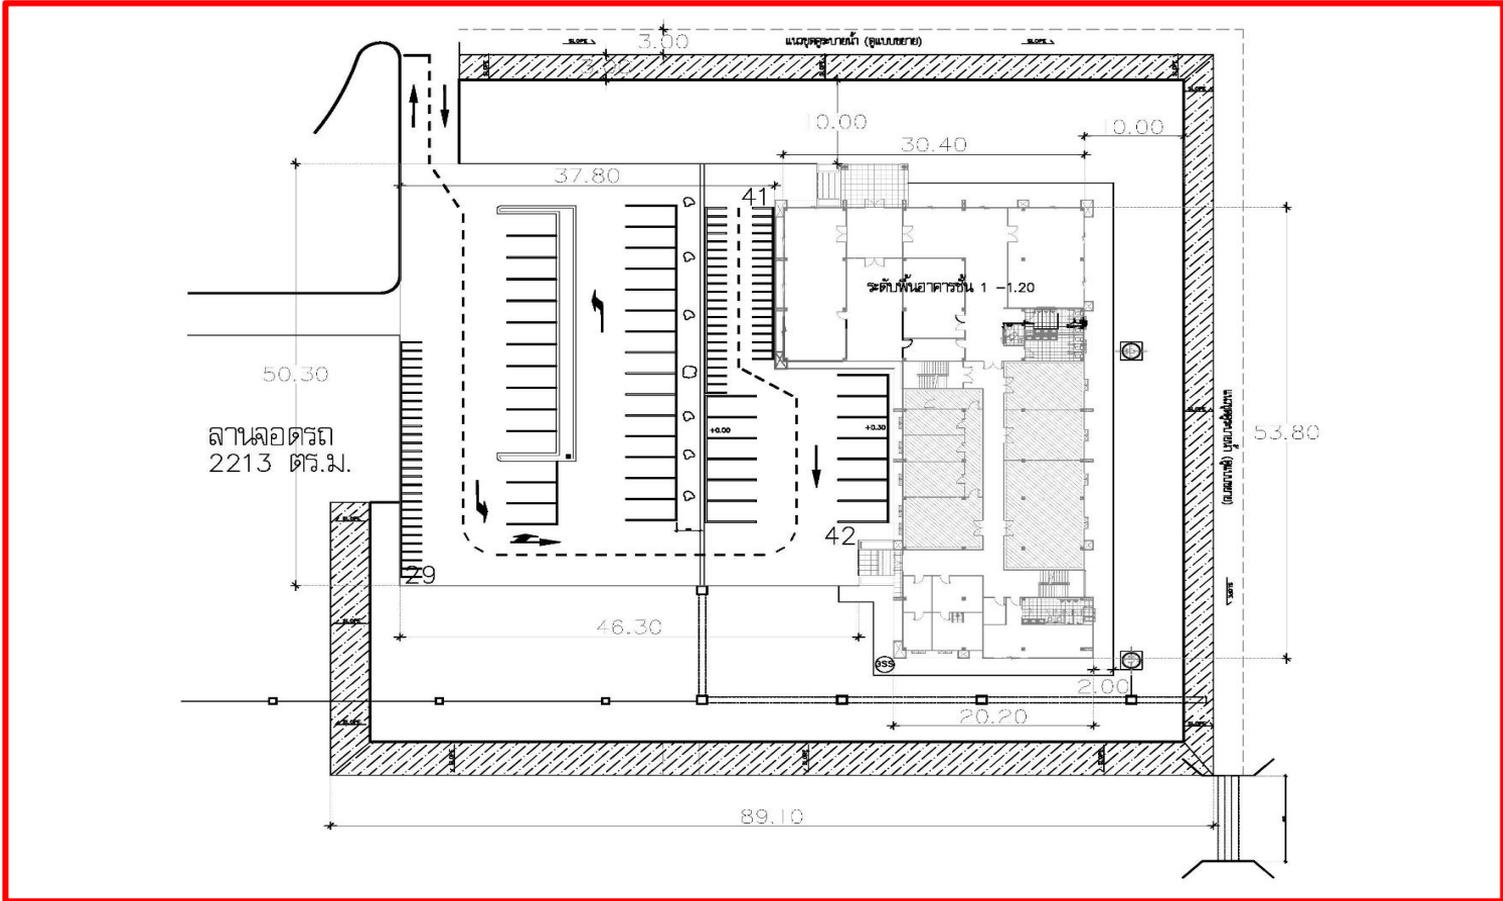

#### 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



#### 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



#### 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



#### 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์





## 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น1



## 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น1

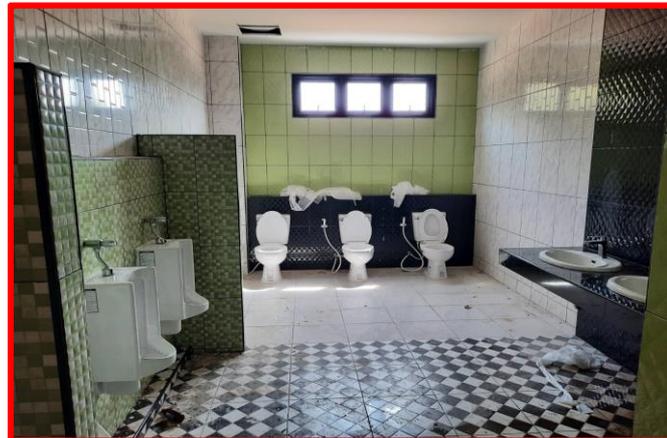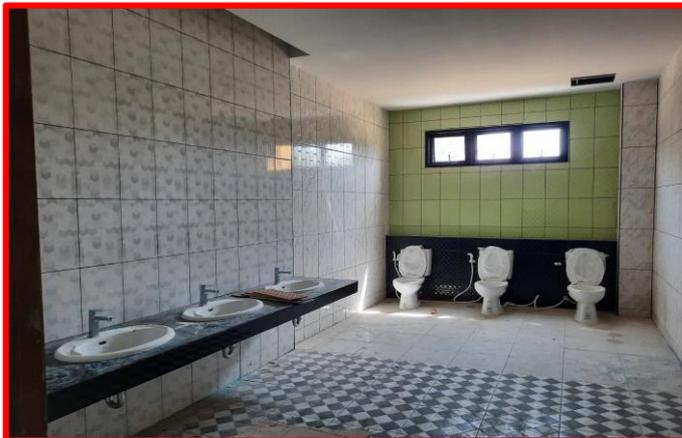

## 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 2



### ความก้าวหน้างานอาคาร

1. ผนังก่ออิฐ+ฉาบปูน+ฉาบโครงสร้าง แล้วเสร็จ 98 %
2. งานติดตั้งวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ 85 %
3. งานติดตั้งวัสดุผิวผนัง แล้วเสร็จ 95 %
4. งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ 70 %
5. งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จ 90 %
6. งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 95 %
7. งานติดตั้งดวงโคม+สวิทซ์และปลั๊ก แล้วเสร็จ 90 %
8. งานเดินท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 90 %
9. งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90 %
10. ส่วนครุภัณฑ์สำนักงานได้ผลิตแล้วจะจัดส่ง ปลายเดือน พ.ค และ มิ.ย. 67 นี้

## 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานภายนอก



1. งานเทคอนกรีตถนนและลานจอด แล้วเสร็จ 95 %
2. งานต่อเมมแรงสูงเข้าอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
3. งานถมดินปรับระดับภายนอก แล้วเสร็จ 75 %

หมายเหตุ งานงวดที่ 6 ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ

#### 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



#### 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า อธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร



#### 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า อธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร



#### 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า อธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร



#### 4. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า อธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างงานถมดินปรับระดับรอบอาคาร



## 5

## โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามเบดมินตัน)

ผู้รับจ้าง	บริษัท ชุมพร คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่สัญญา	219/2566 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	27,810,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 มิ.ย. 66 – 24 มิ.ย. 67 (375วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	316 วัน (84.27%)
เหลือระยะเวลา	59 วัน (15.73%)
ความก้าวหน้างาน	79.76%
งวดงาน	4/7 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	24 คน



## 5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามเบดมินตัน)



## 5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



## 5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามเบดมินตัน)



## 5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามเบดมินตัน)




## 5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1



## 5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 2

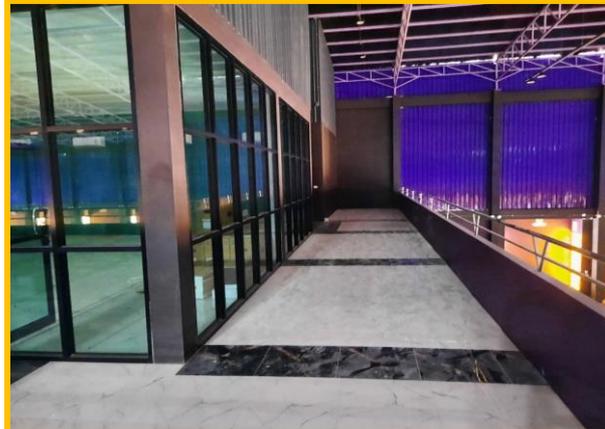


## 5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

งานห้องน้ำ



## 5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามเบดมินตัน)

ชั้น 1 โถงสนามเบด

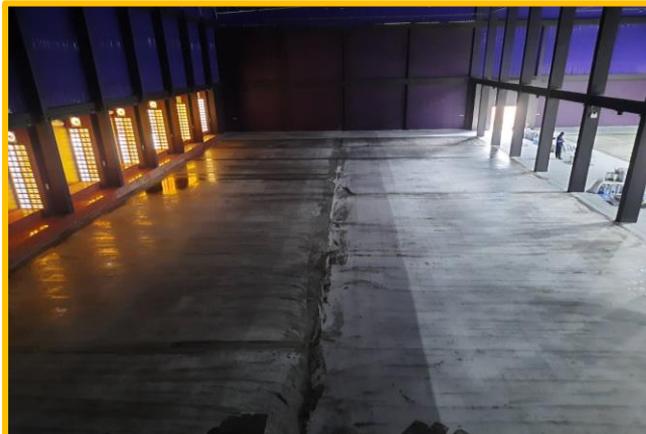

### ความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคาร

งานอาคารแล้วเสร็จเกือบทั้งหมด

งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. งานปูพื้นยางสังเคราะห์สนามเบดมินตัน ดำเนินการได้ 25 %
2. งานเก็บรายละเอียดงานต่างๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ

### ครุภัณฑ์จัดซื้อ

1. งานติดตั้งครุภัณฑ์สื่อโสต ได้สั่งซื้อแล้ว และอยู่ระหว่างเดินท่อร้อยสายสัญญาณ
2. ครุภัณฑ์เสาดำช่วยสนามเบดมินตันเข้าพื้นที่ทั้งหมดแล้ว 100 %
3. เฟอร์นิเจอร์อยู่ระหว่างดำเนินการได้ 80 %

## 5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



### งานภายนอกอาคาร

1. งานเทคอนกรีตถนน ลานจอดรถ และพื้นที่ทางเดินรอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด และจะตีเส้นจราจรต่อไป
2. งานเดินเมนไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ และแรงต่ำเข้าตัวอาคาร และติดตั้งโคมแสงสว่างถนนอยู่ระหว่างดำเนินการ
3. งานปรับเคลียร์ดินภายนอกอาคารอยู่ระหว่างดำเนินการ

งานงวดที่ 5 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับงาน

## 5. โครงการก่อสร้างสนามแบดมินตัน ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง




## 6

## โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา+หลังคาคลุมสระฝึกซ้อม )

ผู้รับจ้าง	บริษัท สุวรรณพงศ์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่สัญญา	214/2566 ลงวันที่ 15 พ.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	16,287,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 พ.ค. 66 – 30 มี.ค. 67 (320 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	320 วัน (100%)
เหลือระยะเวลา	0 วัน (0%)
ความก้าวหน้างาน	100 %
งวดงาน	8/8 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	- คน

## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ

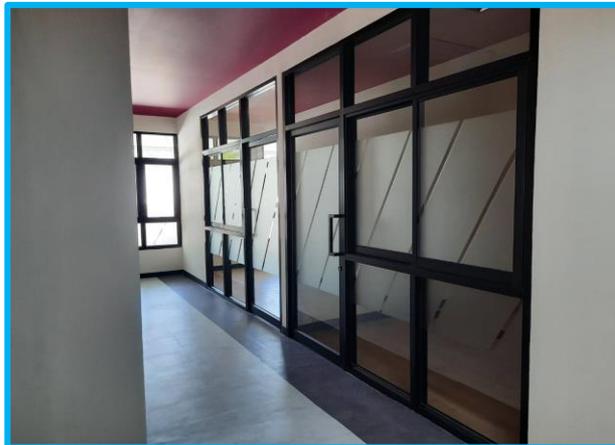

## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ







## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ





## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ



## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ

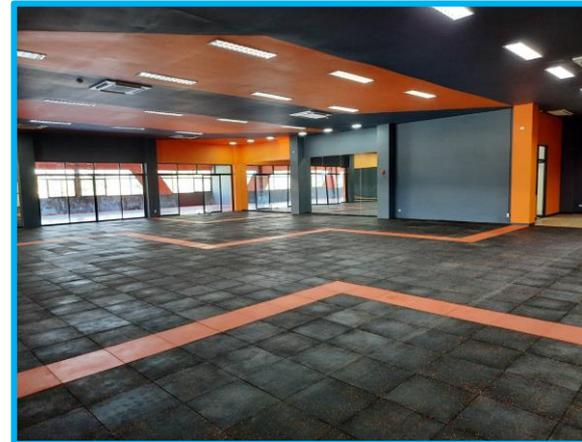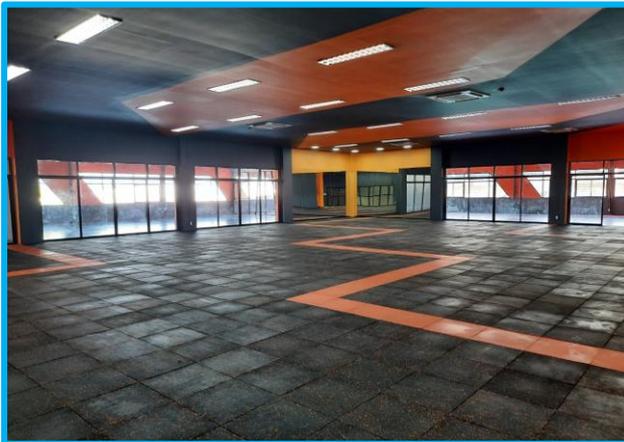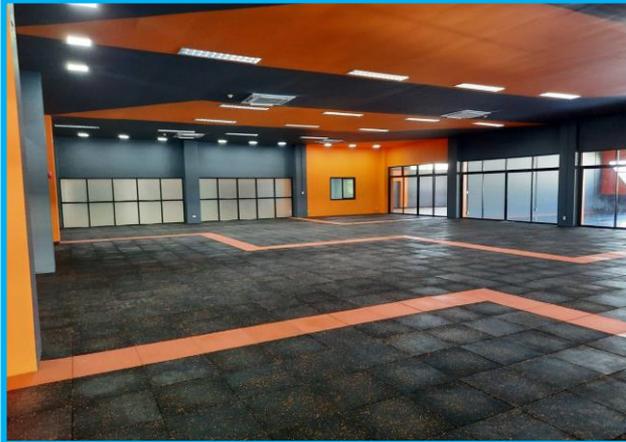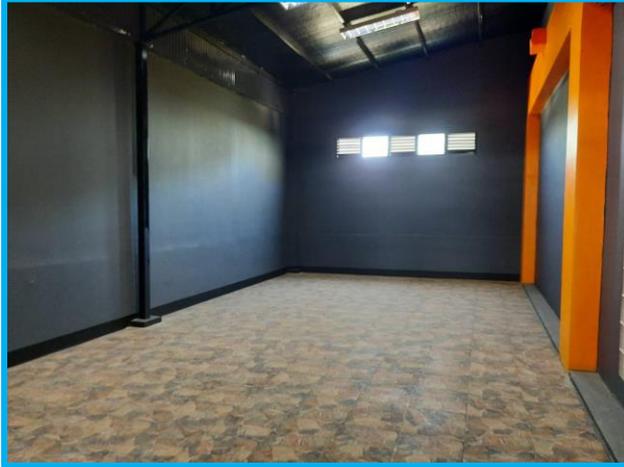

## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ

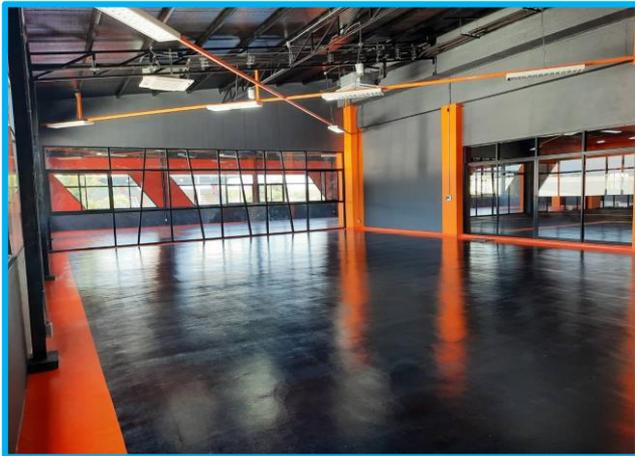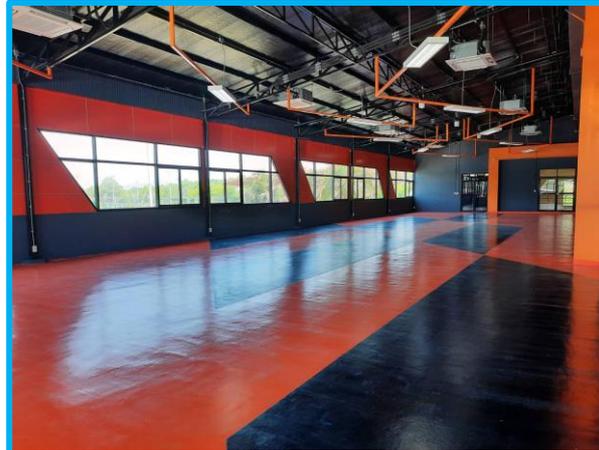

## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 7



## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 7



## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 8 ( งานงวดสุดท้าย )



## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตรวจการจ้างงาน งานงวดสุดท้าย )



## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ อธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ อธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ อธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 7

## โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารเทพการโยธา
เลขที่สัญญา	240/2566 ลงวันที่ 15 ส.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	20,400,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 ส.ค. 66 – 18 ส.ค. 67 (369 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	255 วัน (69.11%)
เหลือระยะเวลา	114 วัน (30.89%)
ความก้าวหน้างาน	43.00%
งวดงาน	4/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	15 คน

## 7. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อวศร มพัฒนา วิทยาลัยลักษณะ (งานก่อสร้างอาคาร)



## 7. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



## 7. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



### ความก้าวหน้างานอาคาร

1. งานโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ 98 %
2. งานประกอบติดตั้งโครงเหล็กกับหลังคา แล้วเสร็จ 80 %
3. งานผนังก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
4. งานฉาบปูนผนัง+โครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 80 %
5. งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90 %

## 7. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



### ความก้าวหน้างานอาคาร

6. งานผนังก่ออิฐ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 95 %

7. งานฉาบปูนผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จ 70 %

## 7. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



### ความก้าวหน้างานลานพลาซ่า

1. เทคอนกรีตพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายลานด้านหน้าอาคาร แล้วเสร็จ 90 %
2. งานก่ออิฐ+ฉาบรองพื้นเตรียมผิว กำแพงรั้วลานพลาซ่า แล้วเสร็จ 95 %

งานงวดที่ 5 ผู้รับจ้างจะส่งงานปลายเดือน พ.ค. 67

## 7. โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 7. โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตรวจสอบการจ้างงาน งวดที่ 4



## 7. โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 4




## 7. โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 4



## 8

## โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ผู้รับจ้าง	บริษัท เหล็กตราง จำกัด
เลขที่สัญญา	217/2566 ลงวันที่ 22 พ.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	127,176,737.86 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	23 พ.ค. 66 – 6 ก.พ. 68 (626 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	344 วัน (54.95%)
เหลือระยะเวลา	282 วัน (45.05%)
ความก้าวหน้างาน	25.13 %
งวดงาน	5/18 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	86 คน

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



### ความก้าวหน้างาน

#### งานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้าง ชั้นที่ 1 และ 2  
แล้วเสร็จ 100 %
2. เทคอนกรีตคาน ชั้นที่ 3  
แล้วเสร็จ 100 %
3. เทคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 3  
แล้วเสร็จ 90 %
4. งานเทคอนกรีตเสา ชั้นที่ 3  
แล้วเสร็จ 35 %
5. งานเทคอนกรีตคาน ชั้นที่ 4  
แล้วเสร็จ 8 %

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



- ความก้าวหน้างาน  
งานสถาปัตยกรรม+งานระบบสุขาภิบาล
6. งานผนังก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
  7. งานผนังก่ออิฐ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 38%
  8. งานติดตั้งท่อสุขาภิบาล ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
  9. งานติดตั้งท่อสุขาภิบาล ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100 %
  10. งานติดตั้งท่อสุขาภิบาล ชั้น 3 แล้วเสร็จ 5 %

งานงวดที่ 6 ผู้รับจ้างจะส่งงาน กลางเดือน พค. 67

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 5



## 9

## โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออก ของสนามกีฬาากลางตุมปัง

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โยธากิจ (2000)
เลขที่สัญญา	270/2566 ลงวันที่ 6 พ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	2,940,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	7 พ.ย. 66 – 13 ก.ค. 67 (250 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	172 วัน (68.80%)
เหลือระยะเวลา	78 วัน (31.20%)
ความก้าวหน้างาน	95.00 %
งวดงาน	2/3 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	3 คน



## 9. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง



## 9. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง



### ความก้าวหน้างาน

- งานปรับเคลียร์พื้นที่  
แล้วเสร็จ 98 %
- งานถมดินปรับระดับ  
แล้วเสร็จ 95 %
- งานปรับระดับพื้นที่จะ  
ดำเนินการต่อไป

## 9. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง



## 9. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง




- งานแต่งแนวคูทางระบายน้ำ  
แล้วเสร็จ 70 %

งานงวดที่ 3 ส่งงานปลายเดือน

พ.ค. 67

๑. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุ้มปึง ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 2





ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจอาร์ คอนสตรัคชั่น
เลขที่สัญญา	275/2566 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	650,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	19 ธ.ค. 66 – 23 เม.ย. 67 (127 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	127 วัน (100%)
เหลือระยะเวลา	0 วัน (0%)
ความก้าวหน้างาน	100 %
งวดงาน	3/3 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	- คน

## 10. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ



## 10. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์มานิ



- ป้ายโครงการยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร
- ลำธาร ยาว 32 เมตร กว้าง 10 เมตร สูง 50 ซม. พร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ

## 10. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์มานี



# 10. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์มานิ




## 10. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑชาติพันธุ์มานิ



# 10. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑชาติปันธุมานี ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 1-3





ผู้รับจ้าง	บริษัท เอกธन्छ แฟ้นท์ จำกัด
เลขที่สัญญา	023/2566 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 65
วงเงินก่อสร้าง	21,850,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	1 ก.พ. 67 – 27 ก.ย. 67 (240 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	86 วัน (35.83%)
เหลือระยะเวลา	154 วัน (64.17%)
ความก้าวหน้างาน	16.28 %
งวดงาน	0/8 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	25 คน

## 11. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



### ความก้าวหน้างาน

1. งานทุบรื้อผนัง พื้น ฝ้าเพดาน และงานระบบต่างๆ  
แล้วเสร็จ 97 %

## 11. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



ความก้าวหน้างาน

- งานปูกระเบื้องพื้นผนังห้องน้ำ  
ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 10 ห้อง

## 11. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



## 11. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6




### ความก้าวหน้างาน

3. งานติดตั้งผนังห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ 80 %
4. งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 65 %
5. งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 21.49 %
6. งานระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ 21.05 %
7. งานเทคอนกรีตพื้นคอร์ดกลาง ชั้น 1 แล้วเสร็จ
8. งานเทคอนกรีตเสาคาน พื้น โครงสร้าง อาคารที่ต่อเติม แล้วเสร็จ 1 ด้าน

งานงวดที่ 1 และ 2 ผู้รับจ้างส่งงานส่งมอบงานกลางเดือน พ.ค. 67

ความก้าวหน้างานก่อสร้างกำแพง  
และทำคันดินพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย  
รวม 8 โครงการ

# งานก่อสร้างกำแพงและทำคันดินพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

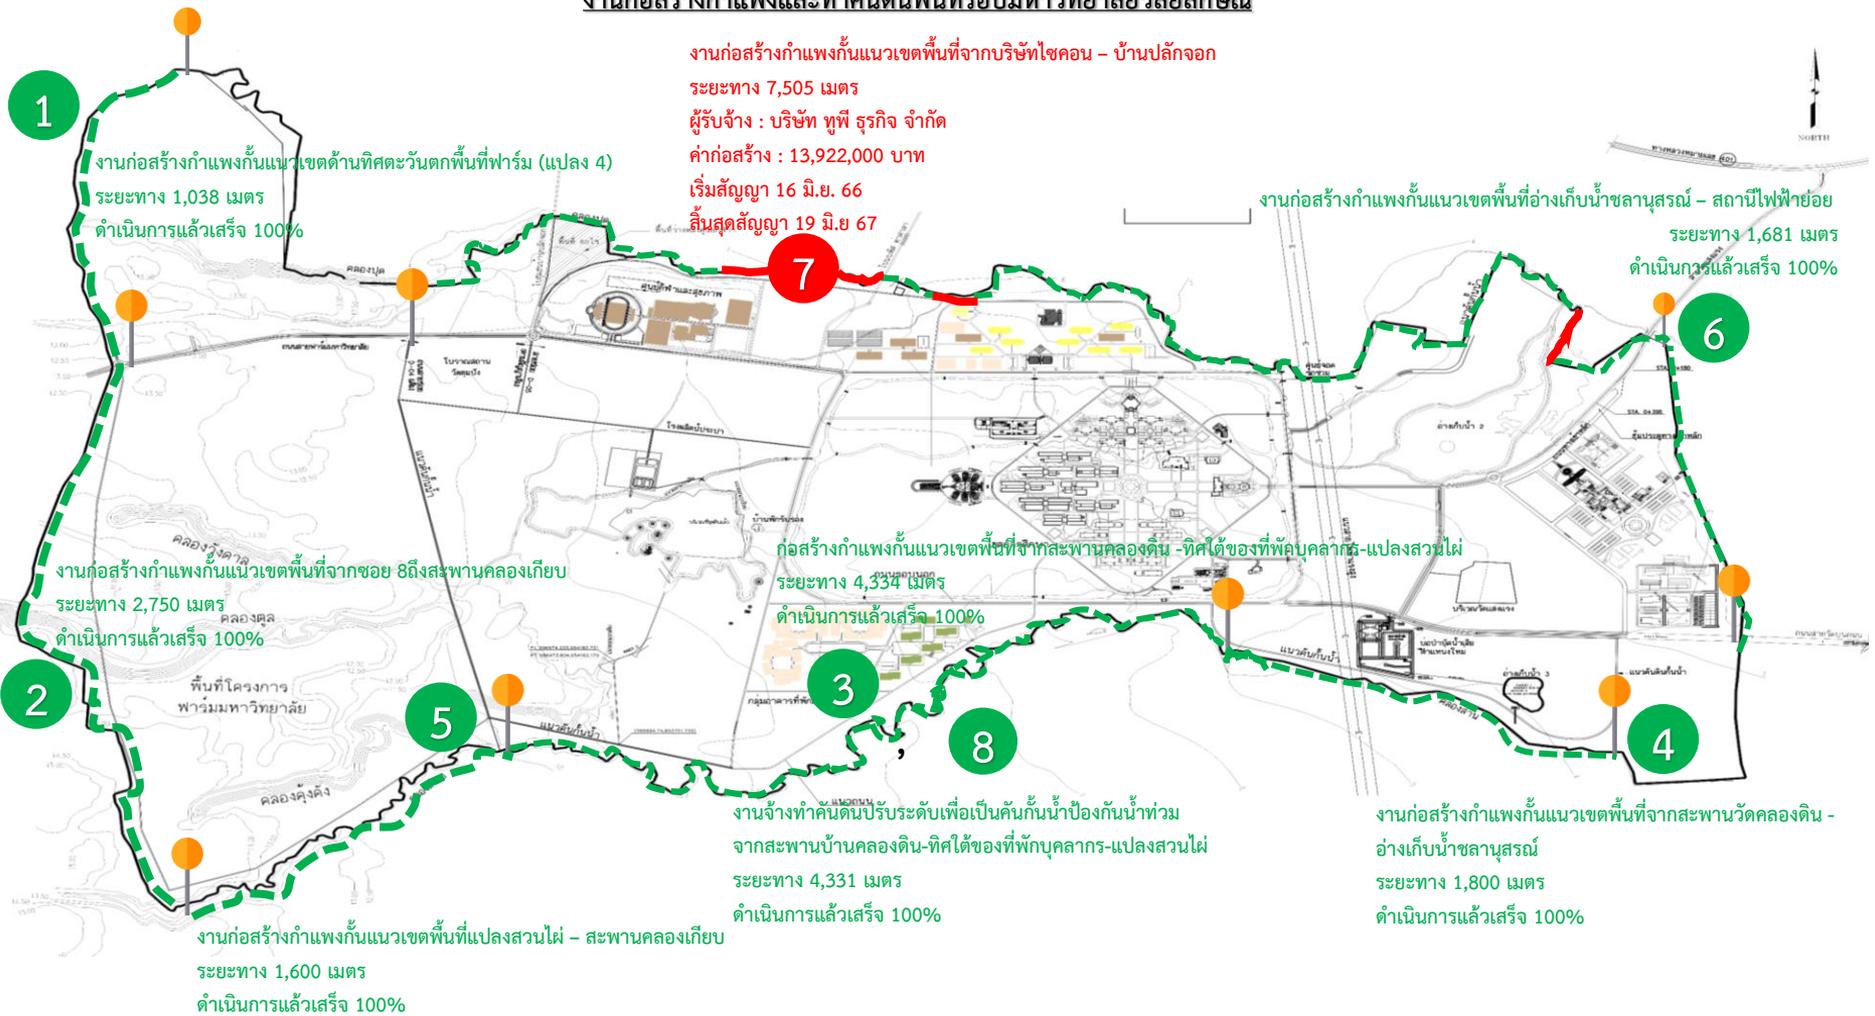

1

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตด้านทิศตะวันตกพื้นที่ฟาร์ม (แปลง 4)  
ระยะทาง 1,038 เมตร  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

2

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากซอย 8 ถึงสะพานคลองเกียบ  
ระยะทาง 2,750 เมตร  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

5

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่แปลงสวนไม้ - สะพานคลองเกียบ  
ระยะทาง 1,600 เมตร  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

7

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก  
ระยะทาง 7,505 เมตร  
ผู้รับจ้าง : บริษัท ทูพี ธุรกิจ จำกัด  
ค่าก่อสร้าง : 13,922,000 บาท  
เริ่มสัญญา 16 มิ.ย. 66  
สิ้นสุดสัญญา 19 มิ.ย 67

3

ก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานคลองดิน - ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไม้  
ระยะทาง 4,334 เมตร  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

8

งานจ้างทำคันดินปรับระดับเพื่อเป็นคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วม  
จากสะพานบ้านคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไม้  
ระยะทาง 4,331 เมตร  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

6

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำขานุสรณ์ - สถานีไฟฟ้าย่อย  
ระยะทาง 1,681 เมตร  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

4

งานก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัดคลองดิน - อ่างเก็บน้ำขานุสรณ์  
ระยะทาง 1,800 เมตร  
ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

7

## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก

ผู้รับจ้าง : บริษัท ทูพี ธุรกิจ จำกัด


ค่าก่อสร้าง : 13,878,000 บาท (7.56 กม.)

เริ่มสัญญา 16 มิ.ย. 66

สิ้นสุดสัญญา 19 มิ.ย 67

ระยะเวลาก่อสร้าง 368 วัน

ความก้าวหน้างาน 95.00%

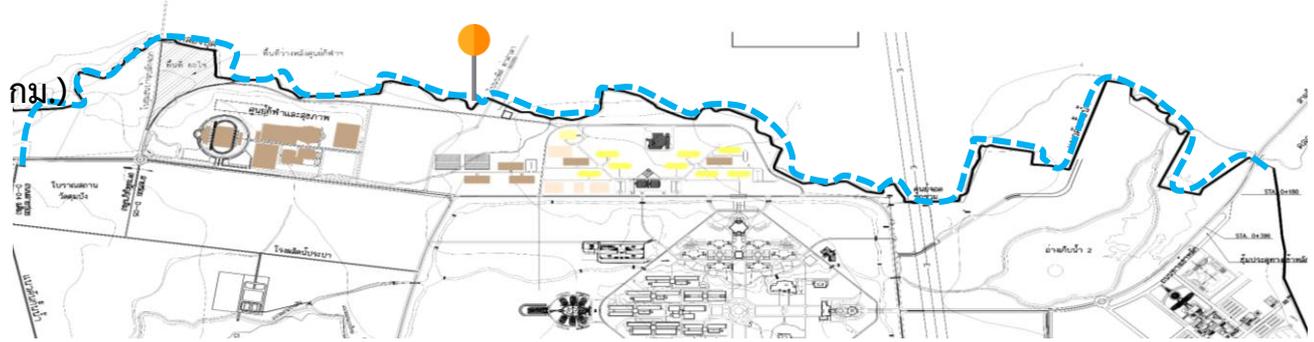

## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก (ต่อ)

1). รั้วช่วงหลังงานดินถมสนามเบตมินตัน-สะพานโคกเหล็ก

อยู่ระหว่างเก็บตกช่วงรั้วที่เว้นไว้บนแนววางท่อระบายน้ำ 3 จุด ระยะทางประมาณ 20 เมตร













## โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน – บ้านปลักจอก (ต่อ)

2. งานรั้วช่วงหลังพื้นที่แปลง SICON

อยู่ระหว่างก่อสร้างแนวรั้วด้านตะวันตก ระยะทางประมาณ 200 เมตร (ช่วงสุดท้าย) คาดว่าจะแล้วเสร็จ กลางเดือน พฤษภาคม นี้















**THANK YOU**
