




# รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง รวม 8 โครงการ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

1

# โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ผู้รับจ้าง	บริษัท นิธิรัฐกร เอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขที่สัญญา	019/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 65
วงเงินก่อสร้าง	69,917,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	2 ธ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 67 (577 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	547 วัน (94.80%)
เหลือระยะเวลา	30 วัน (5.20%)
ความก้าวหน้างาน	99.78%
งวดงาน	9/10 งวด ( อยู่ระหว่างกระบวนการส่งงานงวดสุดท้าย )
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	8 คน

# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( สถานีสูบน้ำดิบ )



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ระบบการผลิตน้ำประปา )



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( สถานีโรงผลิต )



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( สถานีโรงผลิต )





# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( สถานีโรงผลิต )




# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( สถานีโรงผลิต )



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( สถานีโรงผลิต )

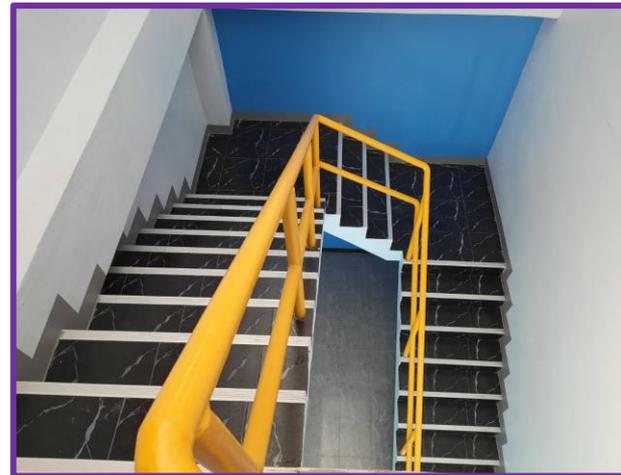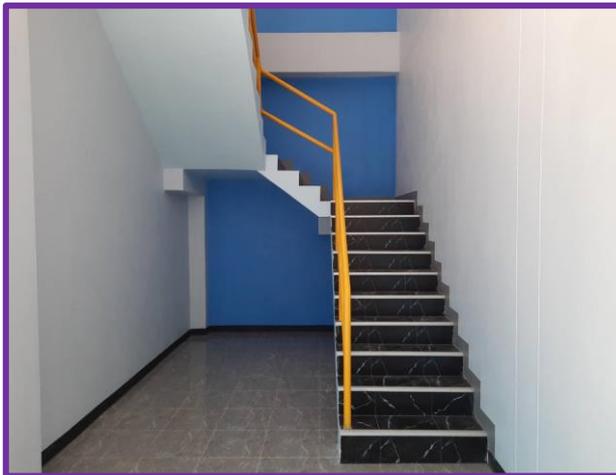

# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( สถานีโรงผลิต )

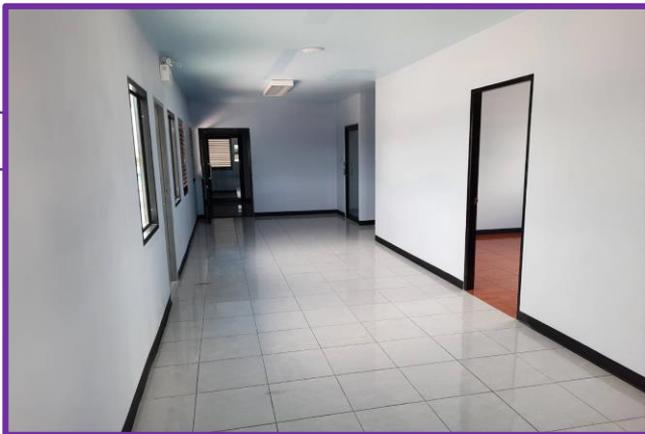

1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
(กระบวนการหาความเข้มข้นของสารเคมีในการผสมเพื่อผลิตน้ำประปา )



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( งานภายนอก )



## งานภายนอก

- งานก่อสร้างกำแพง
- ระบระบายน้ำฝน
- งานก่อสร้างถนน ลานจอดรถ และทางเดิน
- งานก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ
- งานก่อสร้างป้องกันตะกอน
- งานปรับระดับดินภายนอกแล้วเสร็จทั้งหมด

งานงวดที่ 10 อยู่ระหว่าง  
กระบวนการส่งมอบงาน

# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศกพ. ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 9



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศกพ. ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 9



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศกพ. อธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศกพ. อธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ



# 1. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ศกพ. อธิการบดีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ



## 2

### โครงการปรับปรุงอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่สัญญา	140/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ. 66
วงเงินก่อสร้าง	81,100,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 ก.พ. 66 – 30 ก.ย. 67 (593วัน) (แนบท้ายครั้งที่6)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	470 วัน (79.26%)
เหลือระยะเวลา	123 วัน (20.74%)
ความก้าวหน้างาน	79.03 %
งวดงาน	8/11 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	45 คน

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์




## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

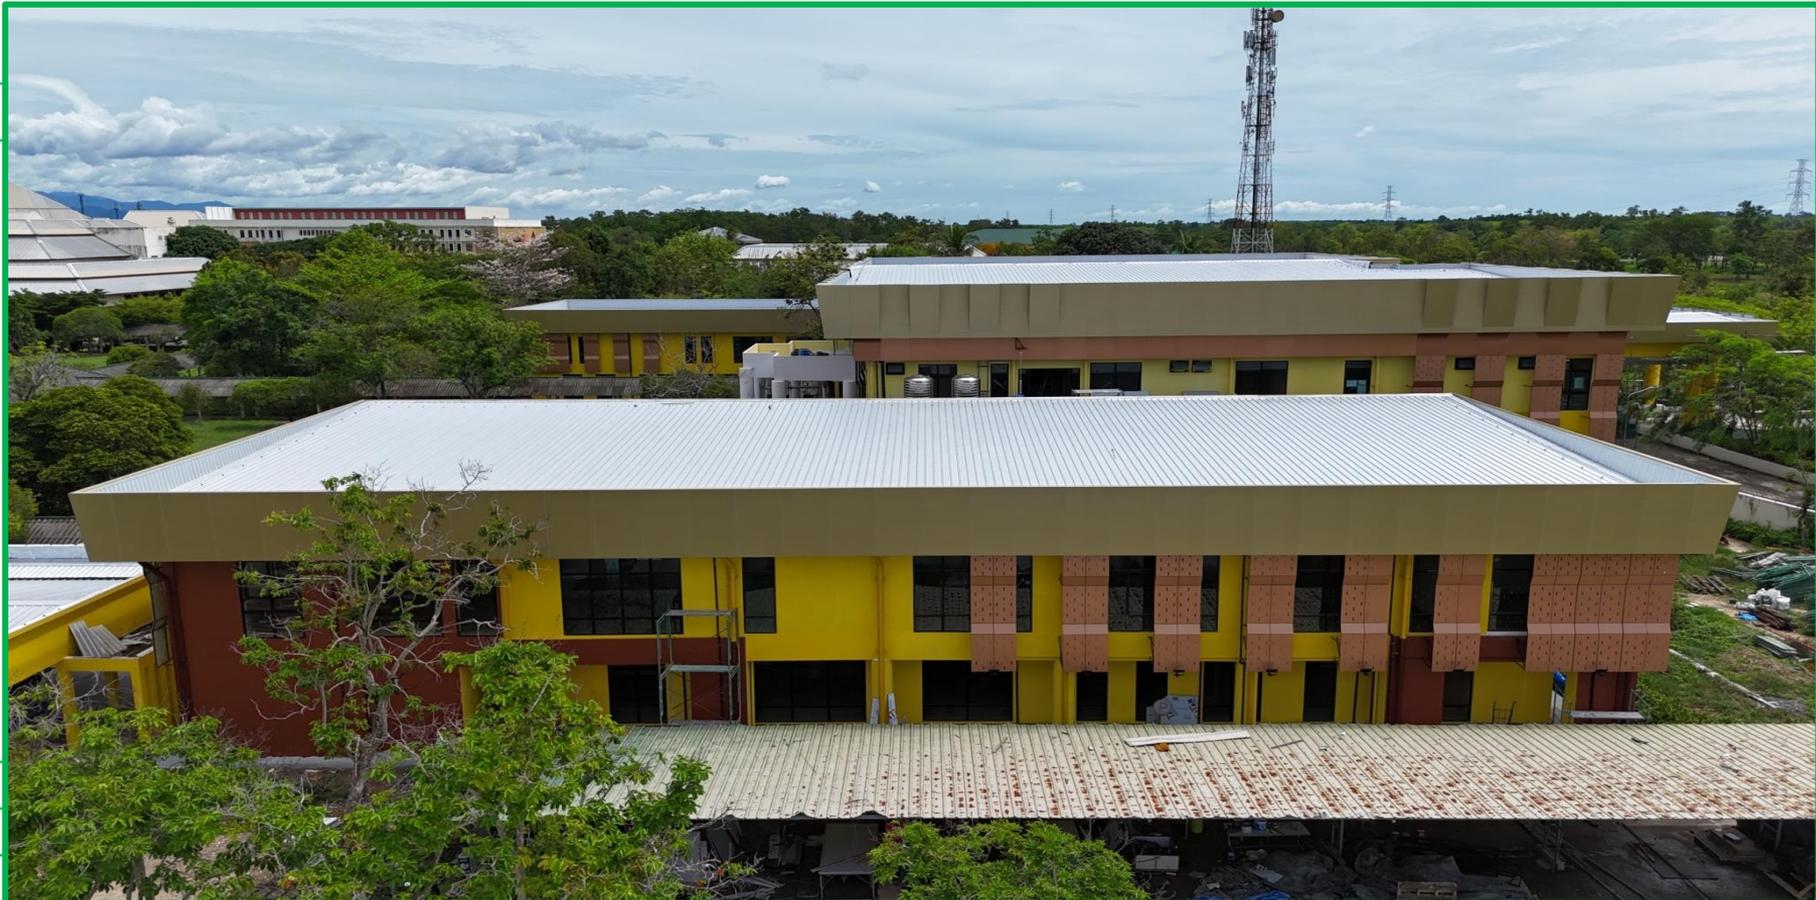

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชั้นที่ 1 )



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 1

1. งานสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ 98 %
2. งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ แล้วเสร็จ 98 %
3. อยู่ระหว่างการแก้ไขงาน DEFECT WORK

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชั้นที่ 1 )



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชั้นที่ 1 )




## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชั้นที่ 2 )



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 2

1. งานสถาปัตยกรรมภายใน แล้วเสร็จ 95 % และกำลังดำเนินการปูหินแกรนิตพื้นโถงทางเข้าหน้าลิฟท์
2. งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ แล้วเสร็จ 98 %
3. อยู่ระหว่างการแก้ไขงาน DEFECT WORK

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชั้นที่ 2 )

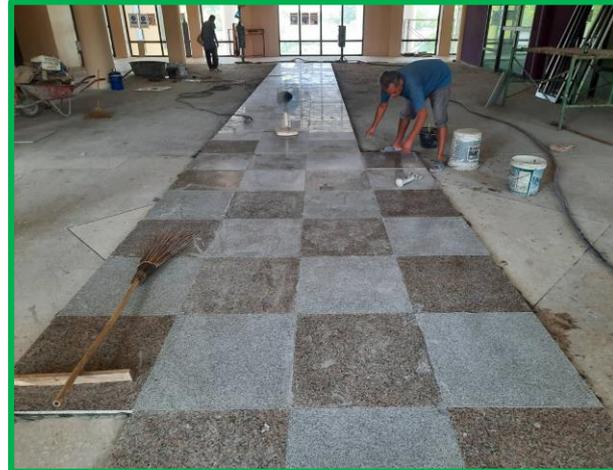

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชั้นที่ 2 )



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชั้นที่ 3 )




### ความก้าวหน้างาน ชั้น 3

1. งานผนัง+งานประตู-หน้าต่าง+ฝ้าเพดาน+ทาสี แล้วเสร็จ 95 %
2. งานปูกระเบื้องยางลายไม้ แล้วเสร็จ 70 %
4. งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ แล้วเสร็จ 95 %
5. งาน ID ห้องอธิการบดี ห้องนายกสภา ห้องรับรอง ห้องประชุม 60 ที่นั่ง จะเริ่มดำเนินการปลายเดือน มิ.ย. นี้

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชั้นที่ 3 )



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ชั้นที่ 3 )

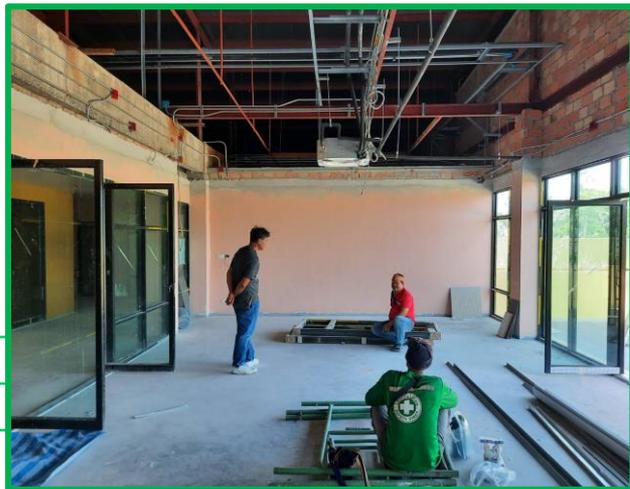

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### งานภายนอก

1. งานทาสีอาคาร+ ติดตั้งคอมโพสิต  
แล้วเสร็จ 95 %
2. งานที่กำลังดำเนินการ
  - เป็นงานก่อสร้างระบายน้ำฝน
  - งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  
ภายนอก
  - งานปูกระเบื้องคอนกรีตทางลาดชั้น  
ชั้น 2

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์






อาคารนิติการ ( เดิม )

- งานปรับปรุงอาคารภาพรวม แล้วเสร็จ 98 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลานเสาธง หน้าอาคาร

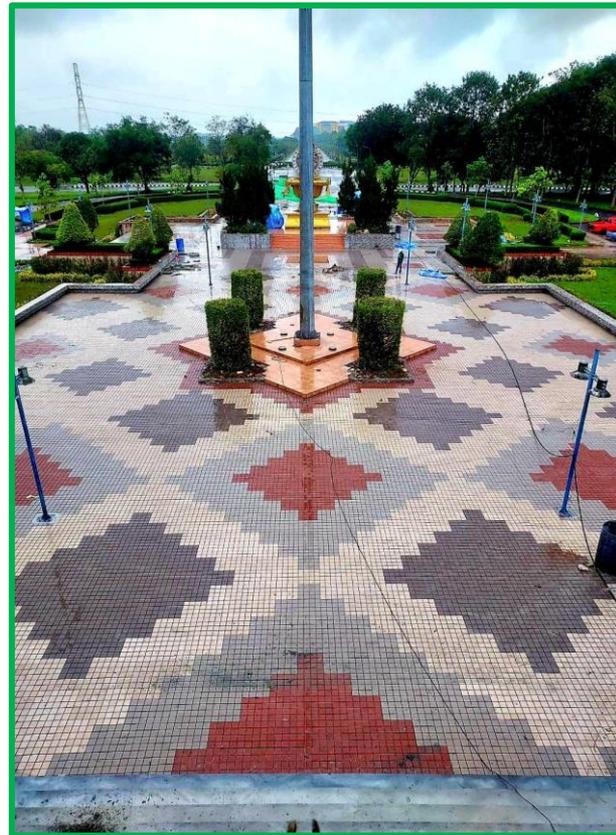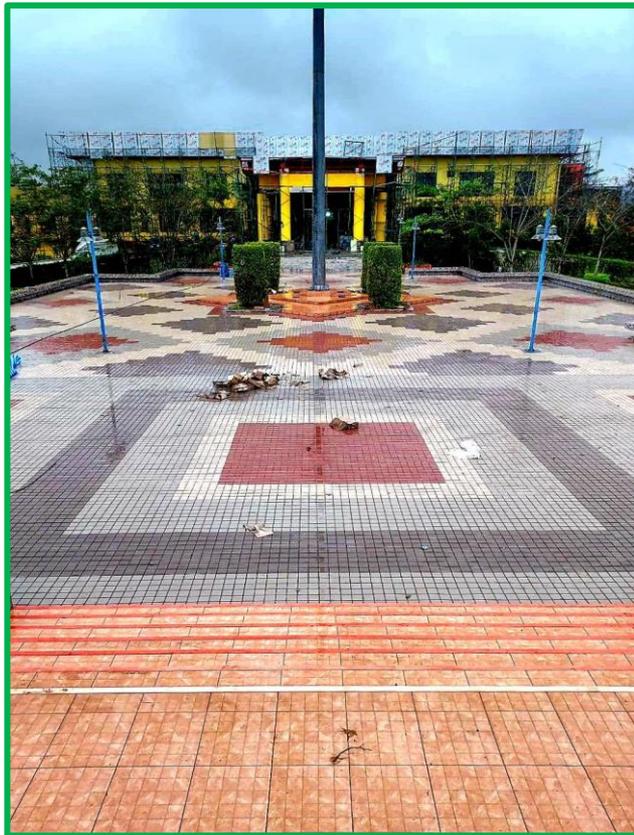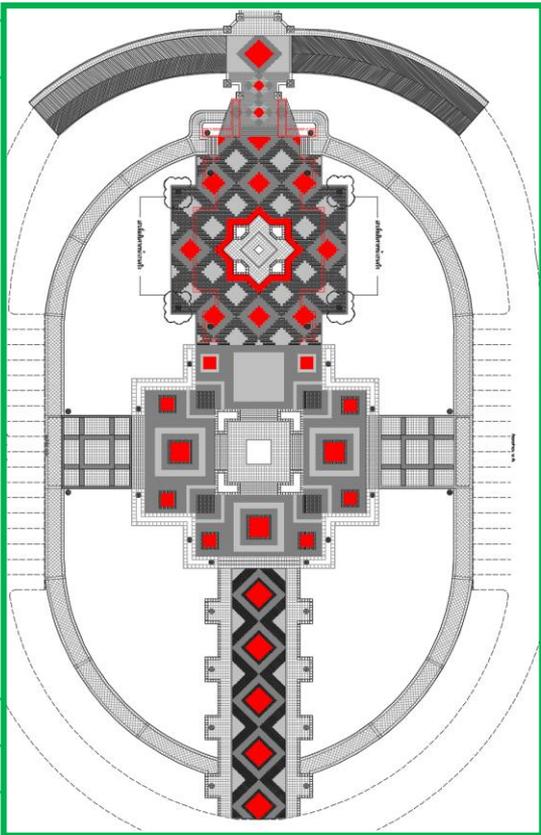

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ลานเสารง หน้าอาคาร


1. งานปูกระเบื้องเคนไซด์  
แล้วเสร็จ 98 %
2. งานปูกระเบื้องเซรามิค  
แล้วเสร็จ 98 %

## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์





## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

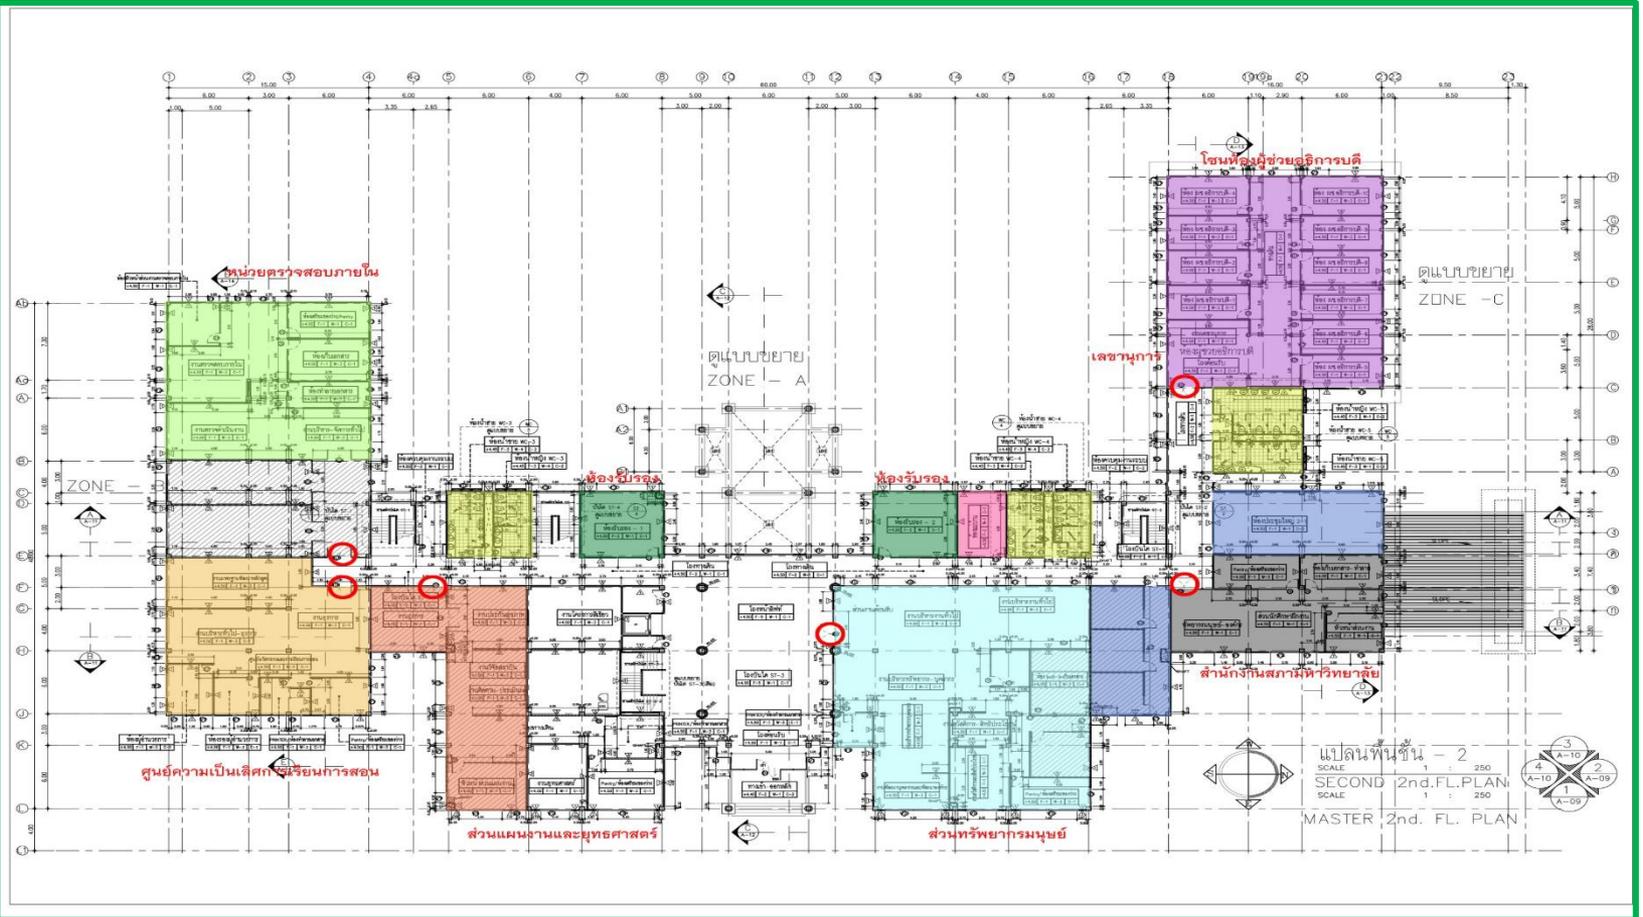



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



## 2. โครงการปรับปรุงอาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมประจำเดือนติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง




## 3

# โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
เลขที่สัญญา	204/2566 ลงวันที่ 12 เม.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	38,119,908.99บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	13 เม.ย. 66 – 30 ก.ค. 67 (475วัน) (แนบท้ายครั้งที่3)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	415 วัน (87.37%)
เหลือระยะเวลา	60 วัน (12.63%)
ความก้าวหน้างาน	78.36%
งวดงาน	6/9 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	25 คน

### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

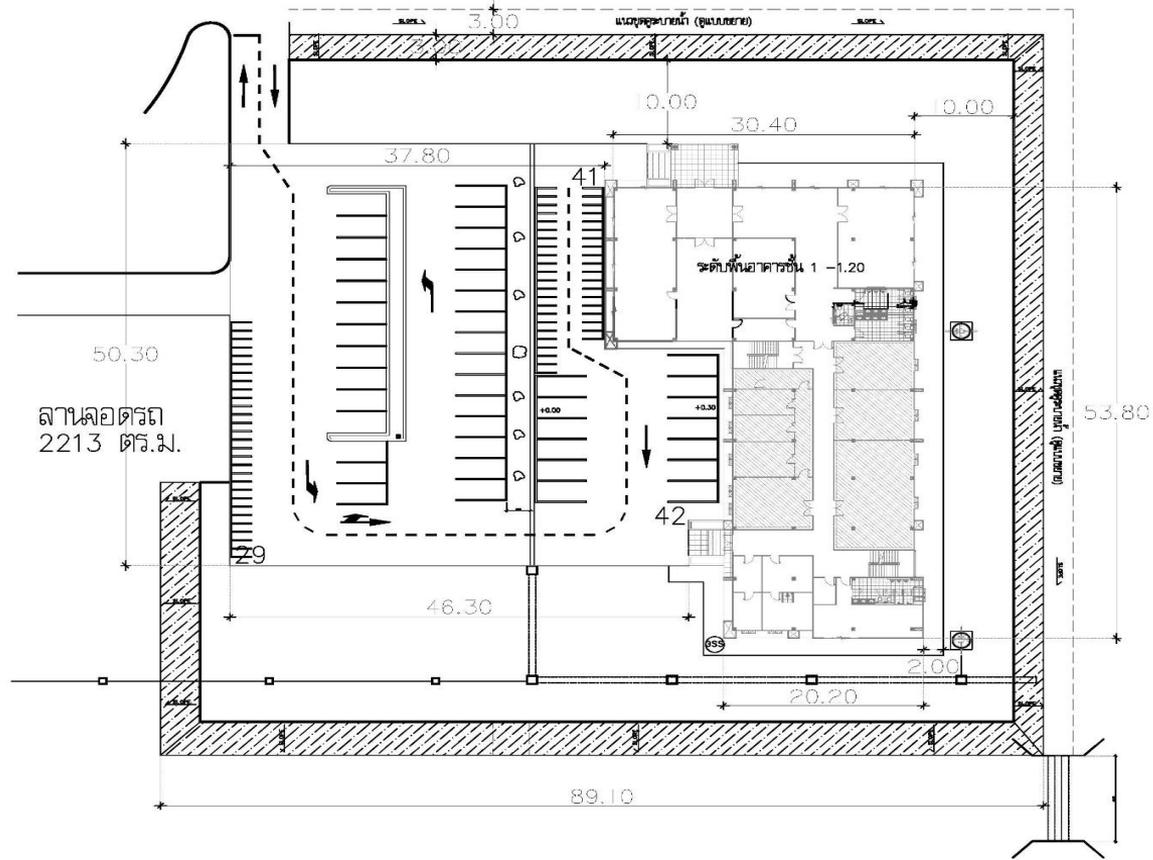

### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 1



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 1



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 2



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องน้ำ ชั้น 1-2



#### ความก้าวหน้างานอาคาร

1. งานผนัง+พื้น+ฝ้าเพดานงาน+ติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม +ทาสี+ห้องน้ำ แล้วเสร็จ 95 %
2. งานประตูไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตและติดตั้ง
3. งานระบบไฟฟ้า+สุขาภิบาล+ปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90 %
4. งานระบบสื่อสาร ได้สั่งซื้อวัสดุ รอส่งเข้าหน่วยงานเพื่อติดตั้งต่อไป
5. ส่วนครุภัณฑ์สำนักงานจัดส่งเข้าหน้างาน 50 %
6. อยู่ระหว่างการแก้ไขงาน DEFECT WORK

### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานภายนอก



1. งานเทคอนกรีตถนนและลานจอด แล้วเสร็จ 95 %
2. งานต่อเม่นแรงสูงเข้าอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
3. งานถมดินปรับระดับภายนอก แล้วเสร็จ 75 %

หมายเหตุ งานงวดที่ 7 จะส่งมอบต้นเดือน ก.ค. 67

### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า ตรวจสอบจ้างงาน งวดที่ 6




### 3. โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า ตรวจสอบการจ้างงาน งวดที่ 6



## 4


## โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



ผู้รับจ้าง	บริษัท ชุมพร คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่สัญญา	219/2566 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	27,810,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 มิ.ย. 66 – 9 ก.ค. 67 (390วัน) (แนบท้ายครั้งที่4)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	351 วัน (90.00%)
เหลือระยะเวลา	39 วัน (10.00%)
ความก้าวหน้างาน	93.70 %
งวดงาน	6/7 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	18 คน



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

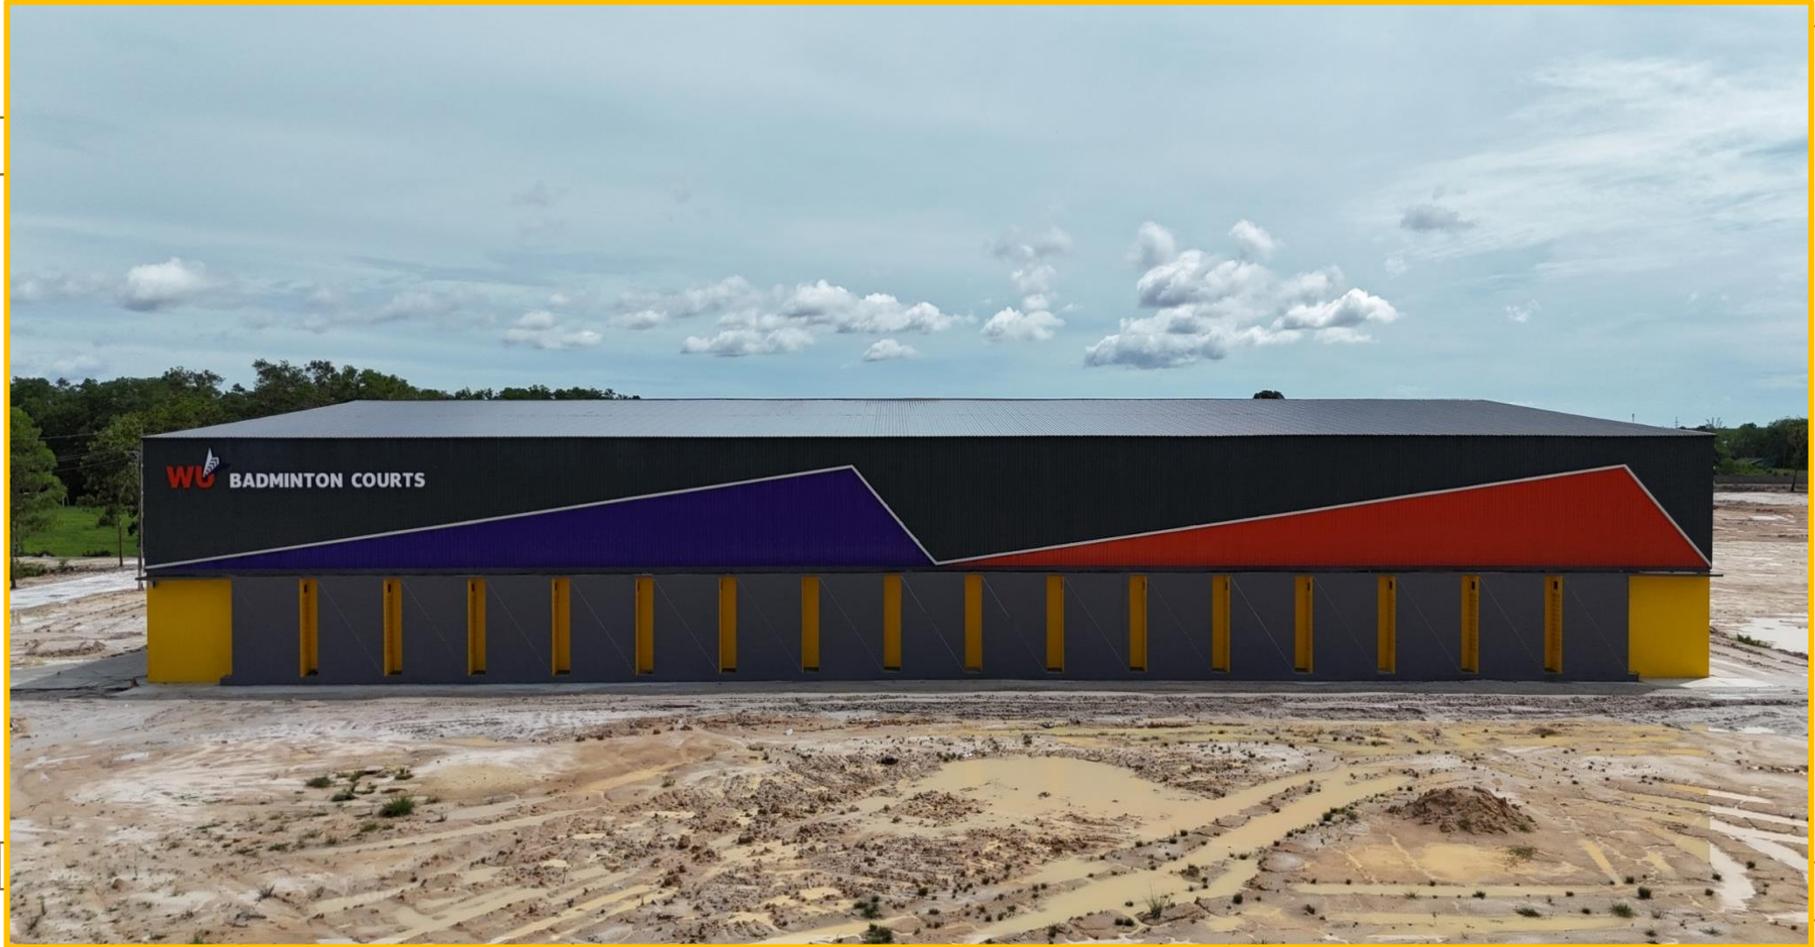

#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)




#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1



## 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 2

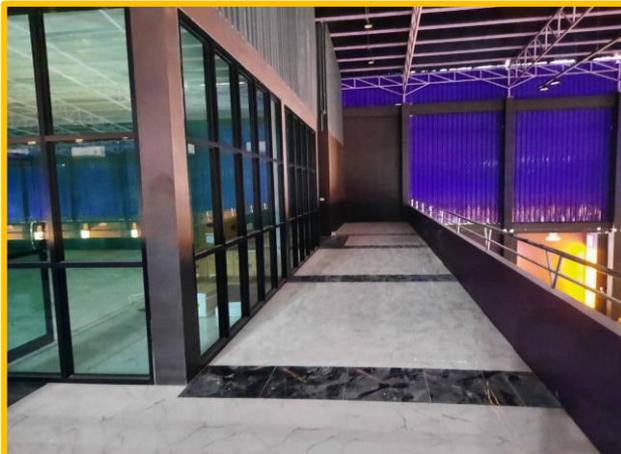

## 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

งานห้องน้ำ



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1 โถงสนามแบด ฟัง 8 คอร์ต



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1 โถงสนามแบด ฟัง 8 คอร์ต



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1 โถงสนามแบด ผัง 8 คอร์ต



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1 โถงสนามแบด ฟัง 4 คอร์ต



#### 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1 โถงสนามแบด ผัง 4 คอร์ต



## 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)

ชั้น 1 โถงสนามแบด ฟัง 4 คอร์ต



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

อาคาร

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- การแก้ไขงาน defect work

## 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามเบดมินตัน)



### งานภายนอกอาคาร

1. งานเทคอนกรีตถนน ลานจอดรถ และพื้นทางเดินรอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด และจะตีเส้นจราจรต่อไป
2. งานปรับเคลียร์ดินภายนอกอาคารอยู่ระหว่างดำเนินการ

## 4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)



งานภายนอกอาคาร

3. งานเดินเมนไฟฟ้าแรงสูงแล้ว  
เสร็จ และแรงต่ำเข้าตัวอาคาร  
แล้วเสร็จทั้งหมด

งานงวดที่ 7 งานงวดสุดท้าย  
ส่งต้นเดือน ก.ค. 67




#### 4. โครงการก่อสร้างสนามเบดมินตัน ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



#### 4. โครงการก่อสร้างสนามแบดมินตัน ตรวจการจ้าง งานงวดที่ 5



#### 4. โครงการก่อสร้างสนามแบดมินตัน ตรวจการจ้าง งานงวดที่ 6

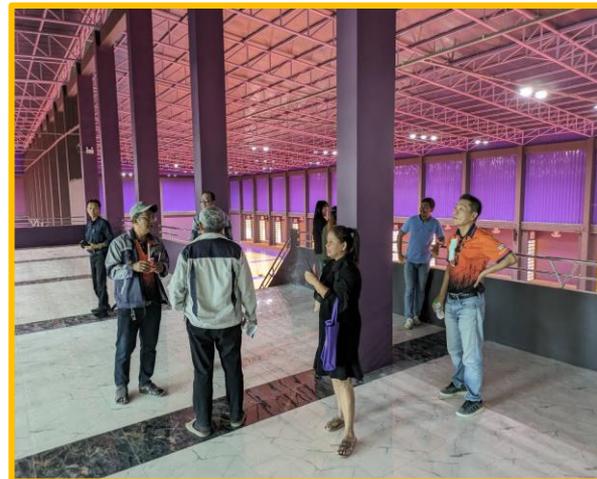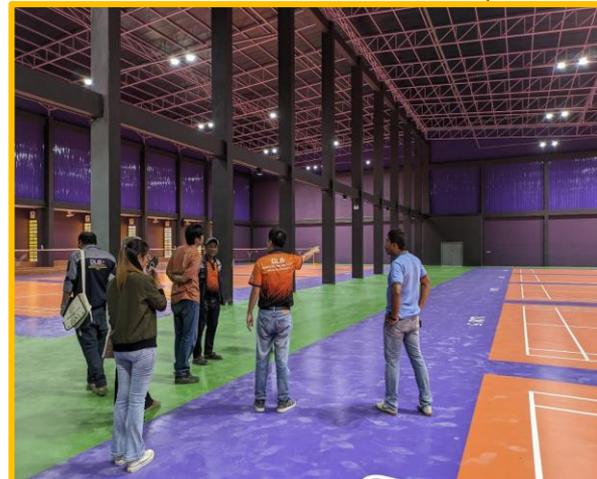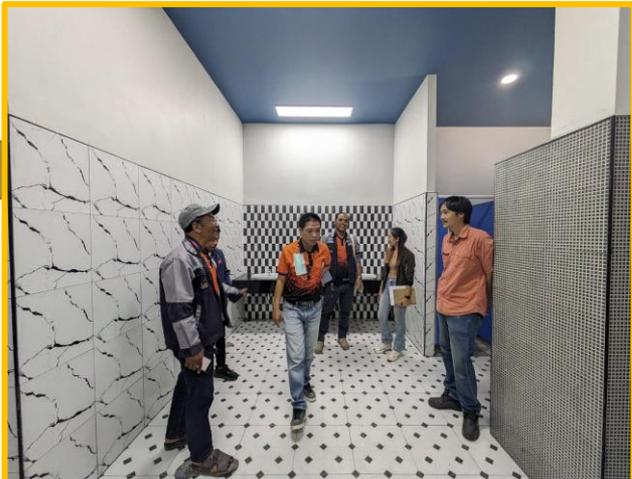

## 5

# โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารเทพการโยธา
เลขที่สัญญา	240/2566 ลงวันที่ 15 ส.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	20,400,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	16 ส.ค. 66 – 8 ส.ค. 67 (358 วัน) (แนบท้ายครั้งที่2)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	289 วัน (80.72%)
เหลือระยะเวลา	69 วัน (19.28%)
ความก้าวหน้างาน	47.08%
งวดงาน	5/14 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	15 คน

5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



## 5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



### ความก้าวหน้างานอาคาร

1. งานโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ 98 %
2. งานประกอบติดตั้งโครงเหล็กรับหลังคา+มุงหลังคา แล้วเสร็จ 98 %
3. งานผนังก่ออิฐ +ฉาบปูน แล้วเสร็จ 95 %
4. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 40 %
5. งานเดินท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 90 %

## 5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)

ชั้น1



## 5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)

ชั้น 2



## 5. โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างอาคาร)



### ความก้าวหน้างานลานพลาซ่า

1. เทคอนกรีตพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายแล้วเสร็จ 90 %
2. งานก่ออิฐ+ฉาบรองพื้นเตรียมผิว แล้วเสร็จ 95 %
3. งานติดตั้งกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ 30 %

งานงวดที่ 6 ผู้รับจ้างจะส่งงานต้นเดือน ก.ค. 67

5. โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



# 5. โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 5



# 5. โครงการก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตรวจสอบการใช้งาน งวดที่ 5



## 6

## โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออก ของสนามกีฬาากลางตุมปัง

ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โยธากิจ (2000)
เลขที่สัญญา	270/2566 ลงวันที่ 6 พ.ย. 66
วงเงินก่อสร้าง	2,940,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	7 พ.ย. 66 – 13 ก.ค. 67 (250 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	207 วัน (82.80%)
เหลือระยะเวลา	43 วัน (17.20%)
ความก้าวหน้างาน	90.00 %
งวดงาน	2/3 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	5 คน
จำนวนเครื่องจักร	รถแมคโคร 2 คัน ,รถสิบล้อ 3 คัน ,รถไถ 1 คัน



## 6. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง



## 6. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุ้มปัง



### ความก้าวหน้างาน

- งานปรับเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ 98 %
- งานถมดิน 95 %
- งานปรับระดับพื้นที่จะดำเนินการต่อไป

## 6. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง



## 6. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬากลางตุมปัง



- งานแต่งแนวคูทางระบายน้ำ  
แล้วเสร็จ 70 %


งานงวดที่ 3 ส่งงานปลายเดือน  
มิ.ย. 67

## 6. โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุ้มปั้ง อธิการบดีติดตามความก้าวหน้า



## 7

## โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



ผู้รับจ้าง	บริษัท เอกธনীช เพ็ญท์ จำกัด
เลขที่สัญญา	023/2566 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 65
วงเงินก่อสร้าง	21,850,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	1 ก.พ. 67 - 27 ก.ย. 67 (240 วัน) (แนบท้ายครั้งที่ 1)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	86 วัน (35.83%)
เหลือระยะเวลา	154 วัน (64.17%)
ความก้าวหน้างาน	25.00 %
งวดงาน	2/8 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	25 คน

## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



### ความก้าวหน้างาน

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน METAL SHEET ชายคาภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 98 %

## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



ความก้าวหน้างาน

- งานปูกระเบื้องพื้น ผังห้องน้ำ  
ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จ 10 ห้อง

## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 ( ชั้น 1 )



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 1

1. งานติดตั้งผนังห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ 80 %
2. งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 70 %
3. งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า+สื่อสาร แล้วเสร็จ 80 %
4. งานเทคอนกรีตพื้นคอร์ทกลาง ชั้น 1 แล้วเสร็จ


## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 ( ชั้น2 )



### ความก้าวหน้างาน ชั้น 2

1. งานติดตั้งผนังห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ 85 %
2. งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 85 %
3. งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า+สื่อสาร แล้วเสร็จ 85 %
4. งานติดตั้งคอมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 15 %

## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



### ความก้าวหน้างาน ส่วนต่อเติม ดำเนินการ 1 ด้าน


1. งานโครงสร้างอาคาร+โครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ 100 %
2. งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
3. งานติดตั้ง SIDING + รางน้ำ แล้วเสร็จ 80 %
4. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 95 %
5. งานฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ 70 %

## 7. โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 1 และ 2



## 8

## โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ผู้รับจ้าง	บริษัท เหล็กตราง จำกัด
เลขที่สัญญา	217/2566 ลงวันที่ 22 พ.ค. 66
วงเงินก่อสร้าง	127,176,737.86 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	23 พ.ค. 66 – 6 ก.พ. 68 (626 วัน)
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว	374 วัน (59.74%)
เหลือระยะเวลา	252 วัน (40.26%)
ความก้าวหน้างาน	32.10 %
งวดงาน	6/18 งวด
จำนวนแรงงานเฉลี่ย	110 คน

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ความก้าวหน้างาน

งานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้าง ชั้นที่ 1-3 แล้วเสร็จ 100 %
2. เทคอนกรีตคาน ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 70 %
3. เทคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 45 %
4. งานเทคอนกรีตเสารับคานหลังคา แล้วเสร็จ 35 %

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



### ความก้าวหน้างาน

#### งานสถาปัตยกรรม+งานระบบ ชั้น 1

1. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 95 %
2. งานฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ 10 %
3. งานติดตั้งท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 100 %
4. งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 50 %

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



### ความก้าวหน้างาน

#### งานสถาปัตยกรรม+งานระบบ ชั้น 2

1. งานผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ 85 %
2. งานติดตั้งท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 100 %
3. งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 10 %

#### งานสถาปัตยกรรม+งานระบบ ชั้น 3

1. งานติดตั้งท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 90 %

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C




ความก้าวหน้างาน

งานภายนอกอาคาร

1. งานวางท่อ คสล. และบ่อพักระบายน้ำ แล้วเสร็จ 95 %

งานงวดที่ 7 ผู้รับจ้างจะส่งงาน ปลายเดือน มิ.ย. 67

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

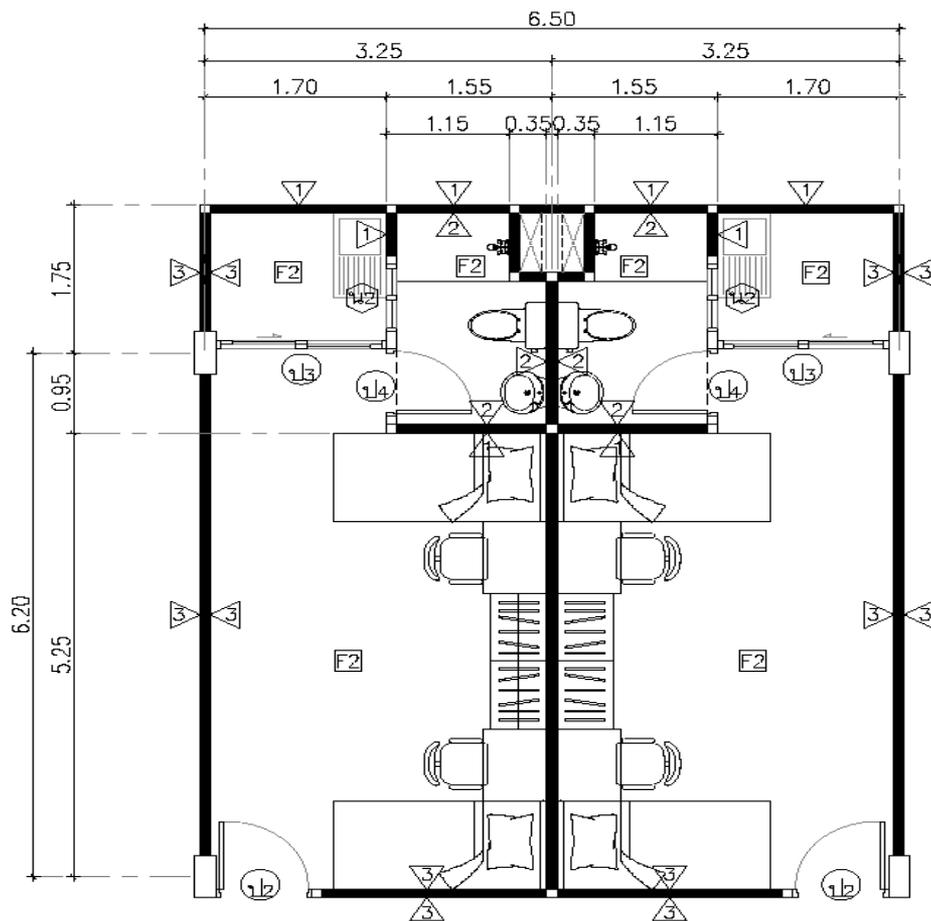

### รายการประกอบแบบ

- F1 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 cm. (ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี) พร้อมบัวยาง 10 cm.
- F2 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 40x40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 1 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- 2 = ผนังท่อน้ำกักกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40x40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 3 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- C1 = งานแต่งแนวท่อน้ำสำเร็จรูป พร้อมทาสี (ชั้น 1-3)
- C3 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานชั้น 4)
- C4 = ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่า T-BAR ขนาด 60x60 cm.เหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1-3)
- C5 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 4)


\*\* หมายเหตุ \*\* -สีทาผนังให้ใช้สีทนสภาวะอากาศ ชนิดกันเงา และมี มอก.  
-ระดับฝ้าเพดานโถงทางเดิน และห้องพักชั้น 4 +3.00 m.

แบบแปลนขยายห้องพัก


มาตรฐาน

1:100

# 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

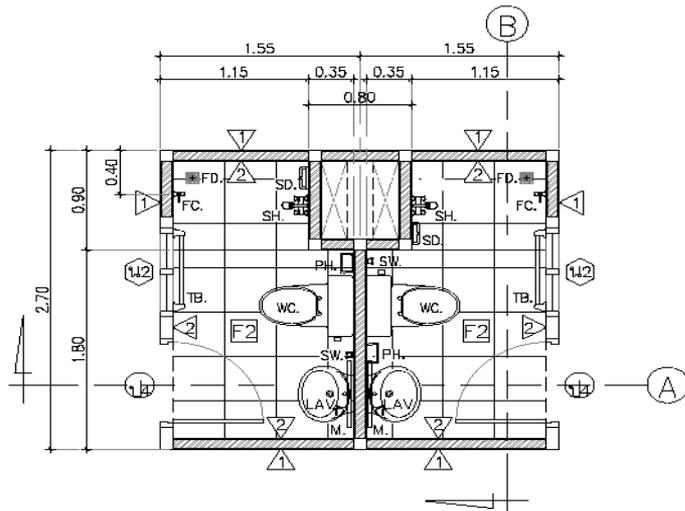

แปลนพื้นที่ห้องน้ำ  
ขนาดพื้นที่ 1:100

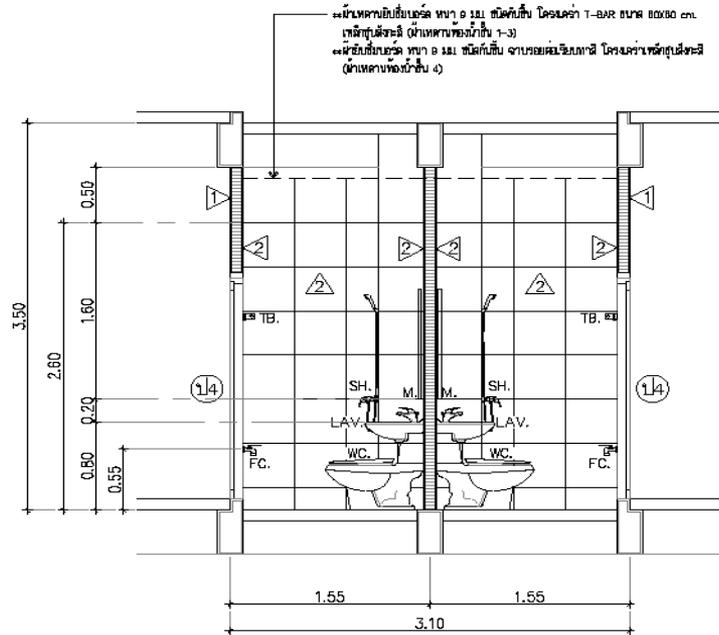


แบบขยายจุดตัด  
ขนาดพื้นที่ 1:100

หน้าผกานับชั้นยี่สิบเอ็ด หน้า 0 มม. ชั้นค้ำขึ้น โครงสร้าง T-BAR ขนาด ๑๐x๖๐ ซม.  
 เบลูทึบสีจริง (น้ำหนักหน้าชั้น 1-3)  
 \*\*หน้าชั้นยี่สิบเอ็ด หน้า 0 มม. ชั้นค้ำขึ้น จากเบรคยี่สิบเอ็ดหน้า โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี  
 (น้ำหนักหน้าชั้น ๔)

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง




## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C ตรวจสอบจ้างงาน งวดที่ 6

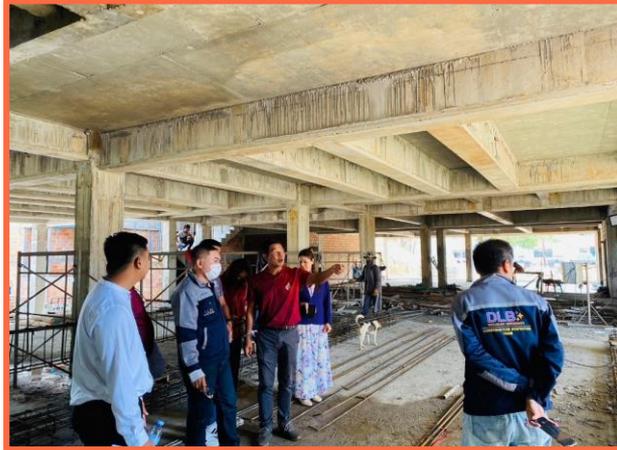

# ความก้าวหน้างานก่อสร้างกำแพง และทำคันดินพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย

# งานก่อสร้างกำแพงและทำคันดินพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

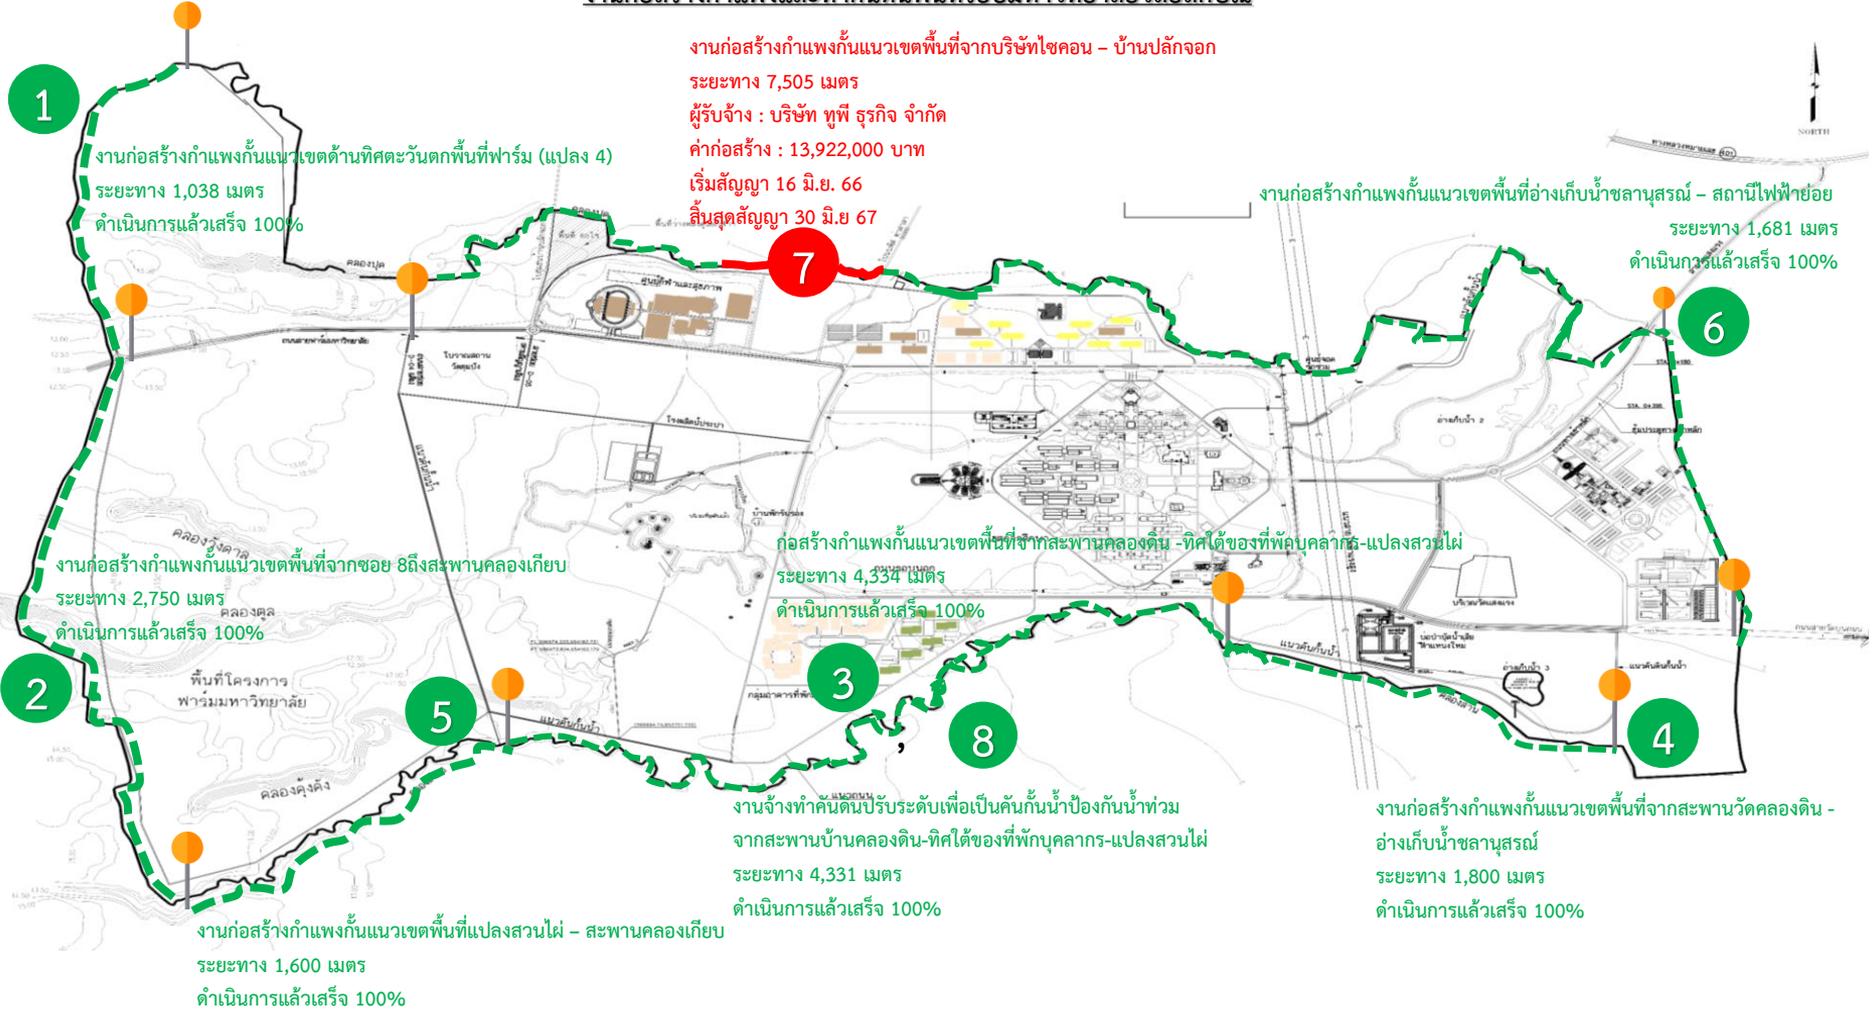



# โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก (ต่อ)



# โครงการก่อสร้างกำแพงกันแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก (ต่อ)



# โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก (ต่อ)



# โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก (ต่อ)



# โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน - บ้านปลักจอก (ต่อ)



# แผนผังแสดงตำแหน่งประตูทางเข้า - ออก

(ปิด 20.00 น.)

ประตูย่อย : ถนนปลักจอก

8

(เปิด 24 ชม.)

ประตูโคกเหล็ก

6

ประตูลัยคม

(เปิด 24 ชม.)

1

5

ประตูซอย 8

(เปิด 24 ชม.)

4

ประตูตลาดศุกรี

(ปิด 20.00 น.)

7

ประตูย่อย : วิทยาลัยนาส

(ปิด 20.00 น.)

3


ประตูคลองดิน

(เปิด 24 ชม.)


2

ประตูอ่างชลานุสรณ์

(เปิด 24 ชม.)

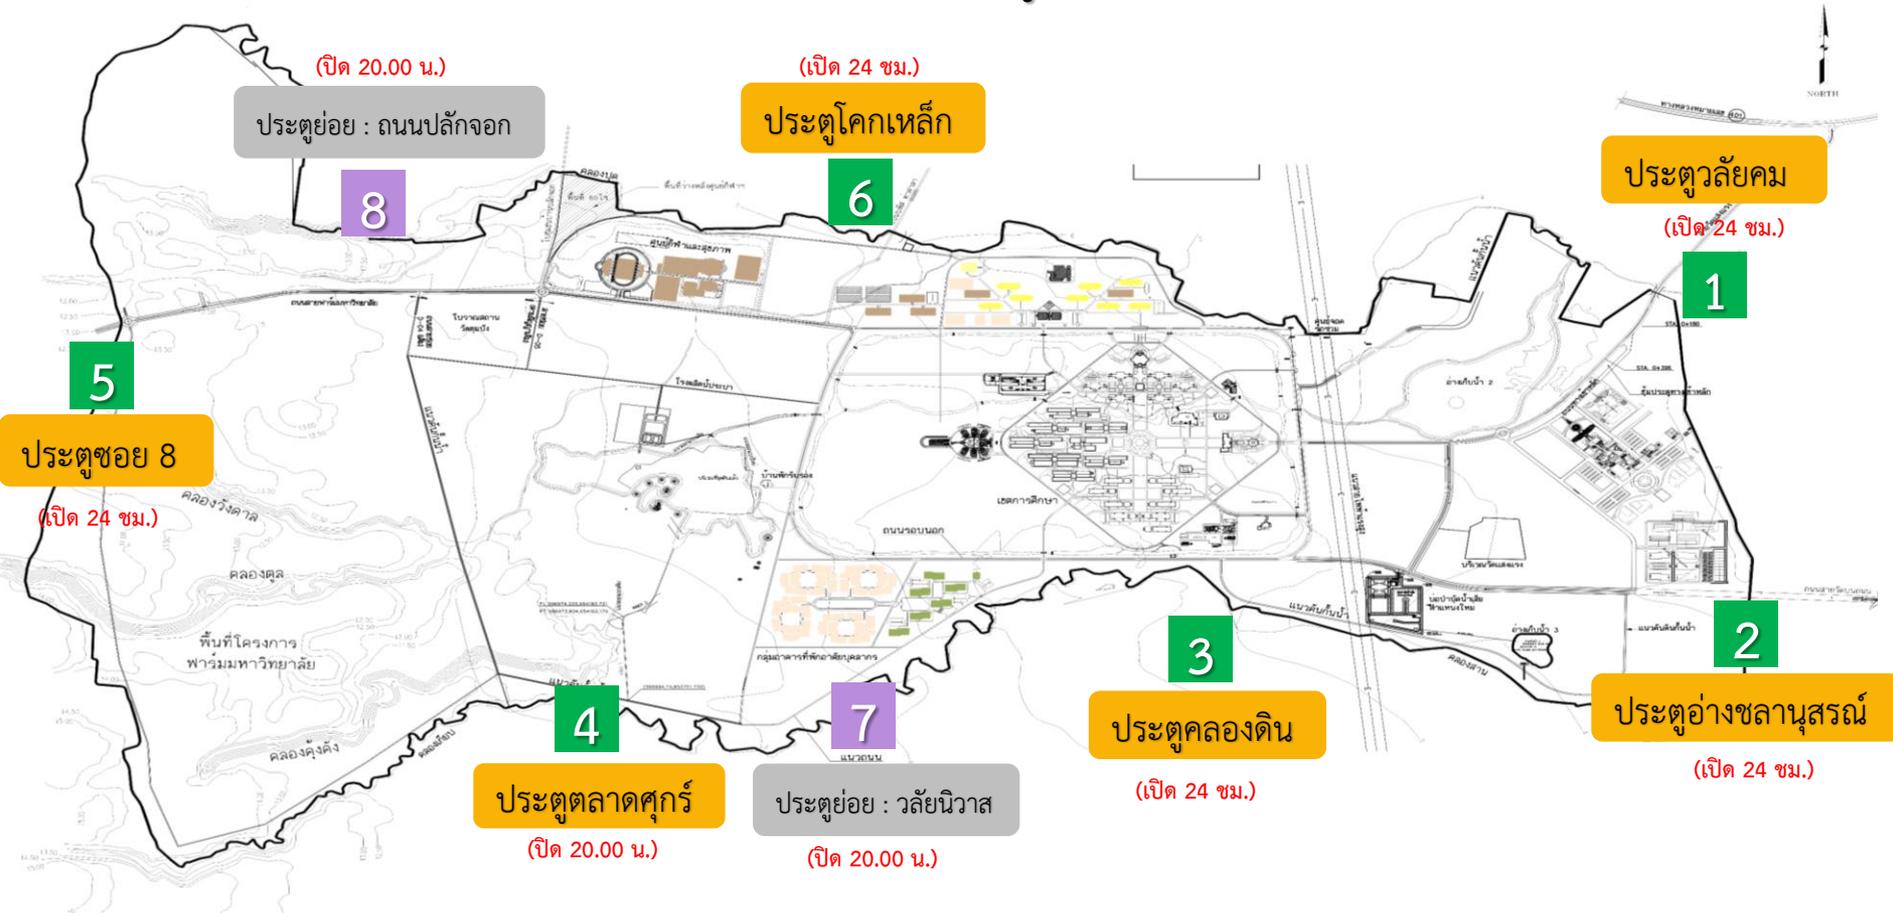



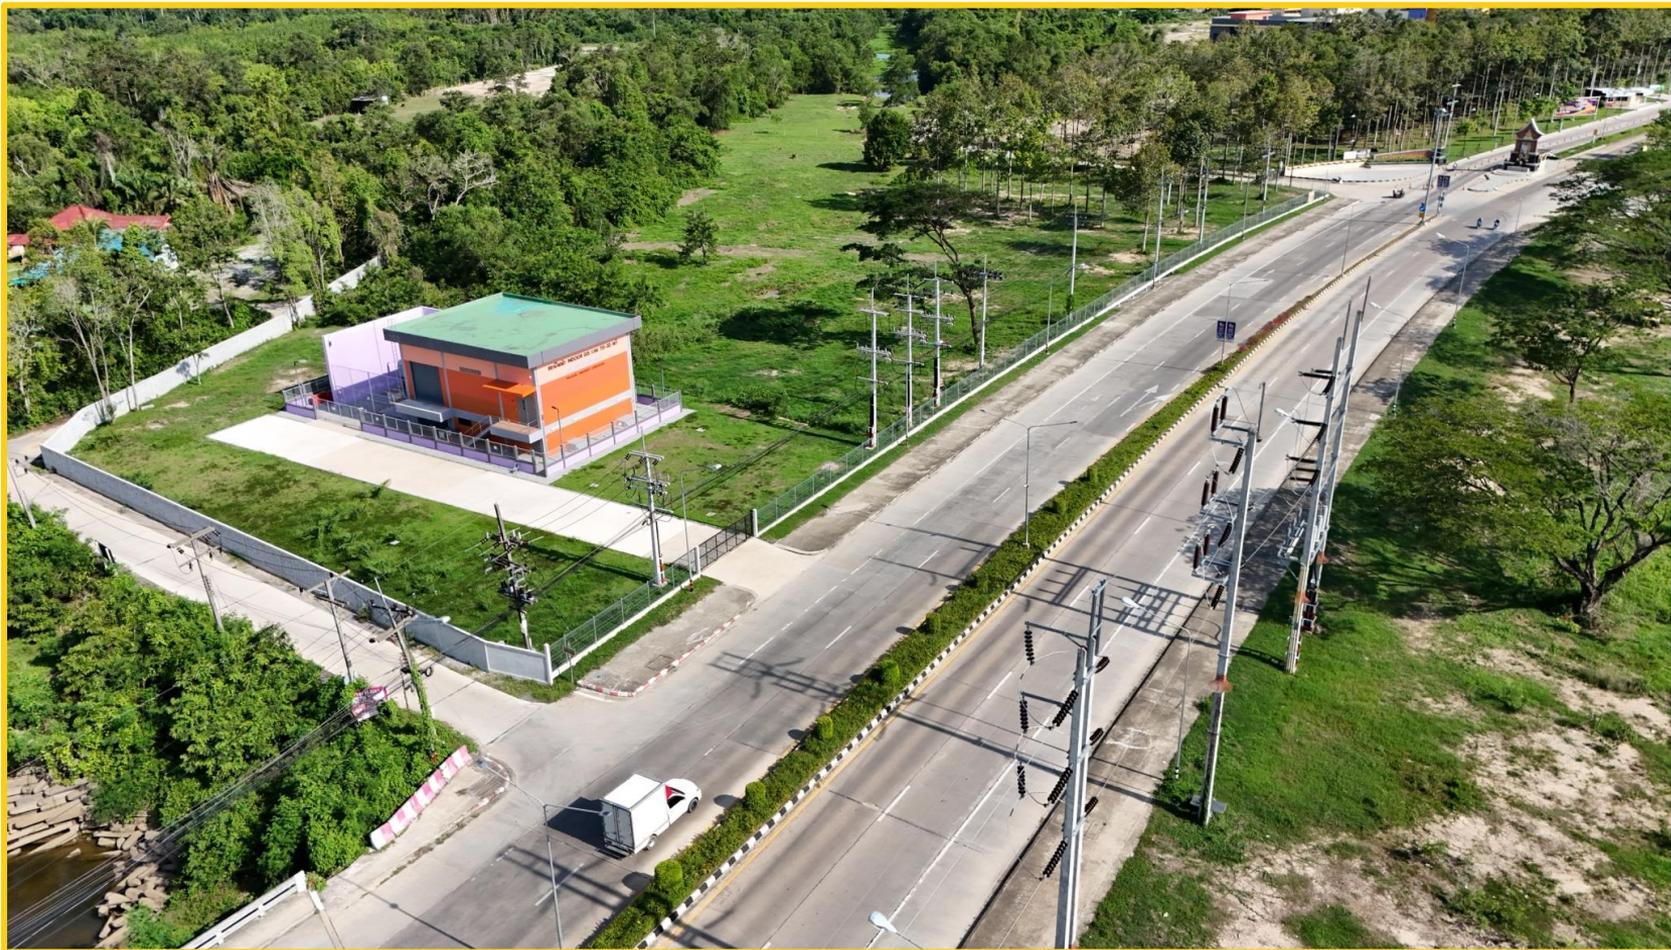

1

# ประตูล້วยคม








































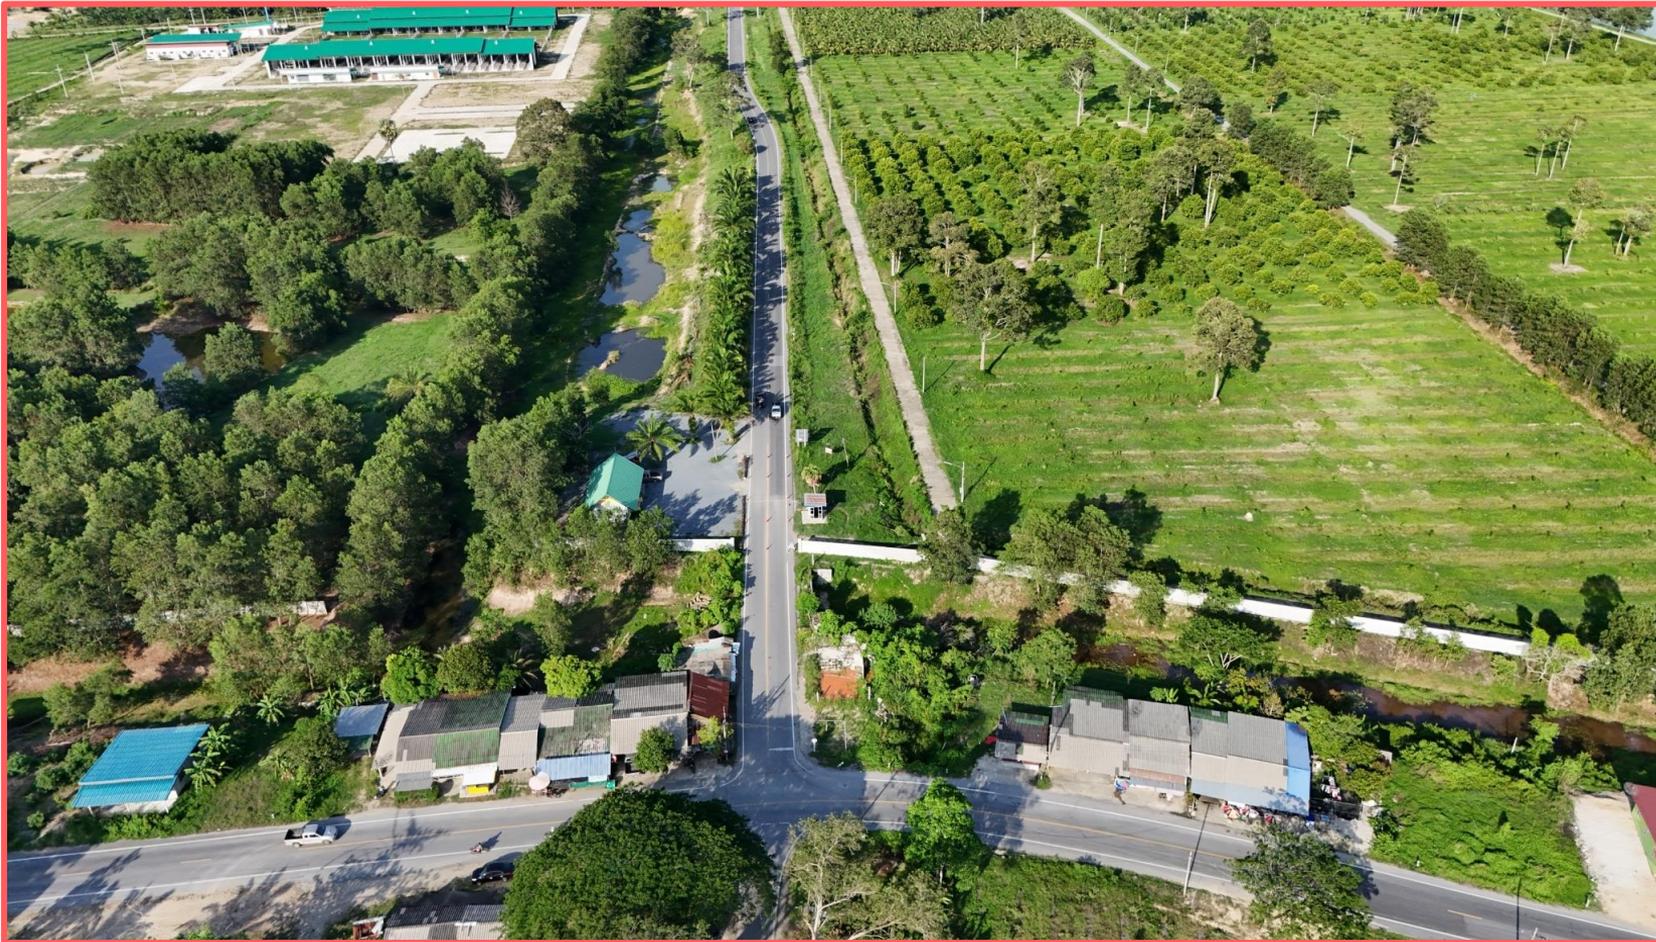





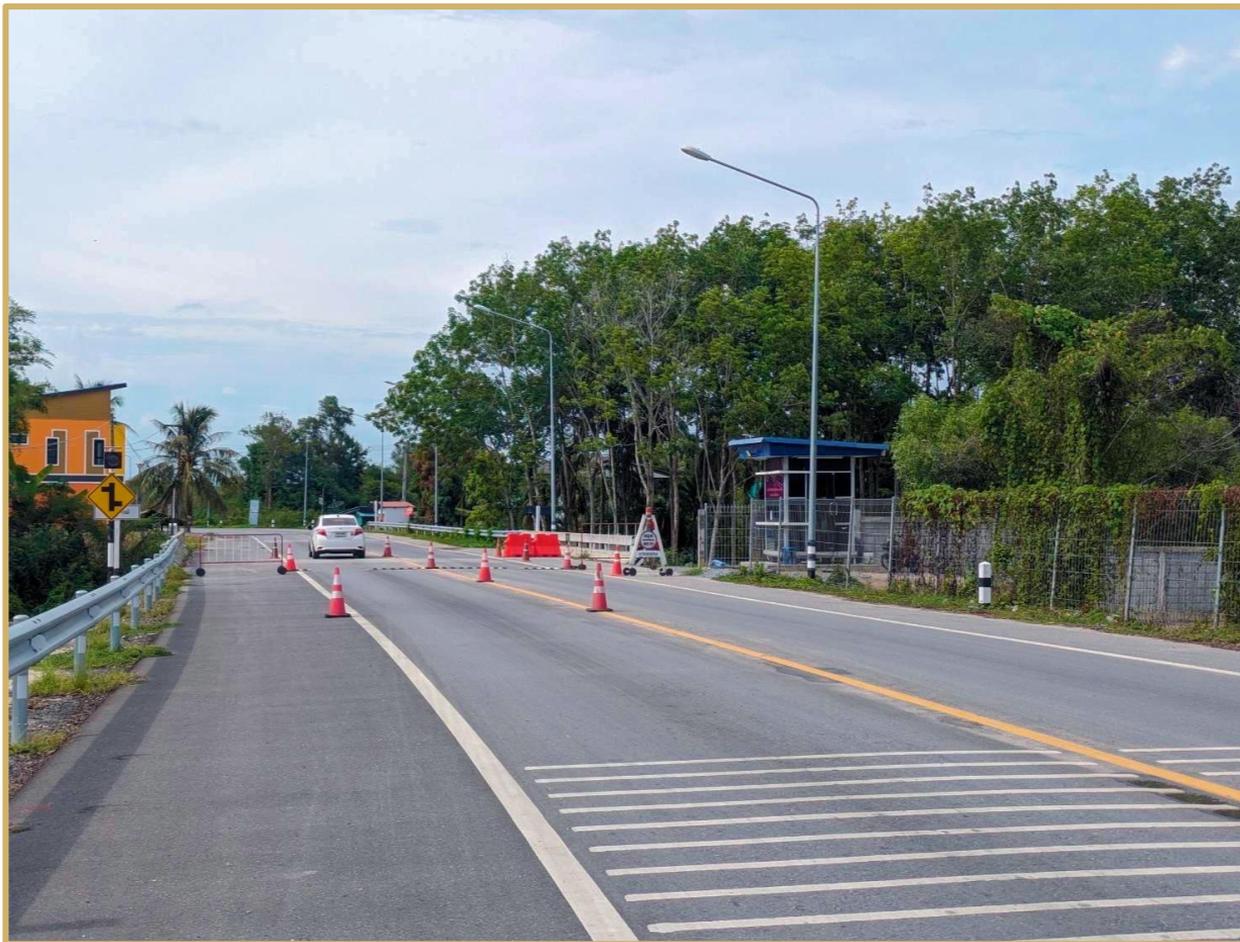

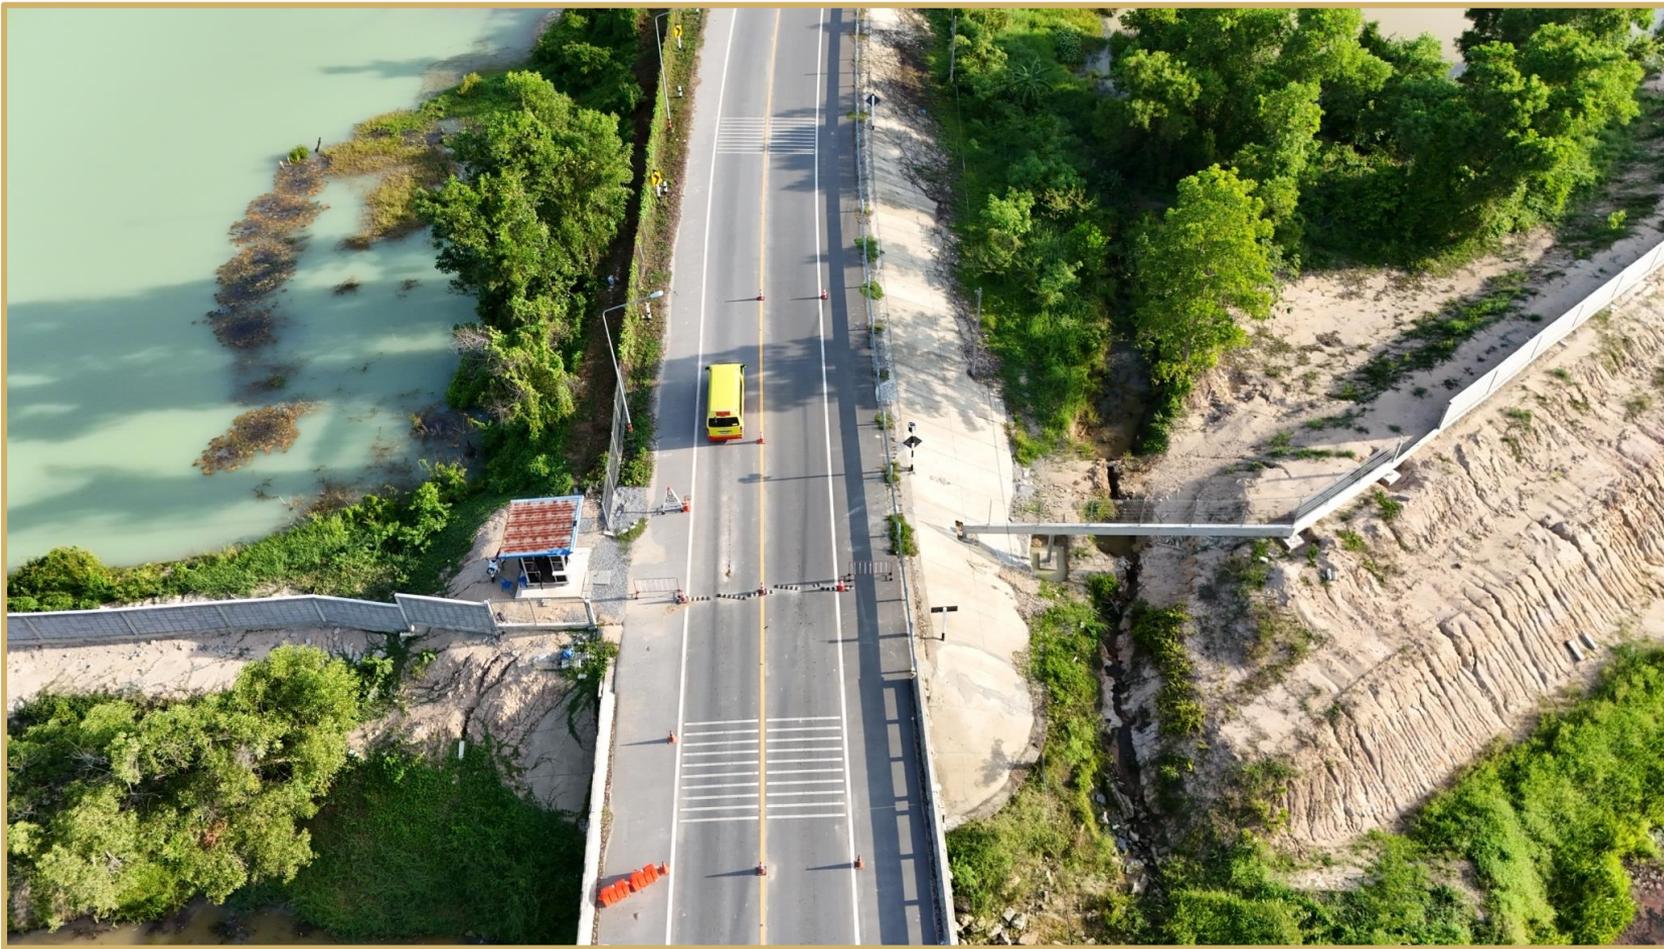





















**THANK YOU**
