

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง รวม 14 โครงการ

ประจำเดือน มกราคม 2568

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราเทพการโยธา
240/2566 ลงวันที่ 15 ส.ค. 66
22,858,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



16 ส.ค. 66 – 6 มี.ค. 68 (569 วัน) (แบบท้ายครั้งที่5)
528 วัน (92.79%)
41 วัน (7.21%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



98.00 %
16/17 งวด
15 คน

1

โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวิทยาลัยลักษณะ






โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อวท.มว. วัฒนธรมวลยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อวท. วัฒนธรมวลยลักษณ์

ชั้น 1

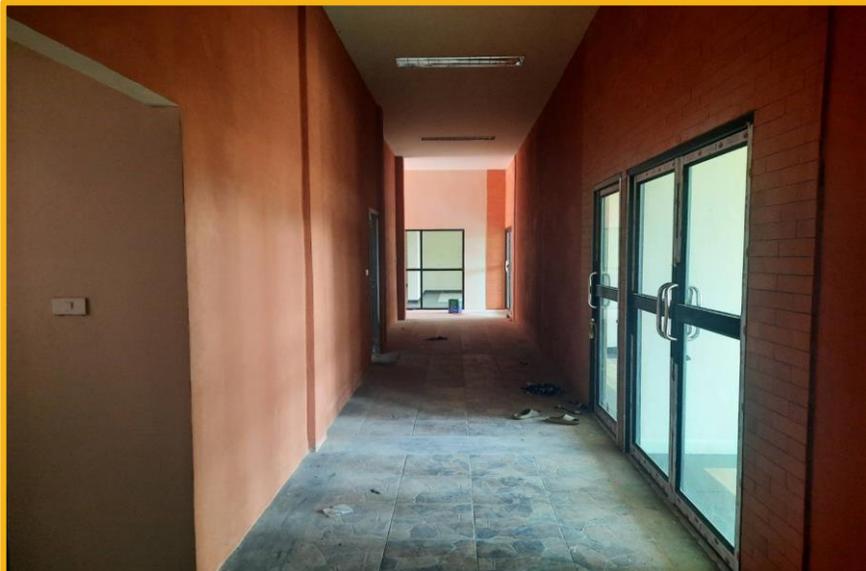



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อิศรมพัฒนธรรมวิทยาลัยลักษณะ



ชั้น 1





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์


ชั้น 1

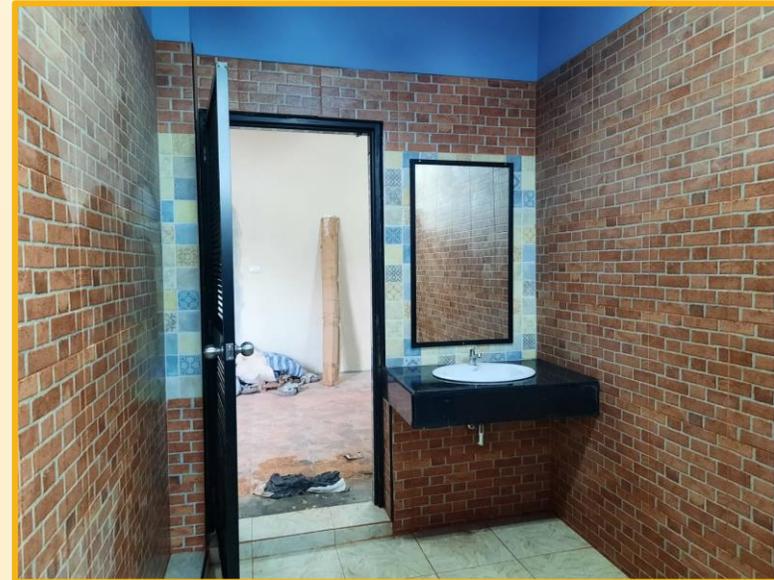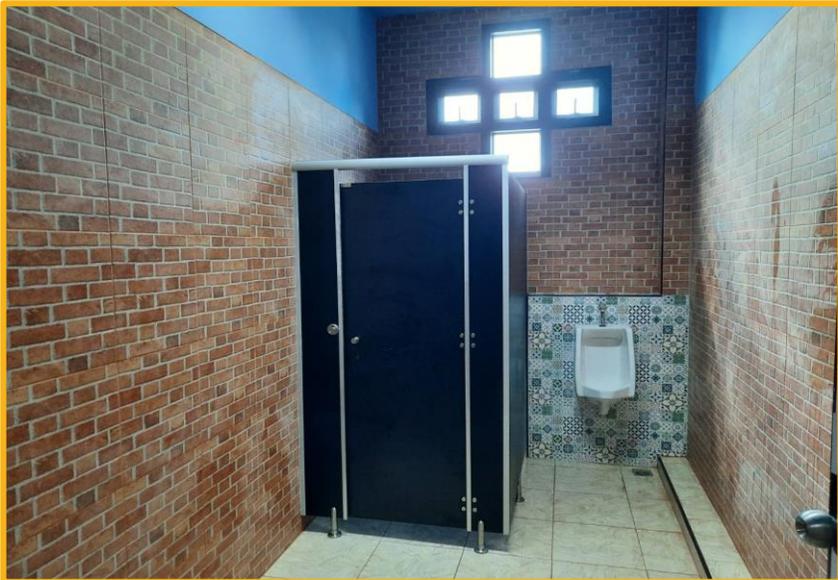



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวิทยาลัยลักษณ์

ชั้น 1

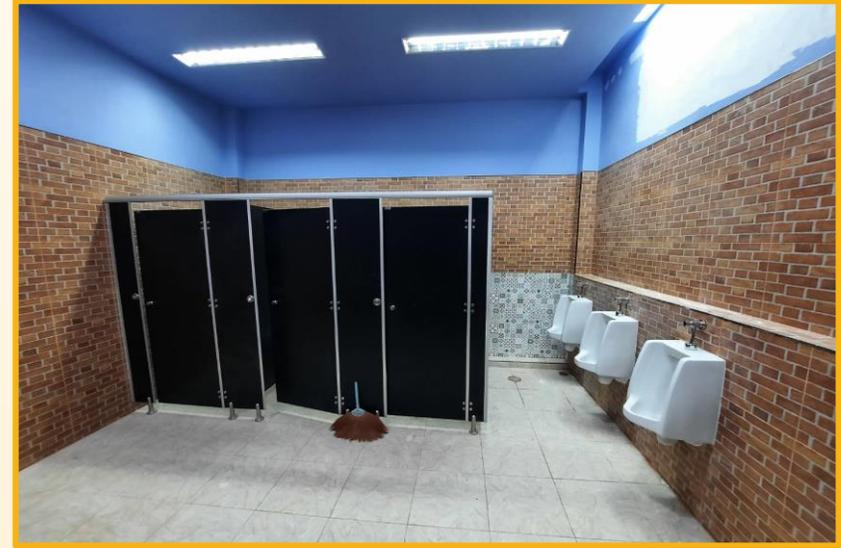

ชั้น 2





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์



ความก้าวหน้างานอาคาร

1. งานอาคารงานหลักแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดงาน ทำความสะอาด
2. งานปูกระเบื้องพื้นระเบียงพื้นชั้นลาดฟ้า และราวกันตกอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 90 %



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อว.ตรัง วิทยาลัยลักษณะ



1

โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อวศร ม. วัฒนธรมวลยลักษณ์



ความก้าวหน้างานลานพลาซ่า

1. งานลานพลาซ่า แล้วเสร็จ 95 %
2. งานทำหลากวด แล้วเสร็จ 95 %



งานงวดที่ 17 สบปลายเดือน กพ. 67



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



2

โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โยธากิจ (2000)
270/2566 ลงวันที่ 6 พ.ย. 66
2,940,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



7 พ.ย. 66 – 14 มี.ค. 67 (494 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 6)
445 วัน (90.08%)
49 วัน (9.92%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย




90.00 %
2/3 งวด
0 คน

จำนวนเครื่องจักร



รถแมคโคร 2 คัน ,รถสิบล้อ 3 คัน ,รถไถ 1 คัน

โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง

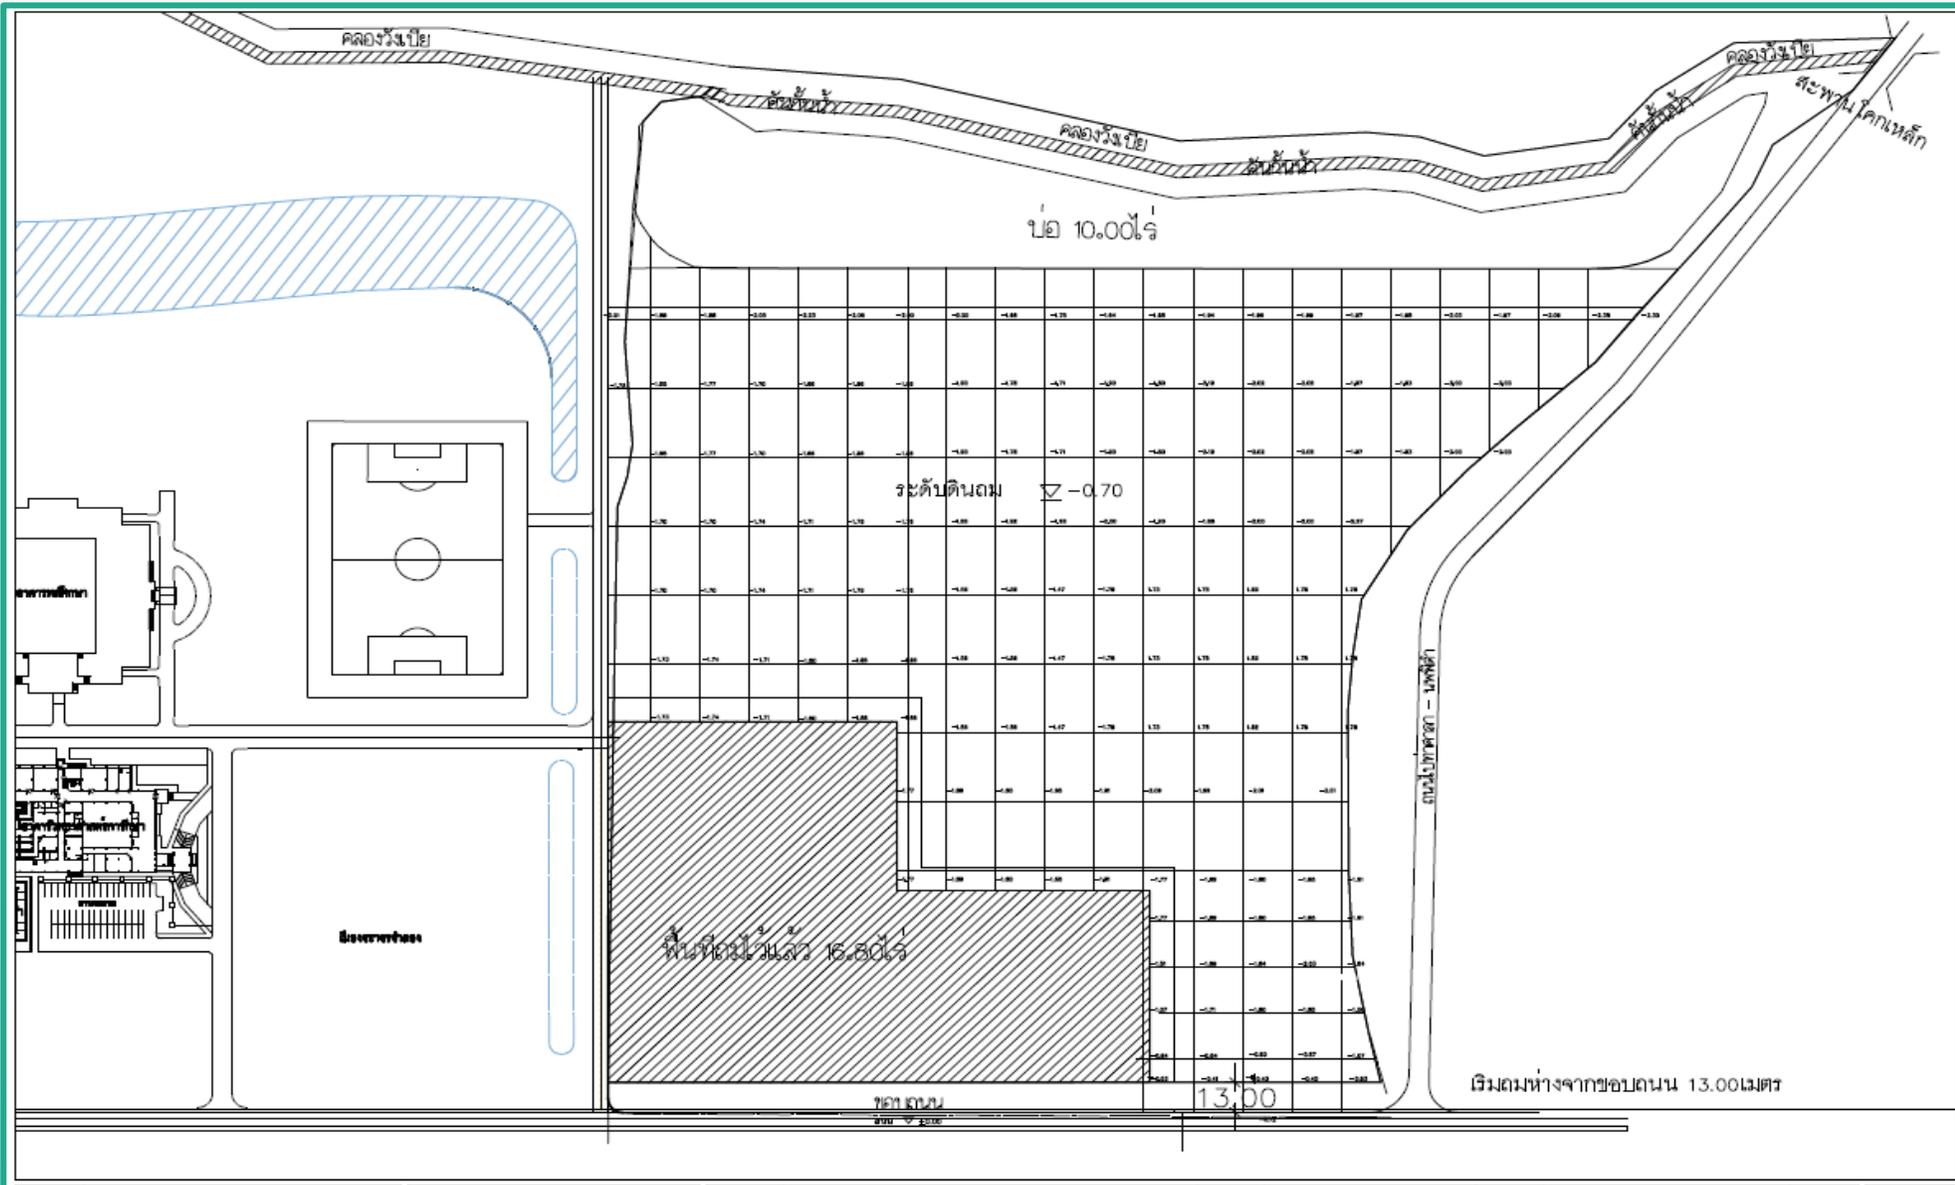

- *พื้นที่ขุดบ่อดิน 10 ไร่ ลึก 8 เมตร
- *พื้นที่ถมดิน 50 ไร่ สูง 1.2 เมตร
- ระดับดินเดิม -1.90 ระดับดินถม -0.70 เมตร)
- *ปริมาณดินถม 100,000 ลบ.ม.


2

โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุ้มบึง



ความก้าวหน้างาน

- งานถมดิน 95 %
- งานปรับระดับพื้นที่จะดำเนินการต่อไป

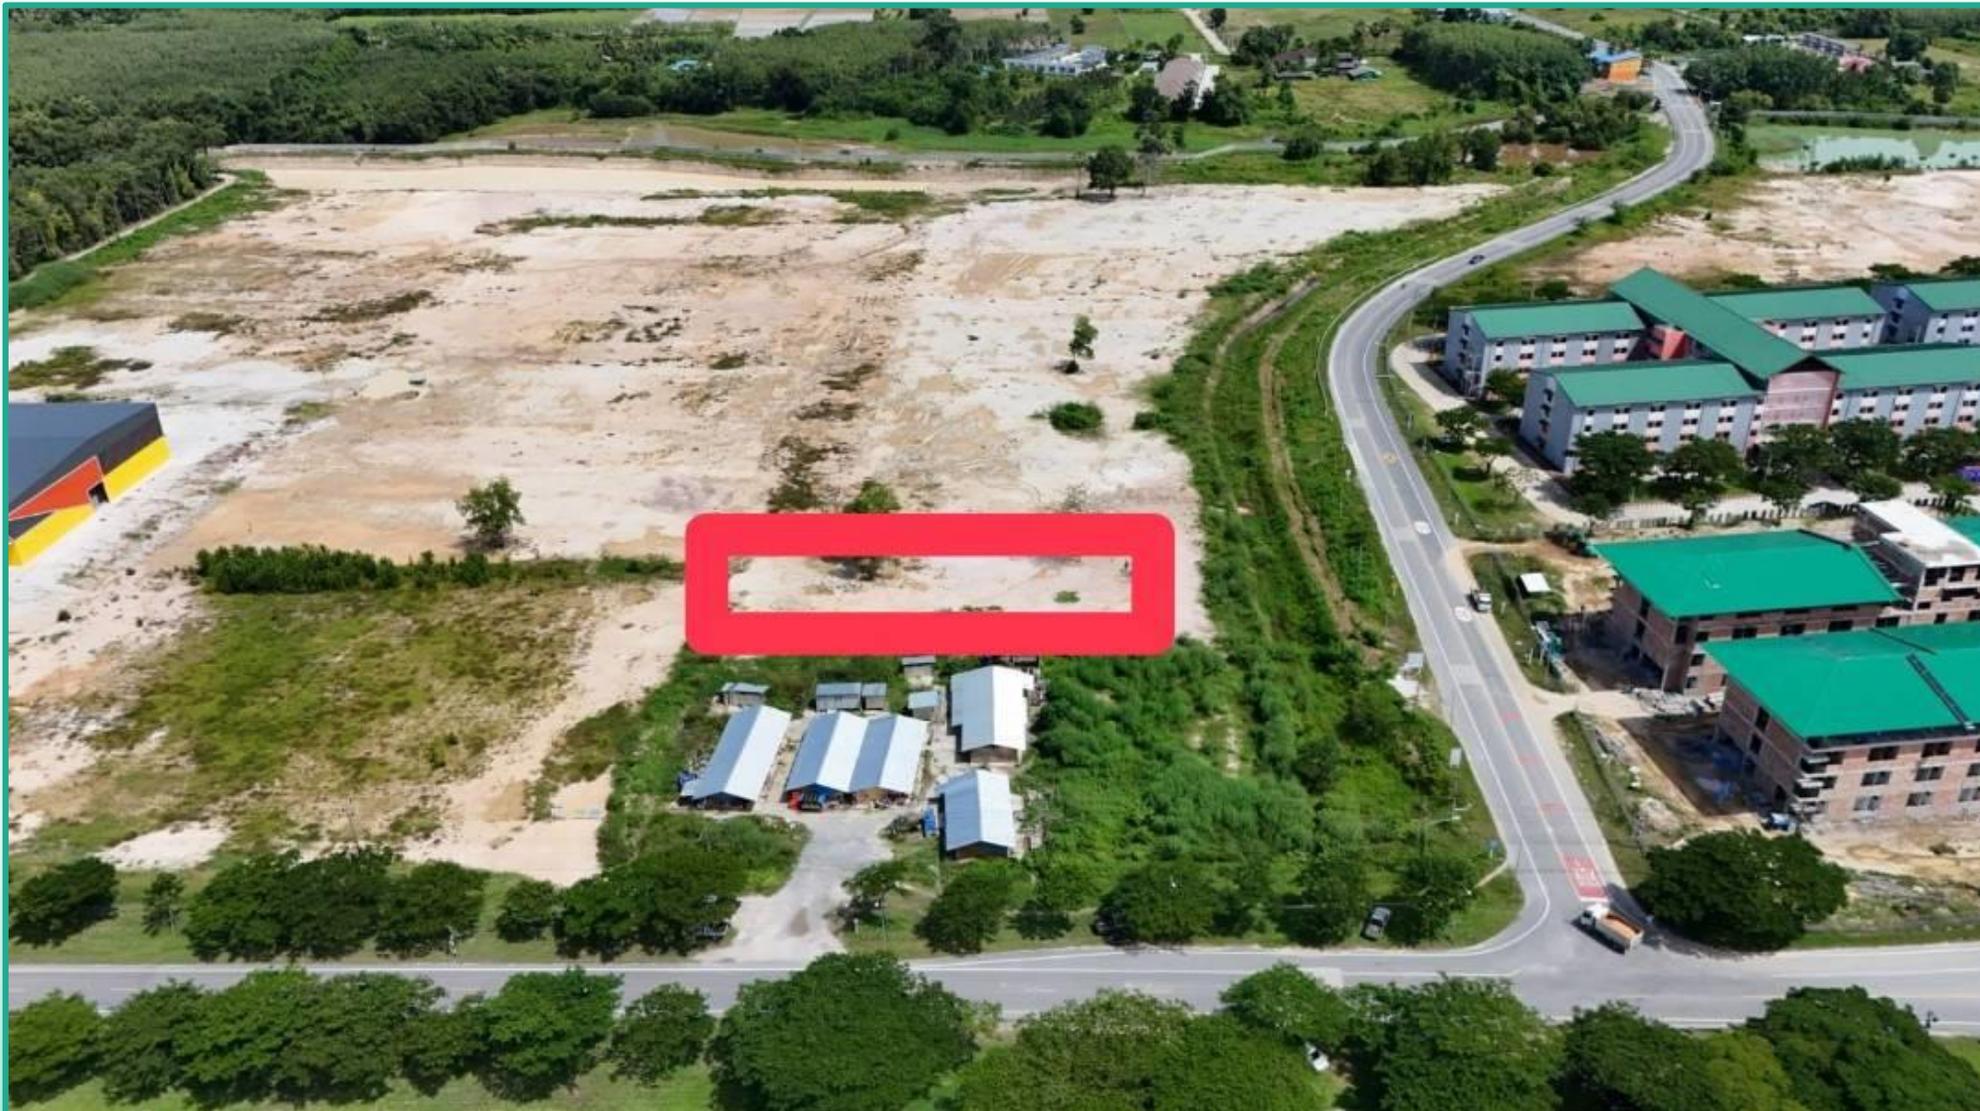

- ระดับดิน ที่พักคนงาน ต่ำกว่า ระดับดินถมอยู่ 40 ซม.
- กองดินหลังที่พักคนงาน 2,400 ลบ.ม. (80*60*0.5 ม.)

3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เอกرنัซ เพ็นท์ จำกัด
023/2566 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 65
22,159,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



1 ก.พ. 67 – 10 มี.ค. 68 (404 วัน) (แนบท้ายครั้งที่ 3)
359 วัน (88.86%)
45 วัน (11.14%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



97.00 %
7/8 งวด
10 คน

3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6


ความก้าวหน้างานภายนอก



3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6



ความก้าวหน้างานห้องน้ำ ชั้น 1 และ 2

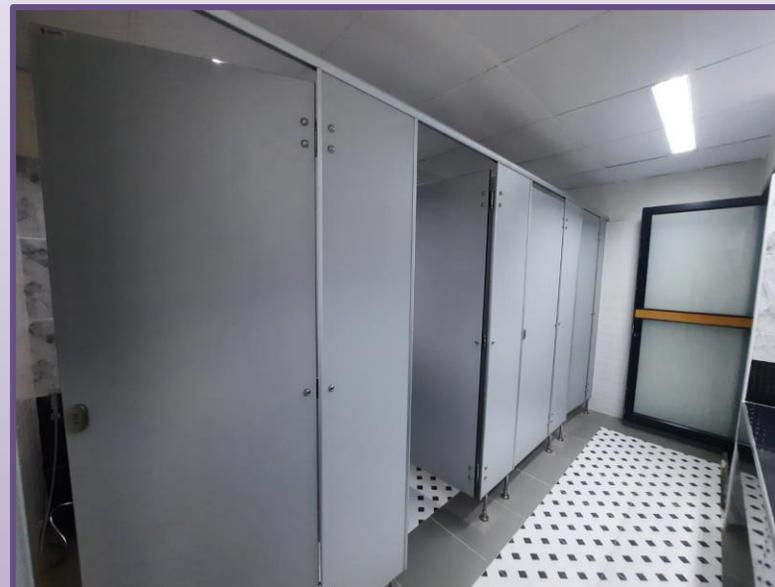

3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6


ชั้น 1 โซนด้านหน้า โถงทางเข้า และสำนักงาน

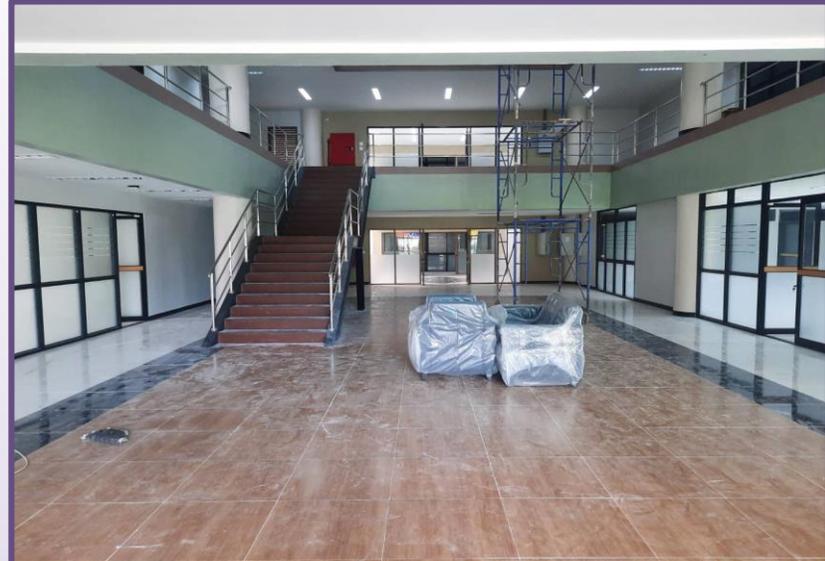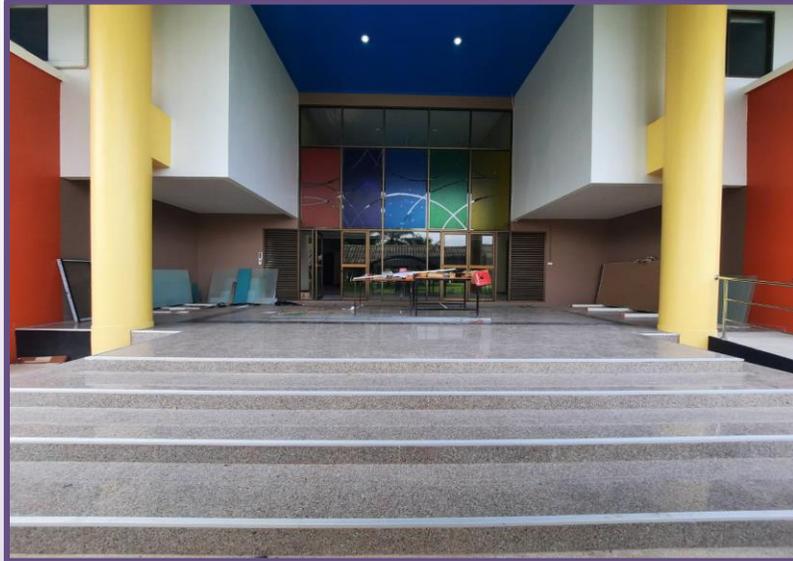

3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ชั้น 1 โซนด้านหน้า โถงทางเข้า และสำนักงาน

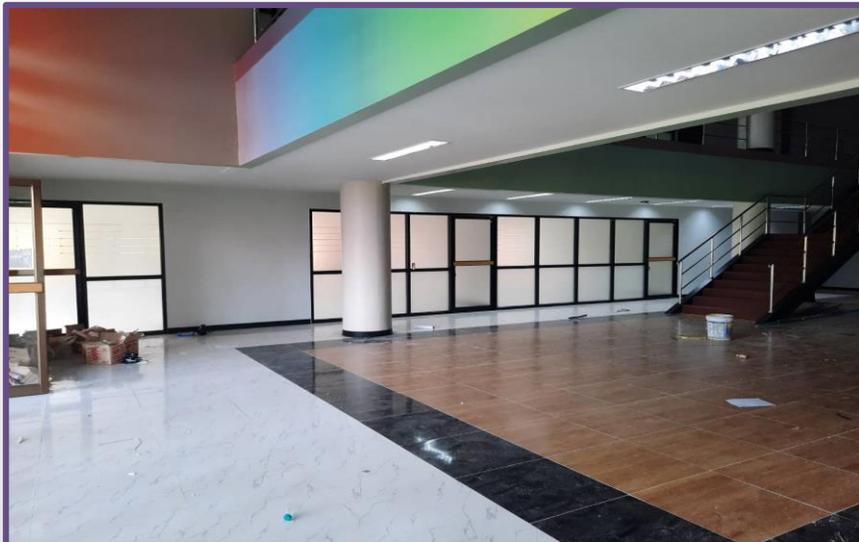

3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ชั้น 1 โชนกลางและหลัง ห้องทำงานอาจารย์ 47 ห้อง (2.7*4.6 =12.5)



3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6


ชั้น 1 โซนกลางและหลัง ห้องประชุมเล็ก 2 ห้อง และ ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง



3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6


ชั้น 1 โซนกลางและหลัง บันได และ โถง

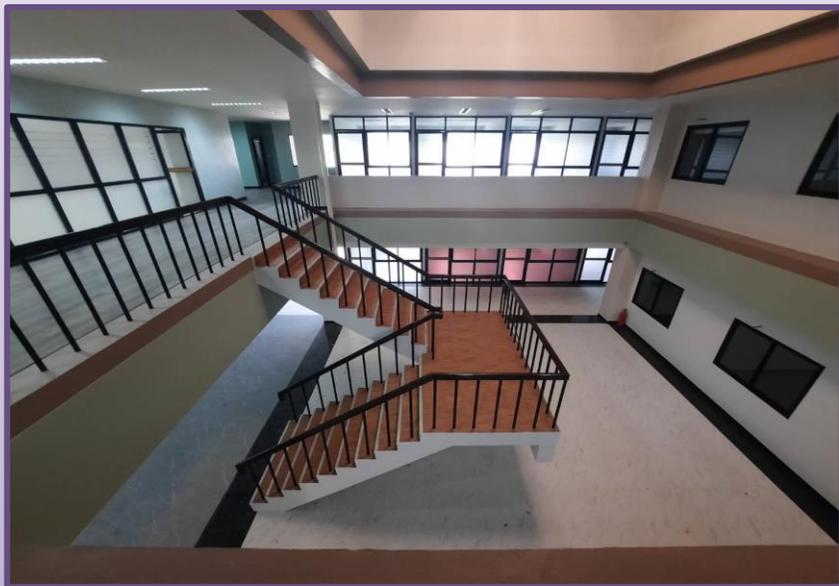

3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ชั้น 2 โซนด้านหน้า โถงทางเดิน ห้องทำงานคนบดี รองคนบดี และห้องต่างๆ

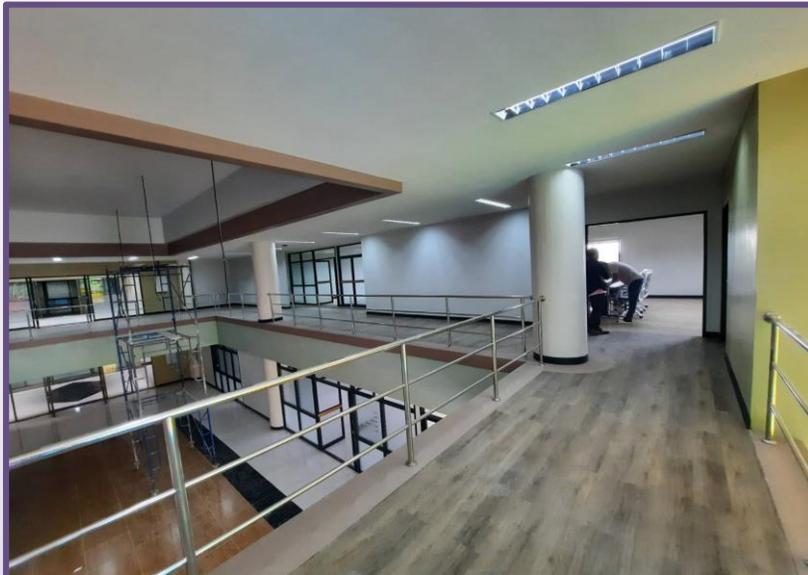

3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6


ชั้น 2 โซนด้านหน้า โถงทางเดิน ห้องทำงานคณบดี รองคณบดี และห้องต่างๆ



3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ชั้น 2 โชนกลางและหลัง ห้องทำงานอาจารย์ 47 ห้อง

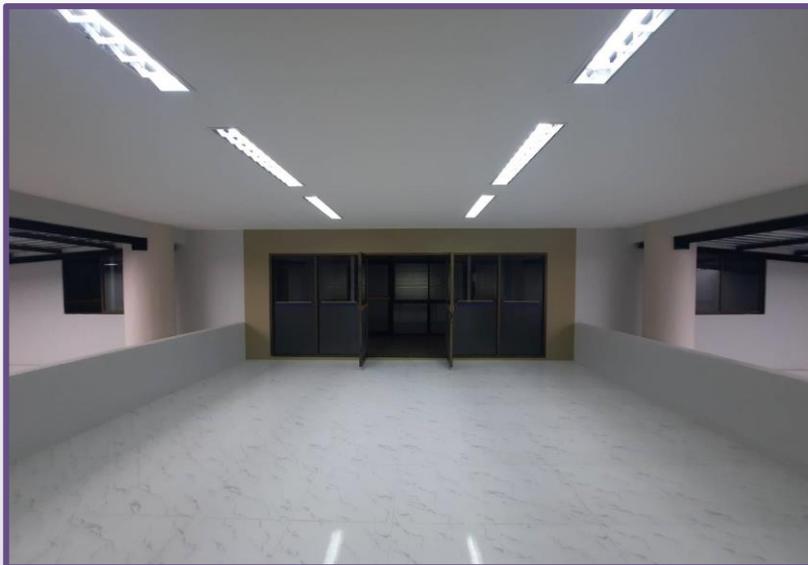





โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ชั้น 2 โชนกลางและหลัง ห้องประชุมเล็ก 2 ห้อง



ส่วนต่อเติมด้านทิศเหนือ วิชาการ 7

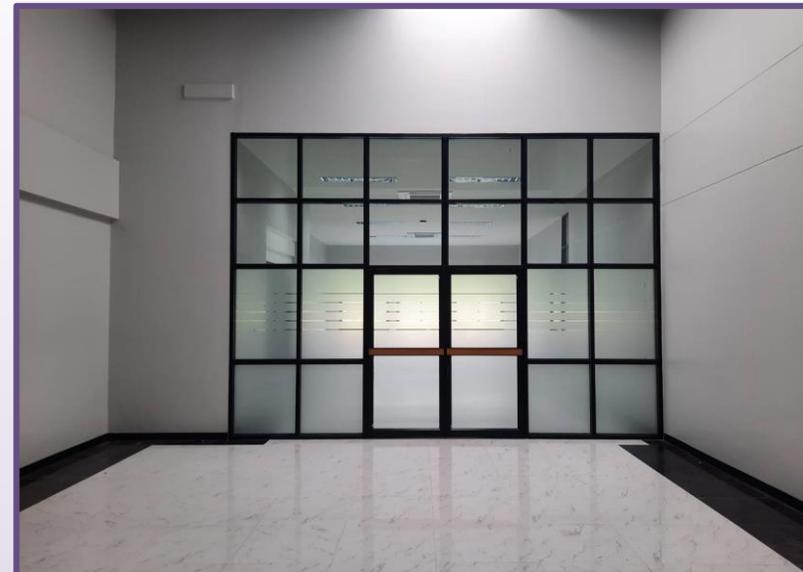

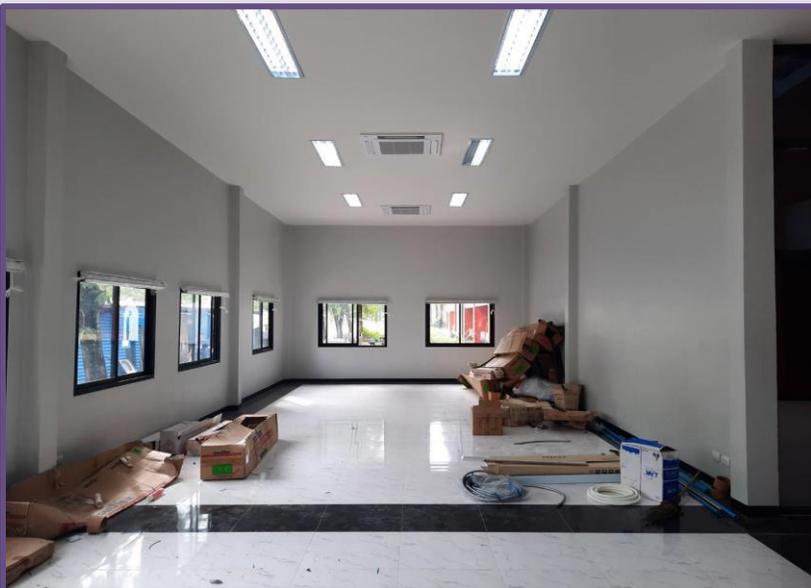

ความก้าวหน้างาน

- * งานเก็บรายละเอียดงานต่างๆ
- * งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร 15 ก.พ. 68



หจก.บ้านสวยเฟอริไนเจอร์ ชุมพร

กำหนดส่งมอบงานครุภัณฑ์อาคารวิชาการ ม.วลัยลักษณ์

ลูกค้า...บริษัท เอกธนะช เพ้นท์ จำกัด (คุณเบิร์ด 083-714-4493)

ลำดับ	รายการ	รุ่น	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	กำหนดส่ง
1	เก้าอี้ผู้บริหาร ขาเหล็ก	BARREL	MONO	3	ตัว	27 ม.ค. 2568
2	เก้าอี้ประชุมห้อง คณบดี	PANGPOND	MONO	12	ตัว	27 ม.ค. 2568
3	เก้าอี้ประชุม ขาเหล็ก	MM/S	MONO	152	ตัว	27 ม.ค. 2568
4	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1.5 ม. ขาเหล็ก	SL121-15075	BT	1	ตัว	11 ก.พ. 2568
5	โต๊ะผู้บริหาร คณบดี พร้อมตู้ต่อข้าง	GERRY	PERFECT	1	ตัว	27 ม.ค. 2568
6	โต๊ะรองคณบดี L-SHAPE ขาเหล็ก	MT180-80+MT1-10+653MTSP	MONO	2	ตัว	27 ม.ค. 2568
7	โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ พับได้ ขาเหล็ก	FOCUS160	BT	40	ตัว	11 ก.พ. 2568
8	โต๊ะประชุมขาเหล็ก 8 ที่นั่ง	ESP-330	ITOKI	1	ตัว	28 ม.ค. 2568
9	โต๊ะประชุมโล่ง 1.6 ม.	SLW1600-80	ITOKI	39	ตัว	28 ม.ค. 2568
10	ตู้โชว์พร้อมตู้เสื้อผ้า 2.4 ม.	งานบัวอินตามแบบ		1	ชุด	11 ก.พ. 2568
11	ตู้เก็บเอกสารสูง บนโล่งล่างบานเปิด	180-OLT	ITOKI	2	ใบ	28 ม.ค. 2568
12	โซฟาแยกชั้น 5 ที่นั่ง	MARVEL	MONO	1	ชุด	27 ม.ค. 2568
13	โต๊ะกลาง TOP กระจก	TONY/B	MONO	1	ตัว	27 ม.ค. 2568







4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เหล็กตริง จำกัด
217/2566 ลงวันที่ 22 พ.ค. 66
128,401,370.44 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



23 พ.ค. 66 – 28 เม.ย. 68 (707 วัน)
613 วัน (86.70%)
94 วัน (13.30%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



73.00 %
11/18 งวด
130 คน



4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานระหว่างเดือน



352 ห้อง = 76+92+92+92

2 ห้องชั้น = (8+1) * 2










โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

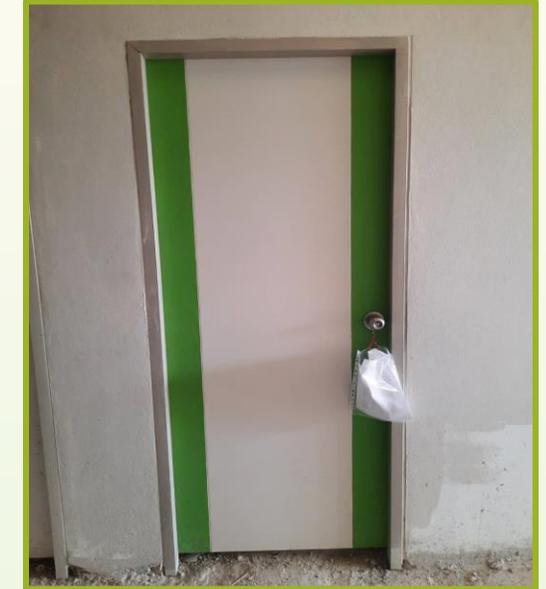

ความก้าวหน้างาน
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 1


- งานก่ออิฐ+ฉาบปูน ความก้าวหน้า 95 %
- งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ความก้าวหน้า 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้อง ความก้าวหน้า 100 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 98 %
- งานติดตั้งประตู+หน้าต่าง ความก้าวหน้า 90 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ความก้าวหน้า 52 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 80 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 90 %
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ความก้าวหน้า 98 %

352 ห้อง = 76+92+92+92

2 ห้องซักรีด = (8+1) * 2

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

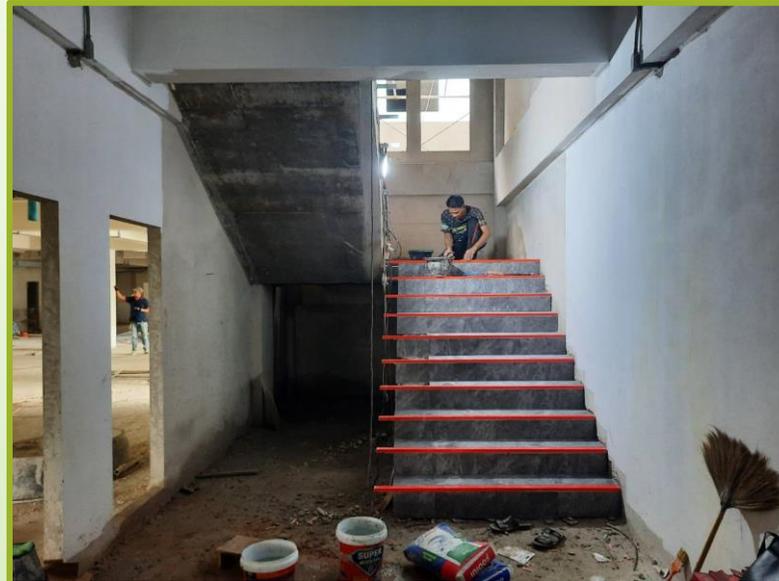

ความก้าวหน้างาน โถงทางเดิน ชั้น 1

- งานฉาบปูนผนัง ความก้าวหน้า 95 %
- งานฉาบโครงสร้าง ความก้าวหน้า 90 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นทางเดิน ความก้าวหน้า 0 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 80 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 60 %



ความก้าวหน้างาน
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 2

- งานก่ออิฐ+ฉาบปูน ความก้าวหน้า 98 %
- งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ความก้าวหน้า 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้อง ความก้าวหน้า 100 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 75 %
- งานติดตั้งประตู+หน้าต่าง ความก้าวหน้า 85 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ความก้าวหน้า 12 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 80 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 90 %
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ความก้าวหน้า 80 %





ความก้าวหน้างาน
โถงทางเดิน ชั้น 2

- งานฉาบปูนผนัง ความก้าวหน้า 95 %
- งานฉาบโครงสร้าง ความก้าวหน้า 90 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 98 %
- งานปูกระเบื้องพื้นทางเดิน ความก้าวหน้า 70 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 80 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 50 %



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

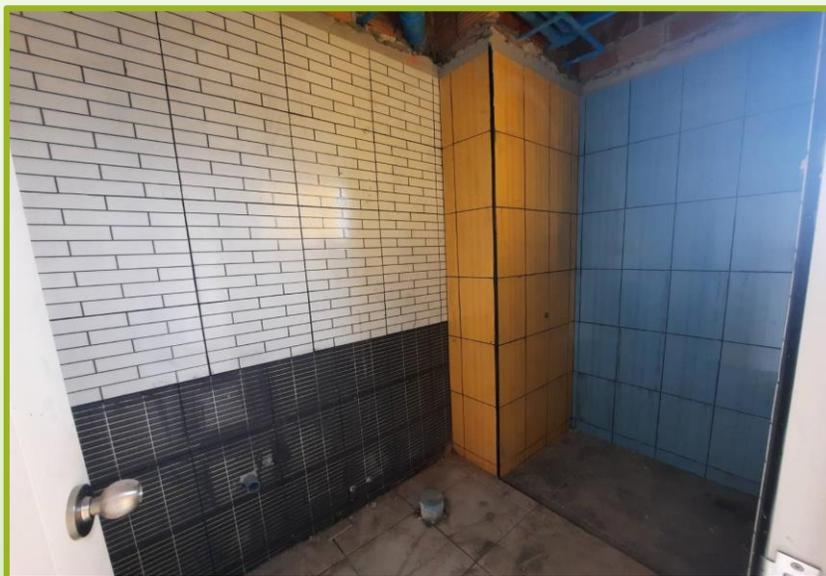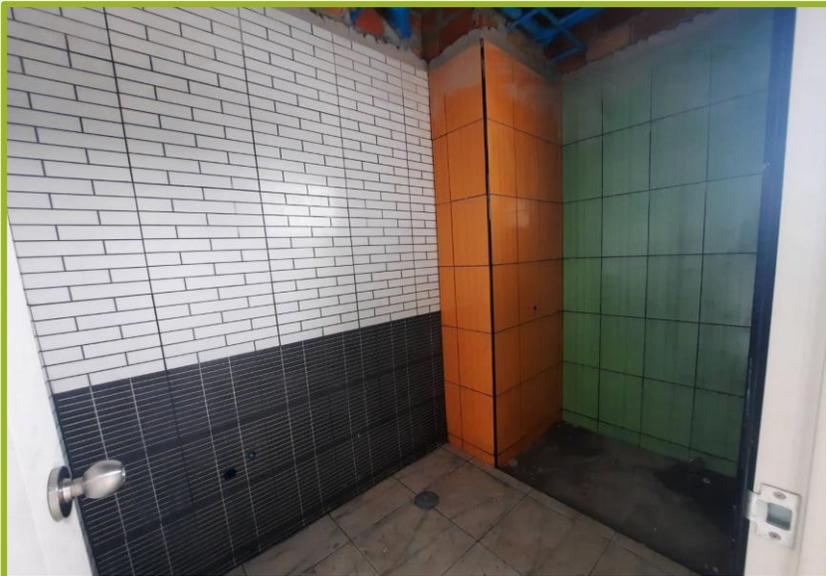

ความก้าวหน้างาน ห้องพักนักศึกษา ชั้น 3

- งานก่ออิฐ+ฉาบปูน ความก้าวหน้า 95 %
- งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ความก้าวหน้า 95 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้อง ความก้าวหน้า 95 %
- งานไฟฟ้าเดิน ความก้าวหน้า 75 %
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ความก้าวหน้า 60 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ความก้าวหน้า 0 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 75 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 50 %
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ความก้าวหน้า 12.5 %



4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ความก้าวหน้างาน โถงทางเดิน ชั้น 3

- งานฉาบปูนผนัง ความก้าวหน้า 95 %
- งานฉาบโครงสร้าง ความก้าวหน้า 90 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 98 %
- งานปูกระเบื้องพื้นทางเดิน ความก้าวหน้า 0 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 65 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 0 %

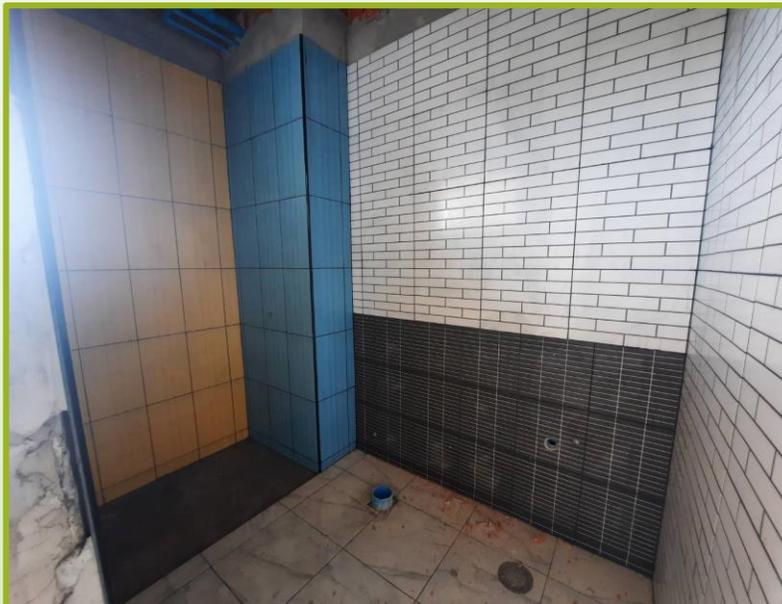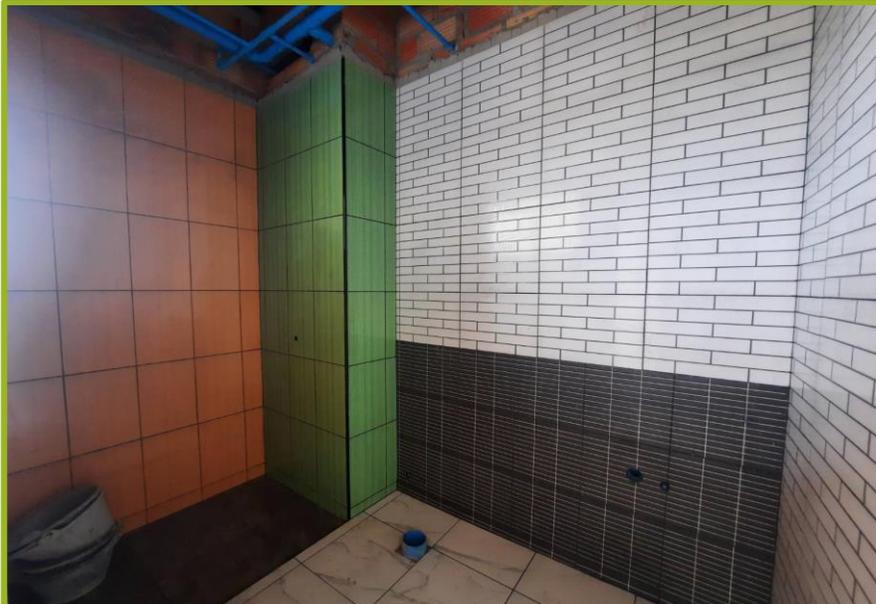

ความก้าวหน้างาน
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 4

- งานก่ออิฐ+ฉาบปูน ความก้าวหน้า 90 %
- งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ความก้าวหน้า 55 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้อง ความก้าวหน้า 45 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 75 %
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ความก้าวหน้า 0 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ความก้าวหน้า 0 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 40 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 50 %
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ความก้าวหน้า 0 %

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ความก้าวหน้างาน โถงทางเดิน ชั้น 4

- งานฉาบปูนผนัง ความก้าวหน้า 95 %
- งานฉาบโครงสร้าง ความก้าวหน้า 90 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 0 %
- งานปูกระเบื้องพื้นทางเดิน ความก้าวหน้า 0 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 25 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 0 %



โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C




ความก้าวหน้างาน งานภายนอก

1. งานฉาบปูนผนังภายนอก แล้วเสร็จ 70 %
2. งานทาสีผนังภายนอก แล้วเสร็จ 65 %
3. งานติดตั้งไฟฟ้าภายนอก แล้วเสร็จ 65 %
4. งานวางท่อระบายน้ำฝน+บ่อพัก แล้วเสร็จ 95 %

งานงวดที่ 12 ส่งแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ

โครงการ ก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

	รายการเอียง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	กำหนดงานแล้วเสร็จ
1	งานปูกระเบื้องพื้นภายในห้อง , พื้นห้องน้ำที่เหลือ (ชั้นที่4)	7 ก.พ .68
2	งานปูพื้นโถงทางเดินชั้น 1	15 มี.ค.68
3	งานปูพื้นทางเดินชั้น 2,3,4	7 มี.ค.68
4	งานปูพื้นโถงบันได ชั้น 1,2 ,3 ,4	28 ก.พ.68
5	งานฝ้าเพดานทางเดิน ชั้นที่4	20 ก.พ. 68
6	งานติดตั้งฝ้าในห้องน้ำ	20 ก.พ. 68
7	งานฝ้าเพดาน ชายคา	10 ก.พ .68
8	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ	31 มี.ค. 68
9	งานติดตั้งซิ้งค์ล้างจานที่ระเบียง	31 มี.ค. 68
10	งานฉาบผนังด้านนอกอาคาร	7 ก.พ .68
11	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	7 เม.ย.68
12	งานก่อสร้างห้องซักผ้าทั้ง 2 ฟัง	31 มี.ค. 68
13	งานระบบไฟฟ้า เดินท่อ ร้อยสาย ติดตั้งโคมไฟหลอดไฟ พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์	15 เม.ย.68
14	งานระบบสุขาภิบาล และระบบน้ำดี ภายใน	7 เม.ย.68
15	งานทาสีภายใน- ภายนอก พร้อมเก็บรายละเอียด	20 เม.ย. 68
16	งานภายนอกทั้งหมด ถนน ลานจอดรถ ระบบระบายน้ำ	20 เม.ย. 68
17	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	31 ม.ค .68
18	เก็บรายละเอียดและงาน อื่นๆ	25 เม.ย. 68

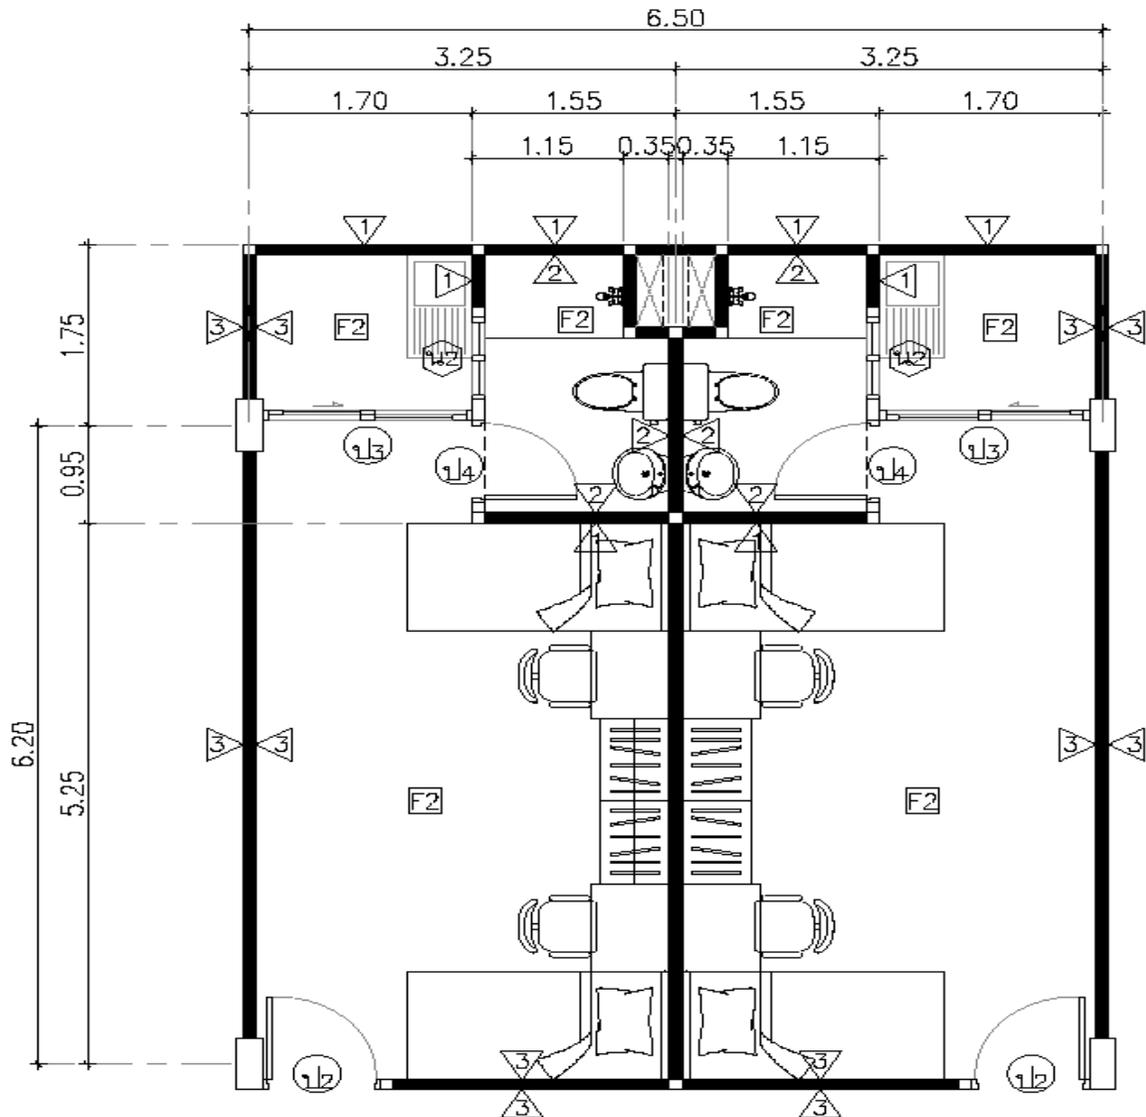


รายการประกอบแบบ

- F1 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40X40 cm. (ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี) พร้อมบัวยาว 10 cm.
- F2 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวฉ่ำกัน ขนาด 40X40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 1 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- 2 = ผนังท่อน้ำกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40X40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 3 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- C1 = งานแต่งแนวท่อน้ำฝ้าสำเร็จรูป พร้อมทาสี (ชั้น 1-3)
- C3 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานชั้น 4)
- C4 = ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงโครง T-BAR ขนาด 60X60 cm.เหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1-3)
- C5 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 4)


** หมายเหตุ ** -สีทาสีผนังให้ใช้สีทนสภาวะอากาศ ชนิดกึ่งเงา และมี มอก.
 -ระดับฝ้าเพดานโถงทางเดิน และห้องพักชั้น 4 +3.00 m.

แบบแปลนขยายห้องพัก
 มาตรฐาน 1:100

จำนวน 352 ห้อง พื้นที่ 26 ตร.ม.
 ห้องนอน 19 ตร.ม. ห้องน้ำ 4 ตร.ม.
 ระเบียง 3 ตร.ม. ฝ้าเพดาน 2.6 ม.
 76+92+92+92=352

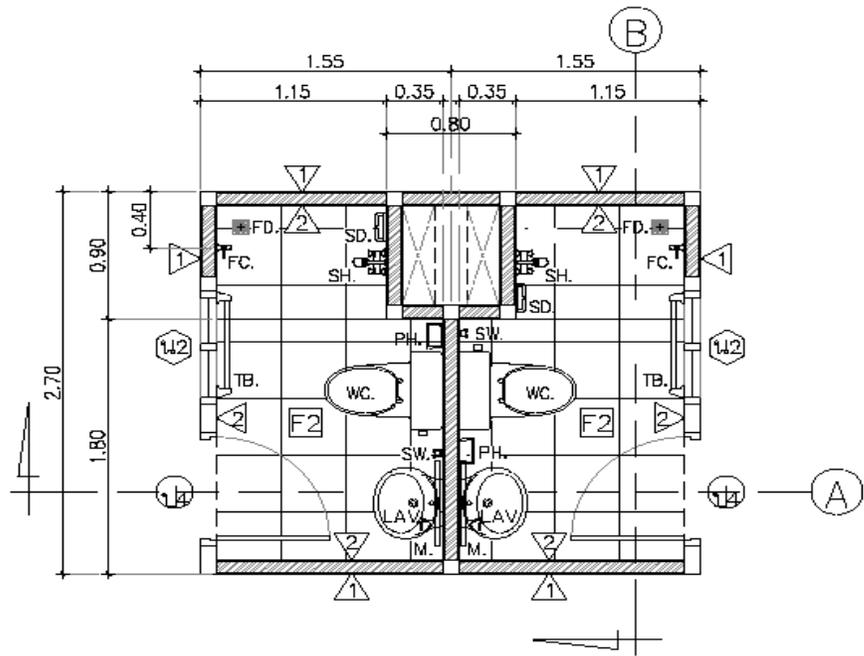

แปลนพื้นห้องน้ำ
ขนาดส่วน 1:100

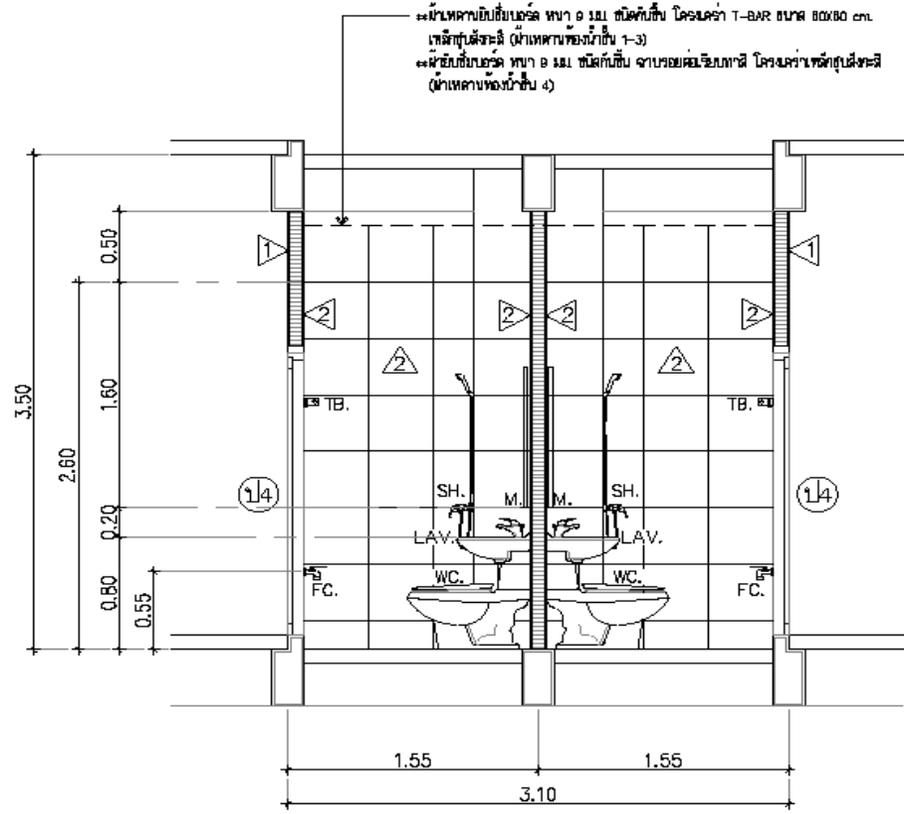

แบบขยายรูปตัด
ขนาดส่วน 1:100

สีภายในห้องพัก อาคาร WU RESIDENCE C

ชั้นที่	ผนัง.1	ผนัง.2	ผนัง.3	ผนัง.4-5	ผนัง.5
ชั้น.1	066-5 Apple Anne	066-1 Vista of Spring	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rail	031-5 Blue Cadet
ชั้น.2	039-5 Gen's lake	040-3 Seaside Vista	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rail	031-5 Blue Cadet
ชั้น.3	009-5 Purple Parade	009-4 Purple Mountain	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rail	031-5 Blue Cadet
ชั้น.4	173-5 Fox Hunt	173-5 Ivory Infinity	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rail	031-5 Blue Cadet







5

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิก และ สถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท คุณทวี จำกัด
61/2567 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 67
65,878,703.73 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



14 มิ.ย. 67 – 8 มิ.ย. 68 (360 วัน)
225 วัน (62.50%)
135 วัน (37.50%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



16.80 %
2/9 งวด
30 คน







5

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ความก้าวหน้างานก่อสร้างเปรียบเทียบระหว่างเดือน





ความก้าวหน้างาน
งานโครงสร้าง

1. งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
2. งานคาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
3. งานระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 90 %
4. งานพื้น ชั้น 1 แล้วเสร็จ 97 %
5. งานเสา ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
6. งานตั้งนั่งร้าน รับคาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 40 %

หมายเหตุ


งานงวดที่ 3 ส่งได้ประมาณปลายเดือน ก.พ. 68

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์




- น 48 ย 78
- สำนักงาน ห้องซักประวัติ ห้องปฏิบัติการ
- *พื้นที่ทางเดิน+LAB+ซักประวัติ
กระเบื้อง 60*60
- *สำนักงาน +ประชุม กระเบื้องยางลายไม้
- *ฝ้าเพดาน 3.5 ม.

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณจำลองทางการแพทย์

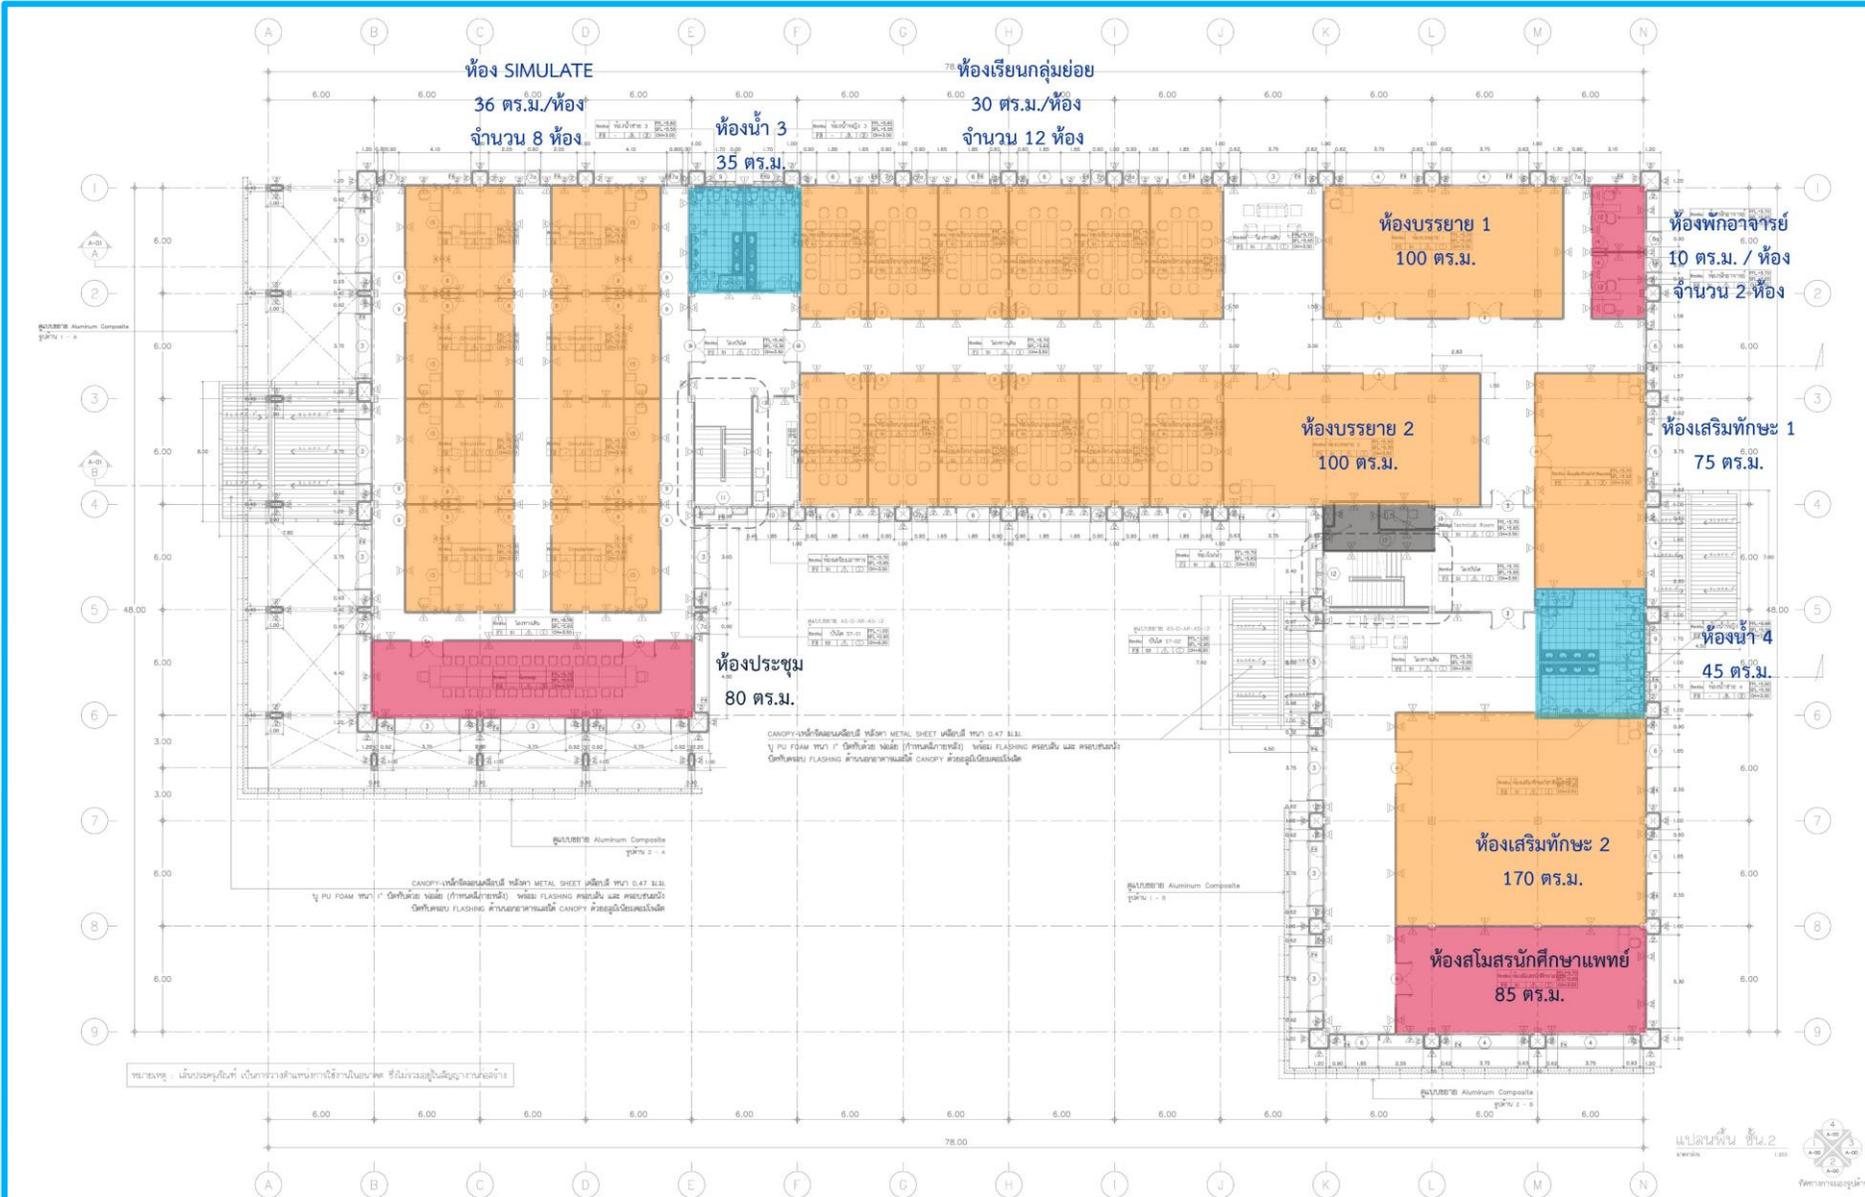

ก 48 ย 78
Simulation ห้องเรียน ห้องบรรยาย

- *พื้นที่ทางเดิน กระเบื้อง 60*60
- *ห้องเรียน + simulation กระเบื้องยางลายไม้
- *ฝ้าเพดาน 3.5 ม.

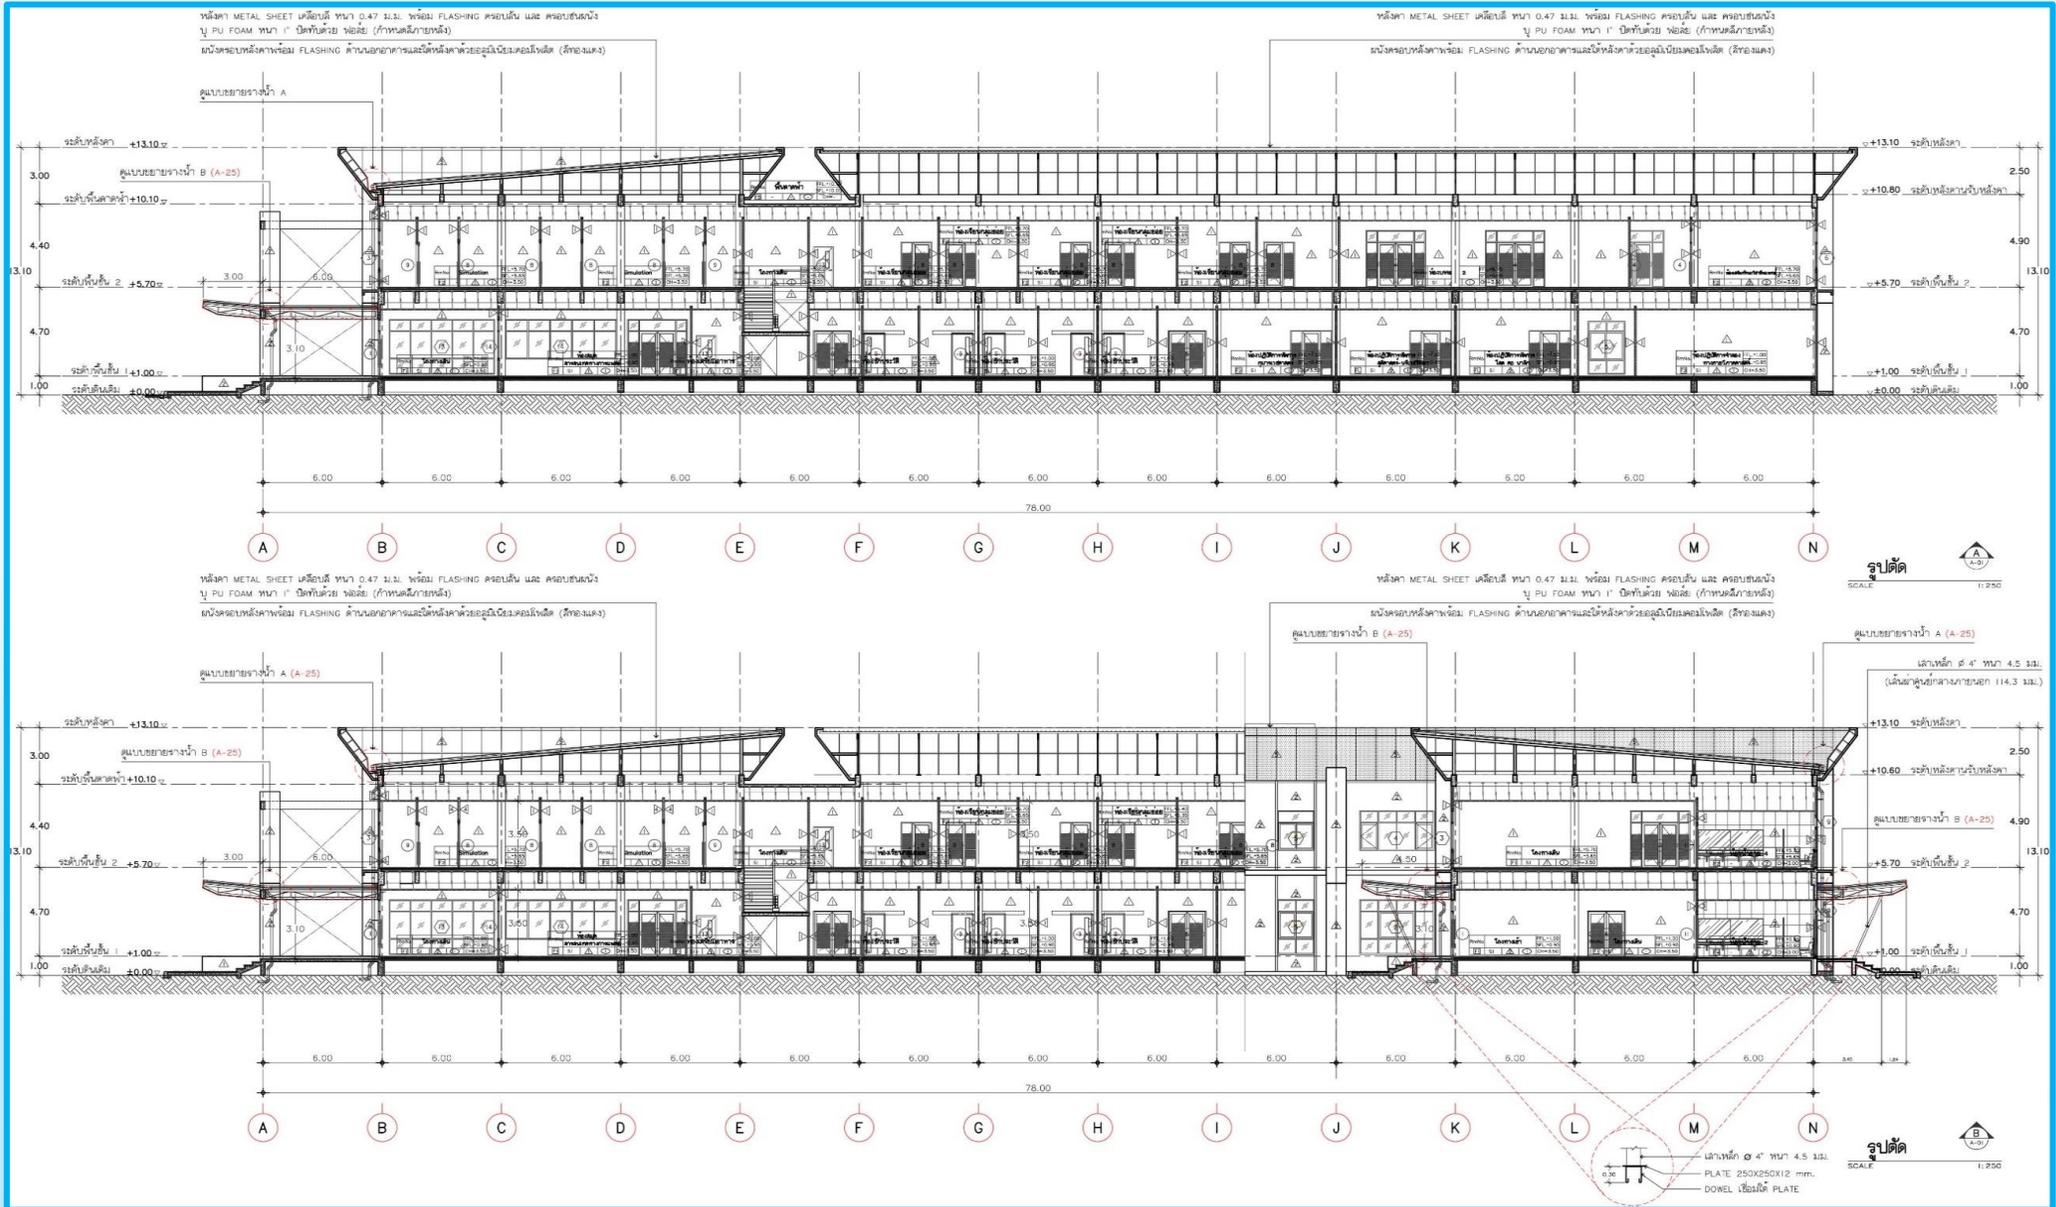







โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เพอร์เฟค พลัส โซลูชั่น จำกัด
092/2567 ลงวันที่ 04 ก.ค. 67
73,880,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




05 ก.ค. 67 – 08 ส.ค. 68 (400 วัน)
204 วัน (51.00%)
196 วัน (49.00%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย




18.44 %
4/12 งวด
40 คน

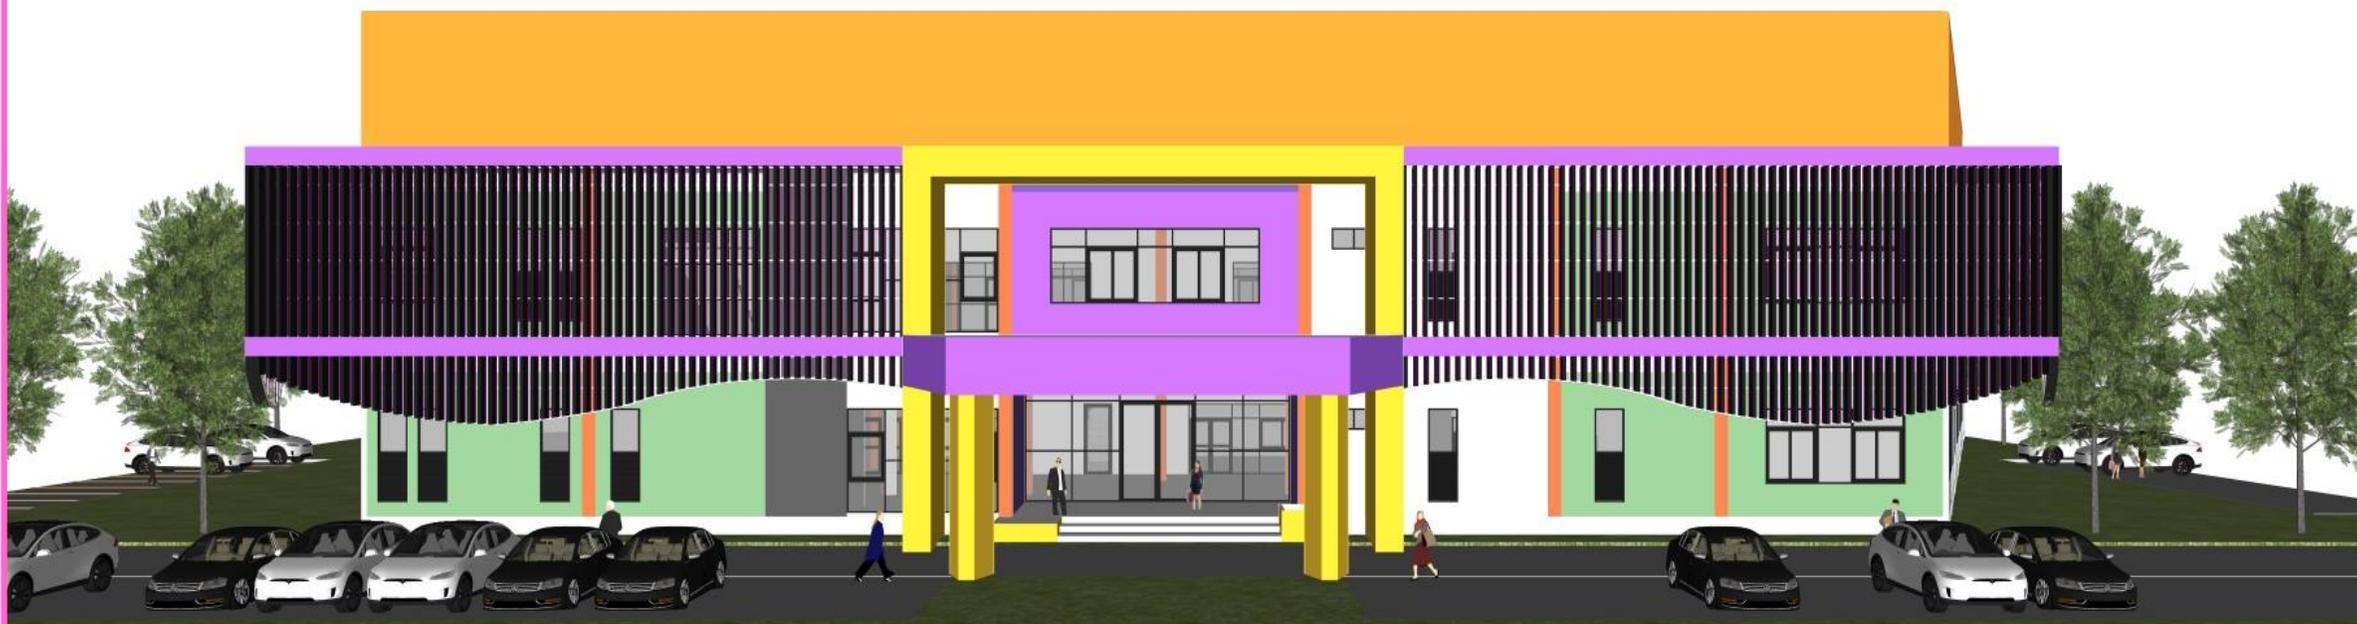

6

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



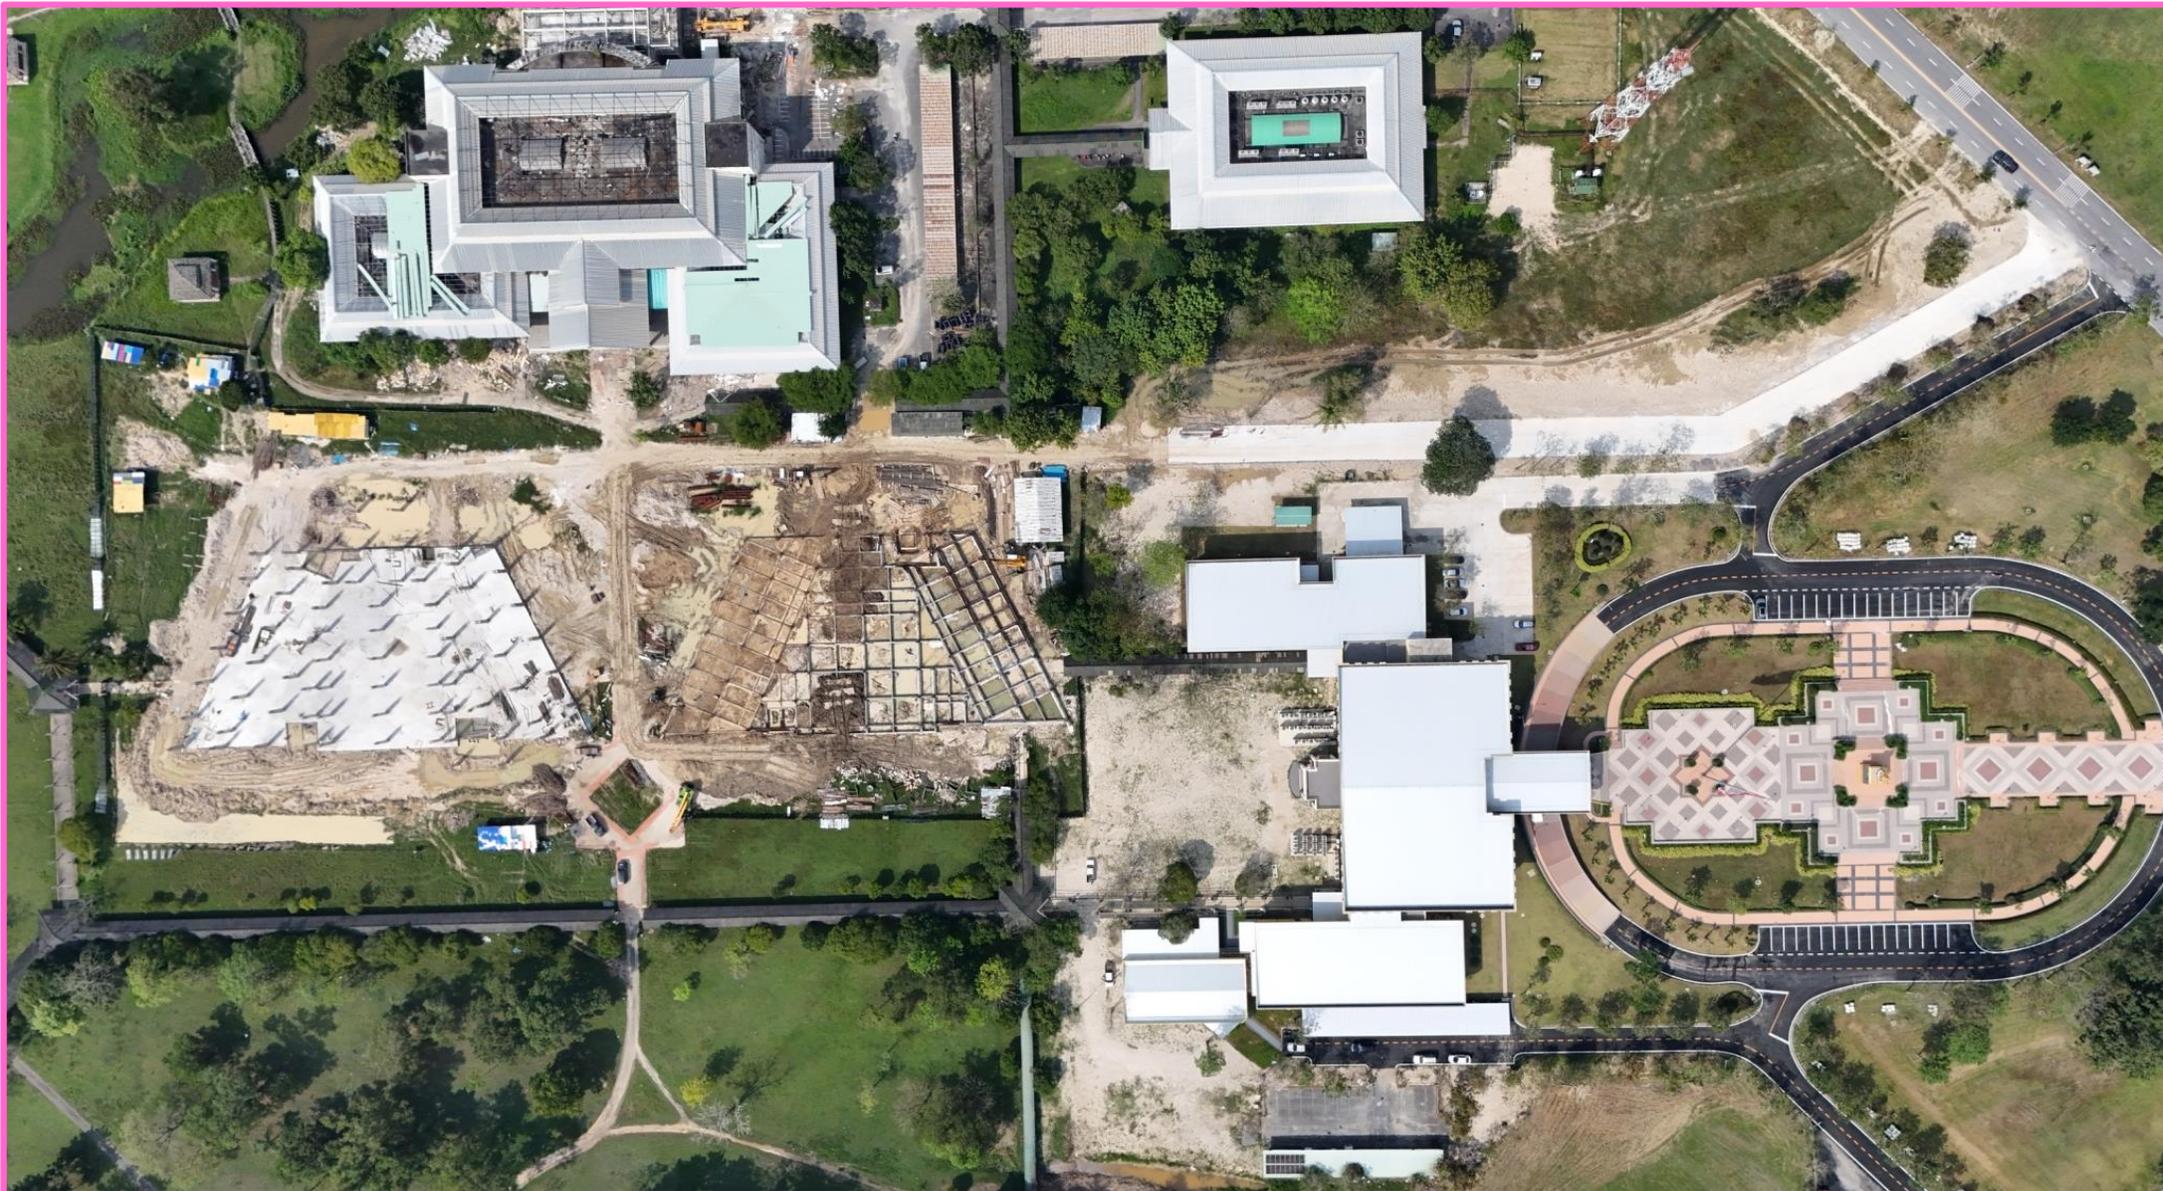



6

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





ความก้าวหน้างาน

1. งานเทคอนกรีตฐานราก+ตอม่อ แล้วเสร็จ 100 %
2. งานเทคอนกรีตคาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
3. งานผูกเหล็กเสา ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50 %
4. งานวางท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 90 %
5. งานถมดินปรับระดับพื้นภายในเพื่อเป็นห้องแบบ แล้วเสร็จ 50 %
6. งานผูกเหล็กพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จ 20 %
7. งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 1 แล้วเสร็จ 10 %

6


โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี




ความก้าวหน้างาน


งานเทคอนกรีตถนนเข้าโครงการ แล้วเสร็จ 65 %

หมายเหตุ งานงวดที่ 5 ส่งงานกลางเดือน ก.พ. 68 (24 %)

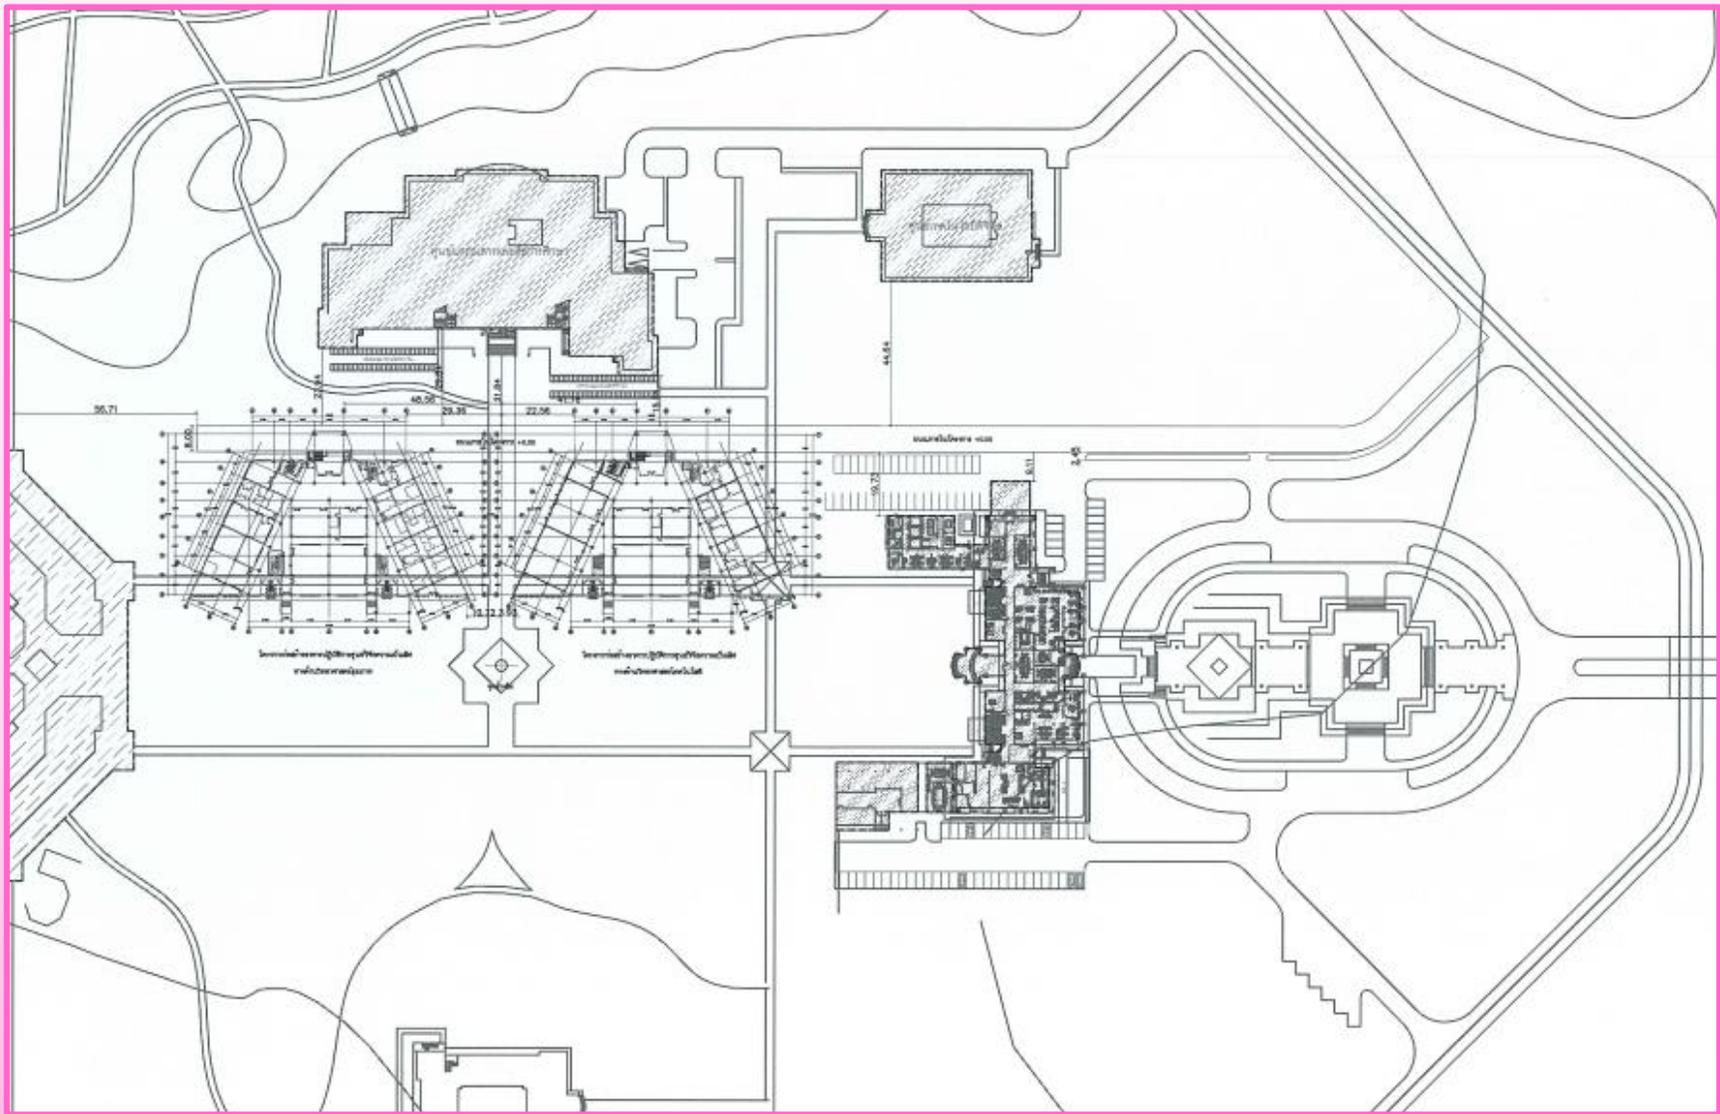

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

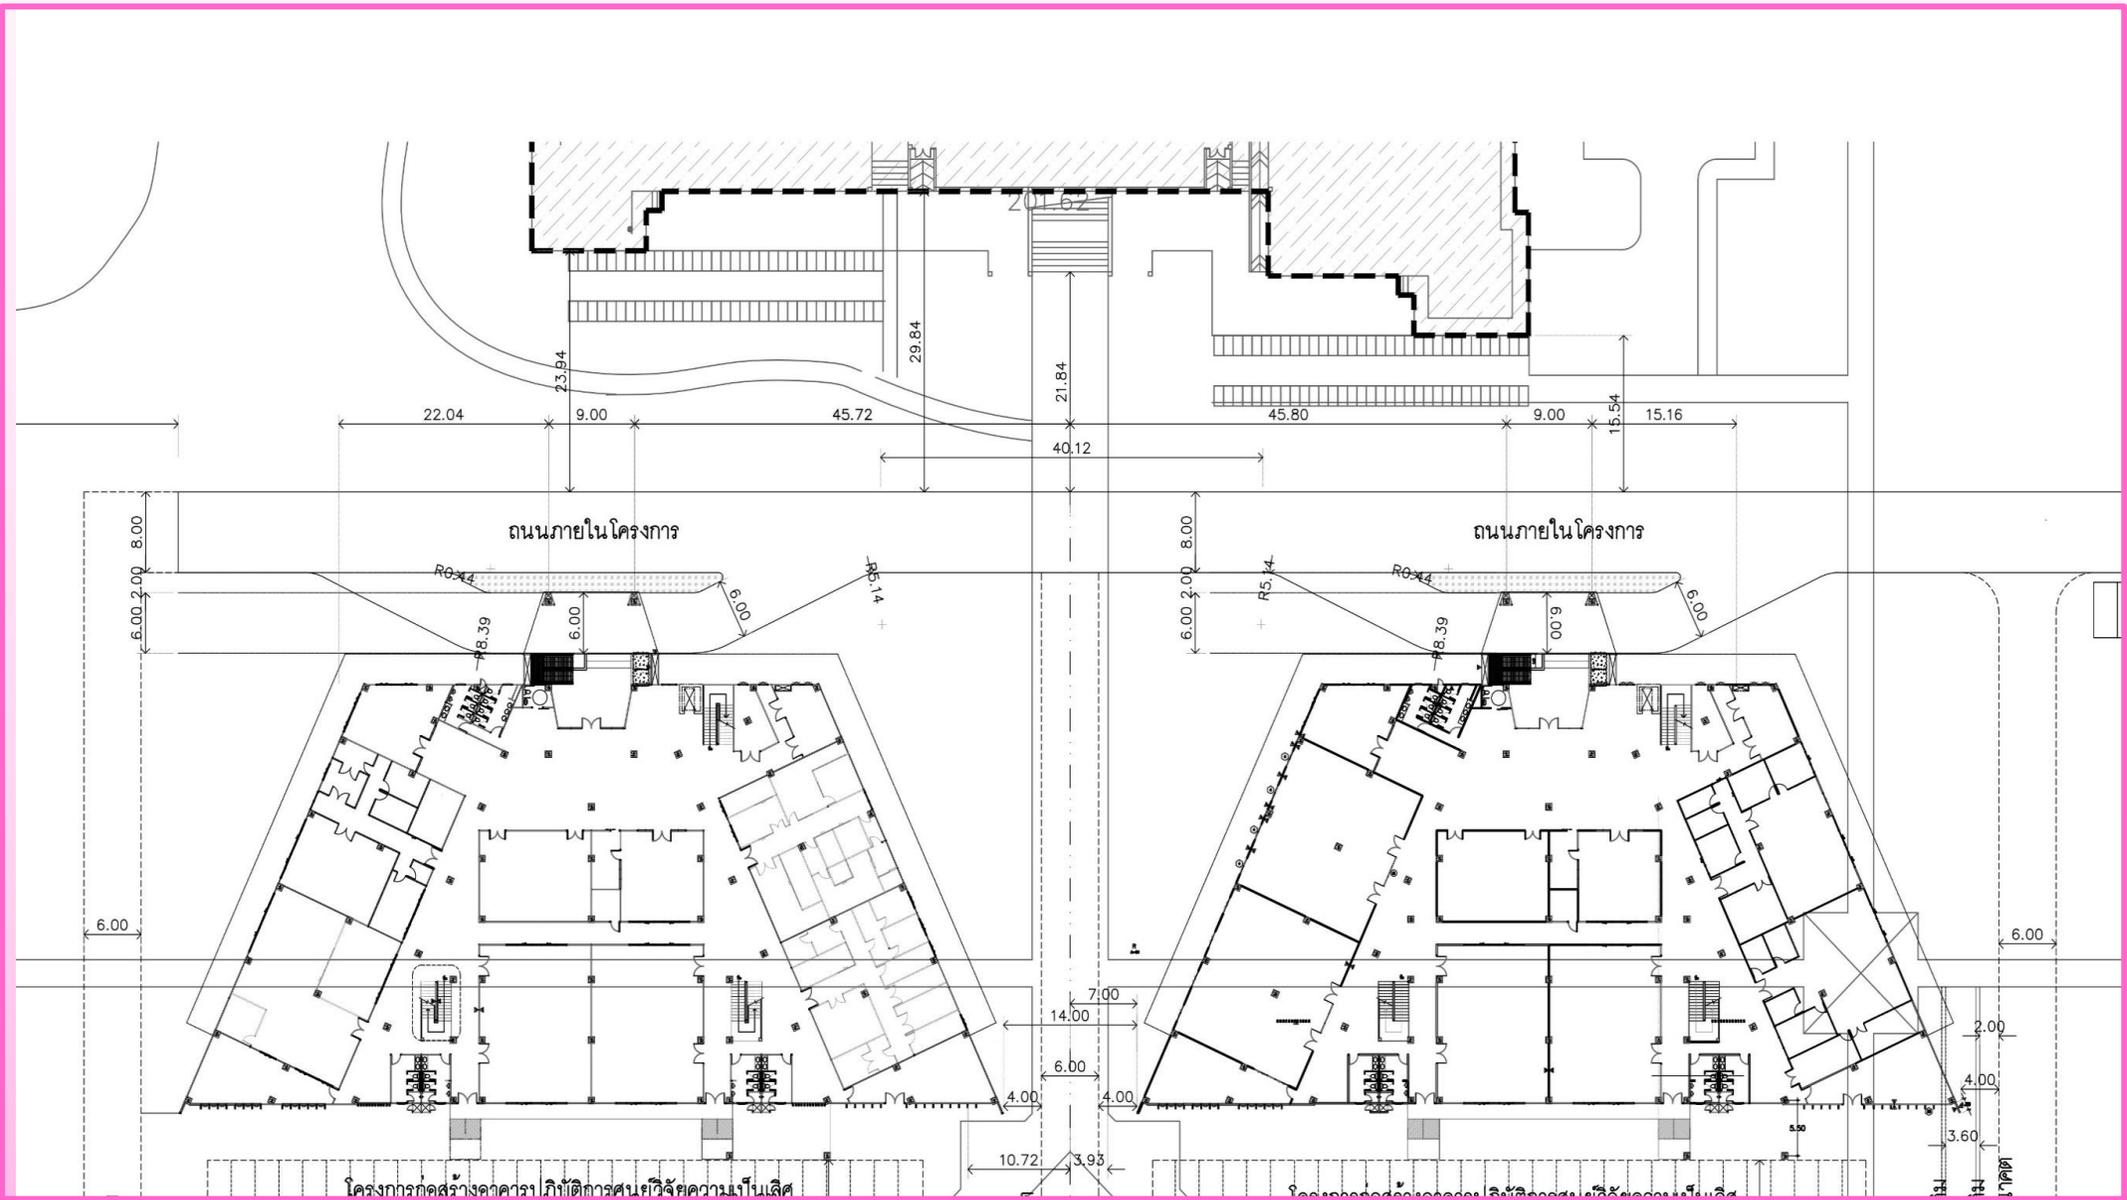


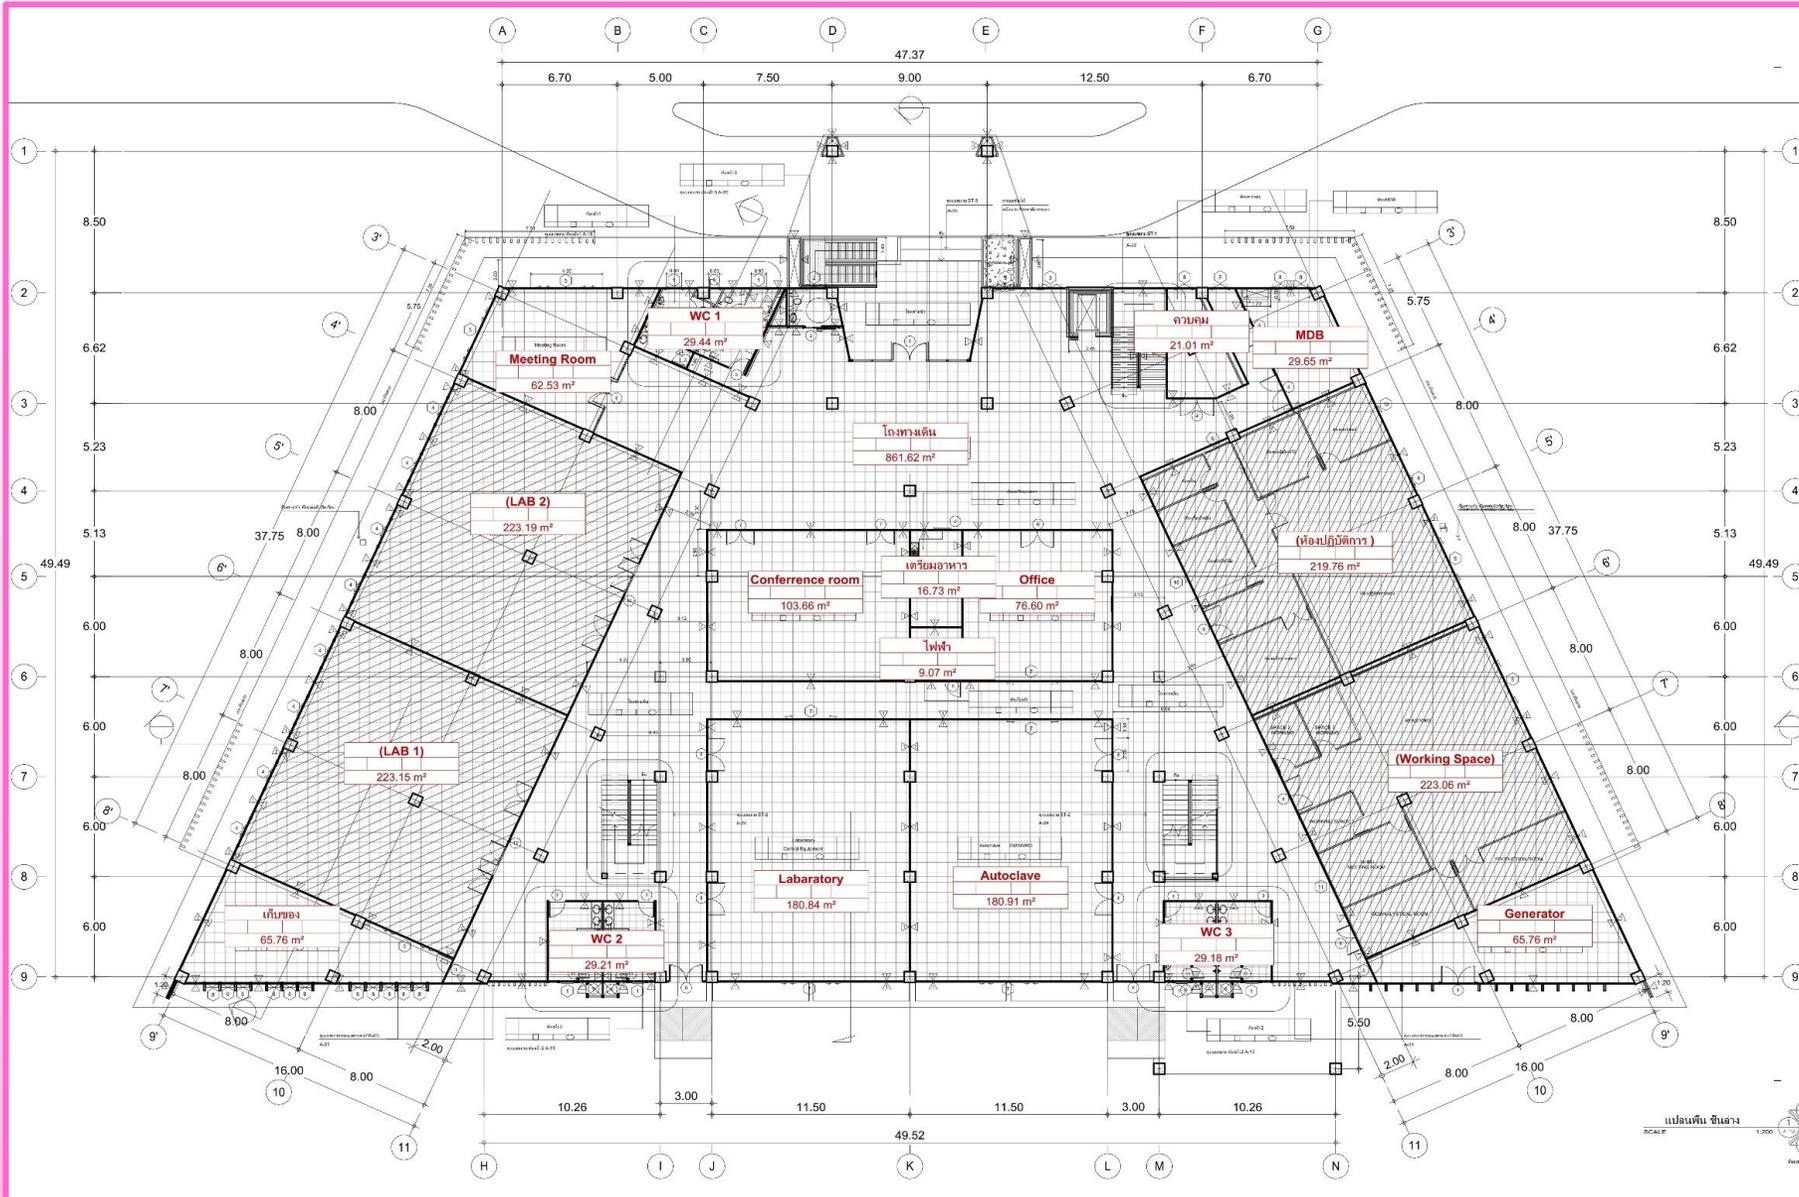

ชั้น 1 พื้นที่ 2300 ตร.ม.

พื้นที่ทางเดิน+LAB กระเบื้อง 60*60
 สำนักงาน +ประชุม กระเบื้องยางลายไม้ทางเข้า แกรนิต
 ไฟฟ้าเดิน ทางเดิน 3.8 ม. ห้อง 3.5 ม.

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

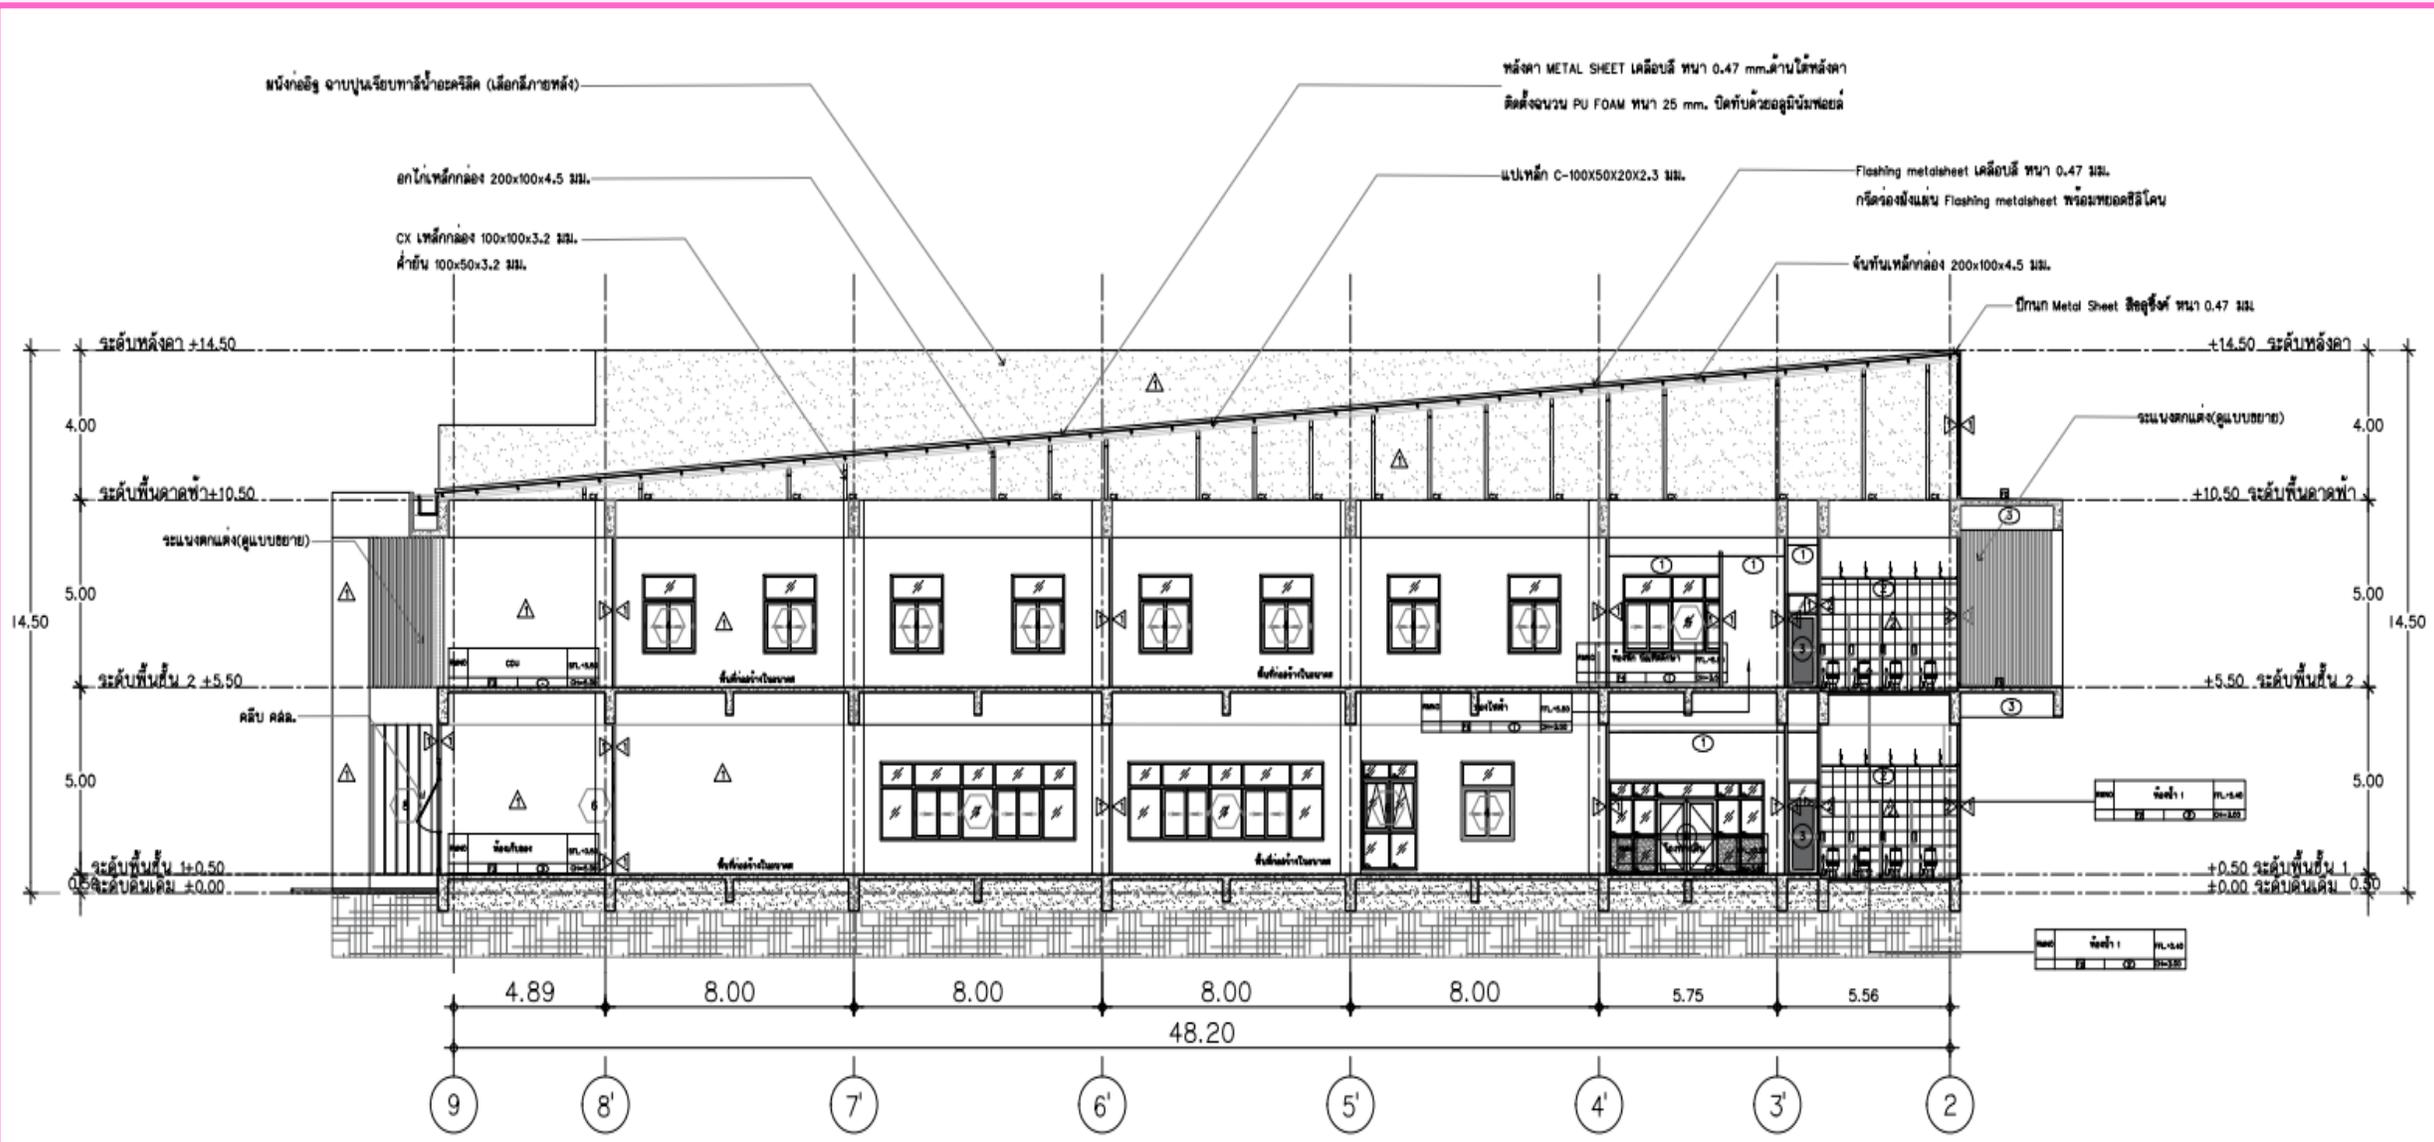





โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท ชุมพร คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
087/2567 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 67
79,680,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




26 มิ.ย. 67 – 30 ก.ค. 68 (400 วัน)
213 วัน (53.25%)
187 วัน (46.75%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



26.25 %
5/12 งวด
50 คน

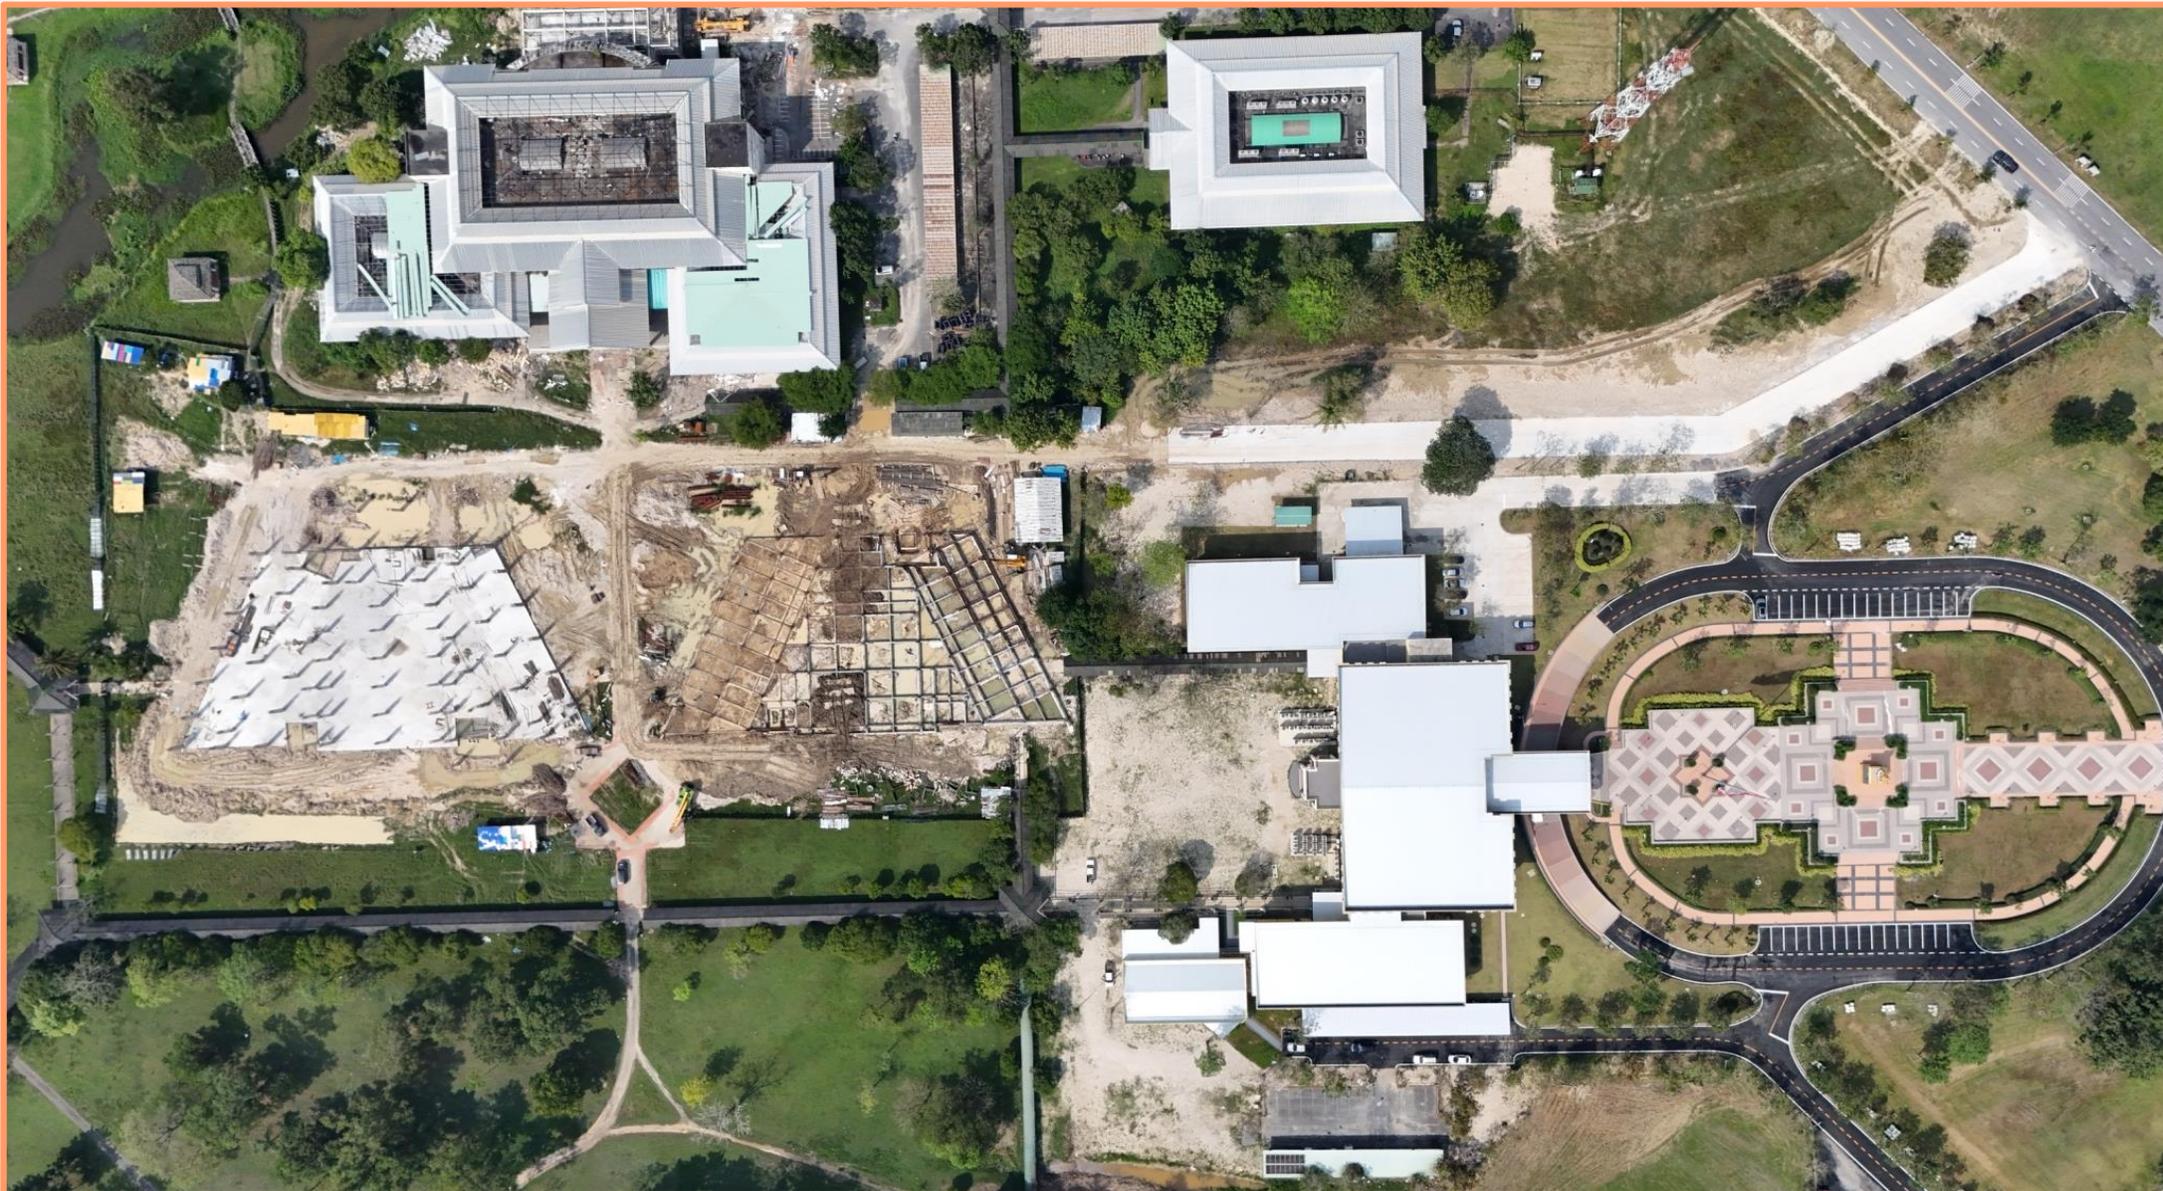



เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระหว่างเดือน






ความก้าวหน้างาน

1. งานเทคอนกรีตฐานราก+ตอม่อ แล้วเสร็จ 100 %
2. งานเทคอนกรีตคาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
3. งานวางท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 90 %
4. งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
5. งานเทคอนกรีตเสา ชั้น 1 แล้วเสร็จ 97 %
6. งานตั้งนั่งร้านรับคาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 60 %




โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

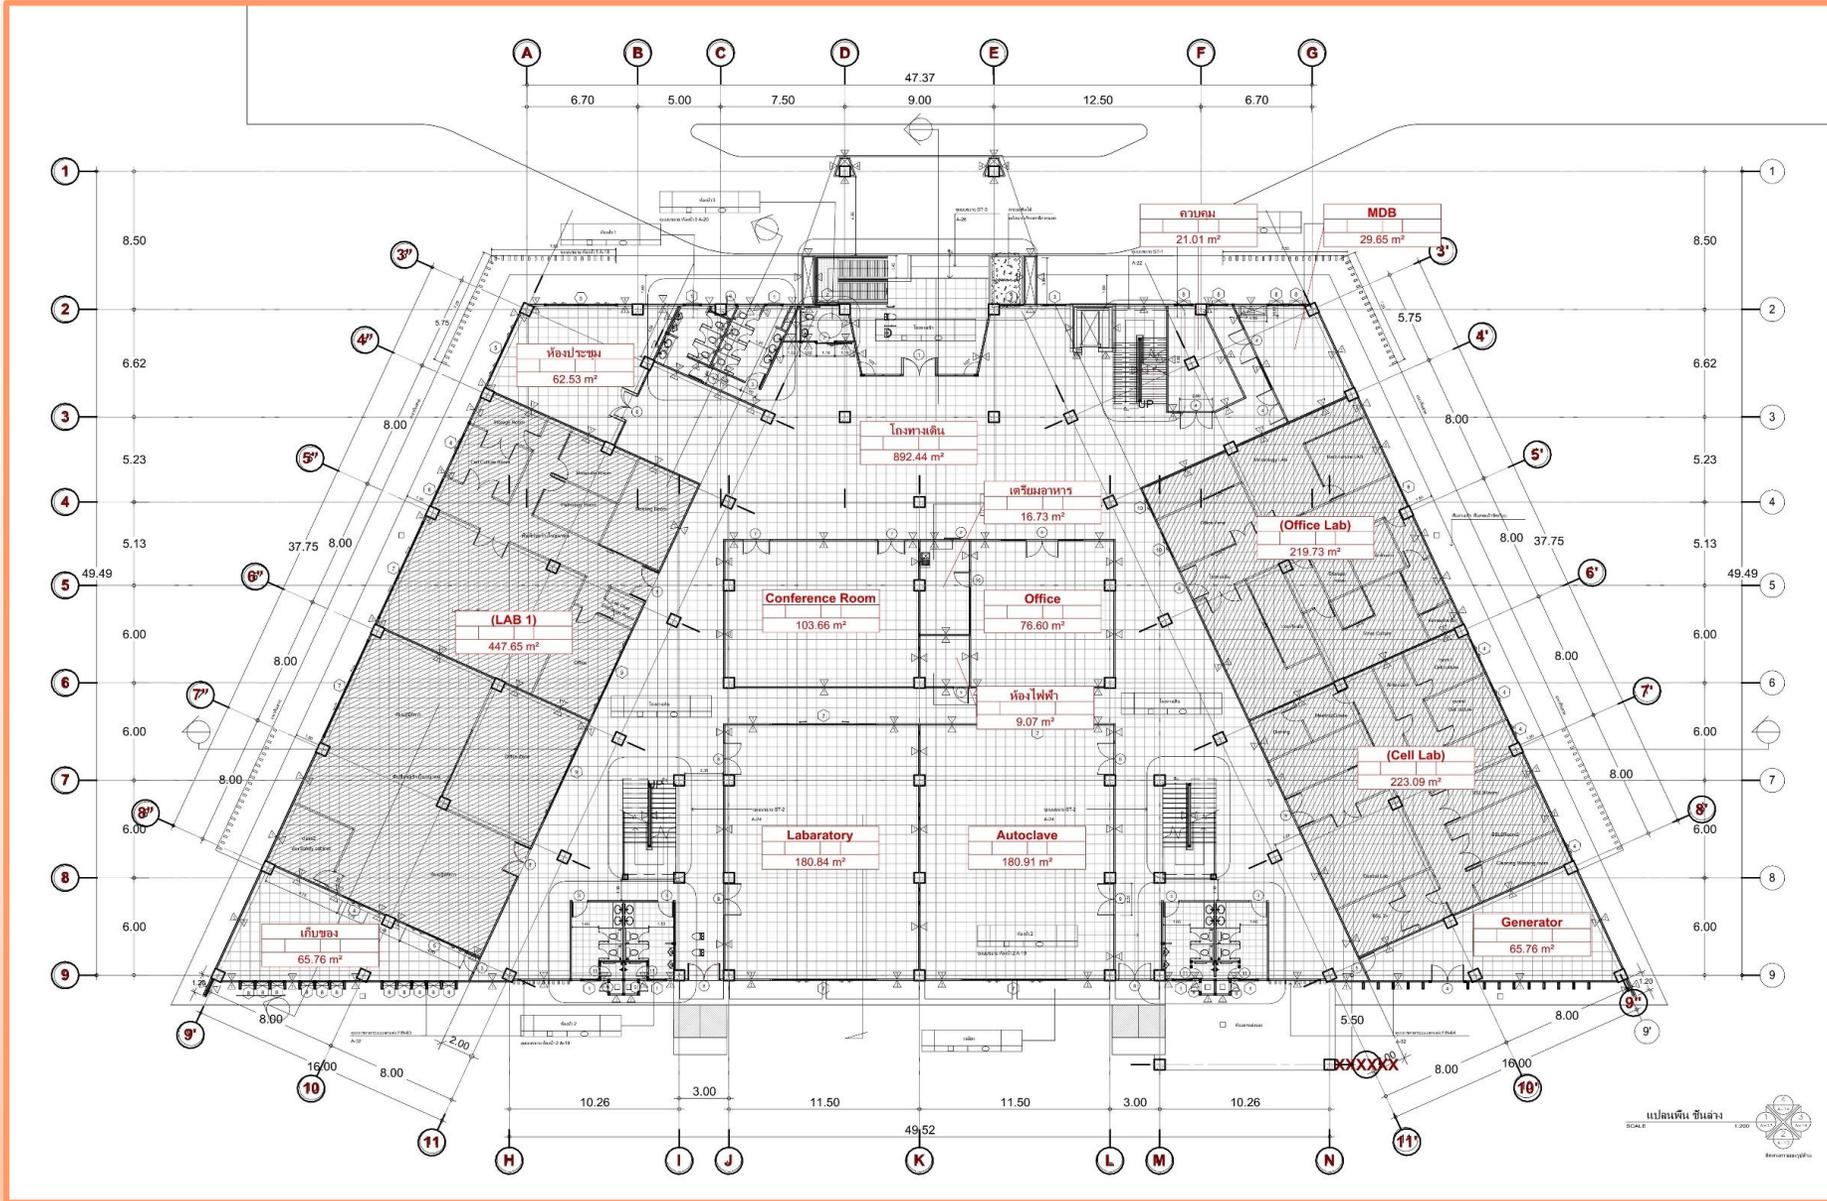



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

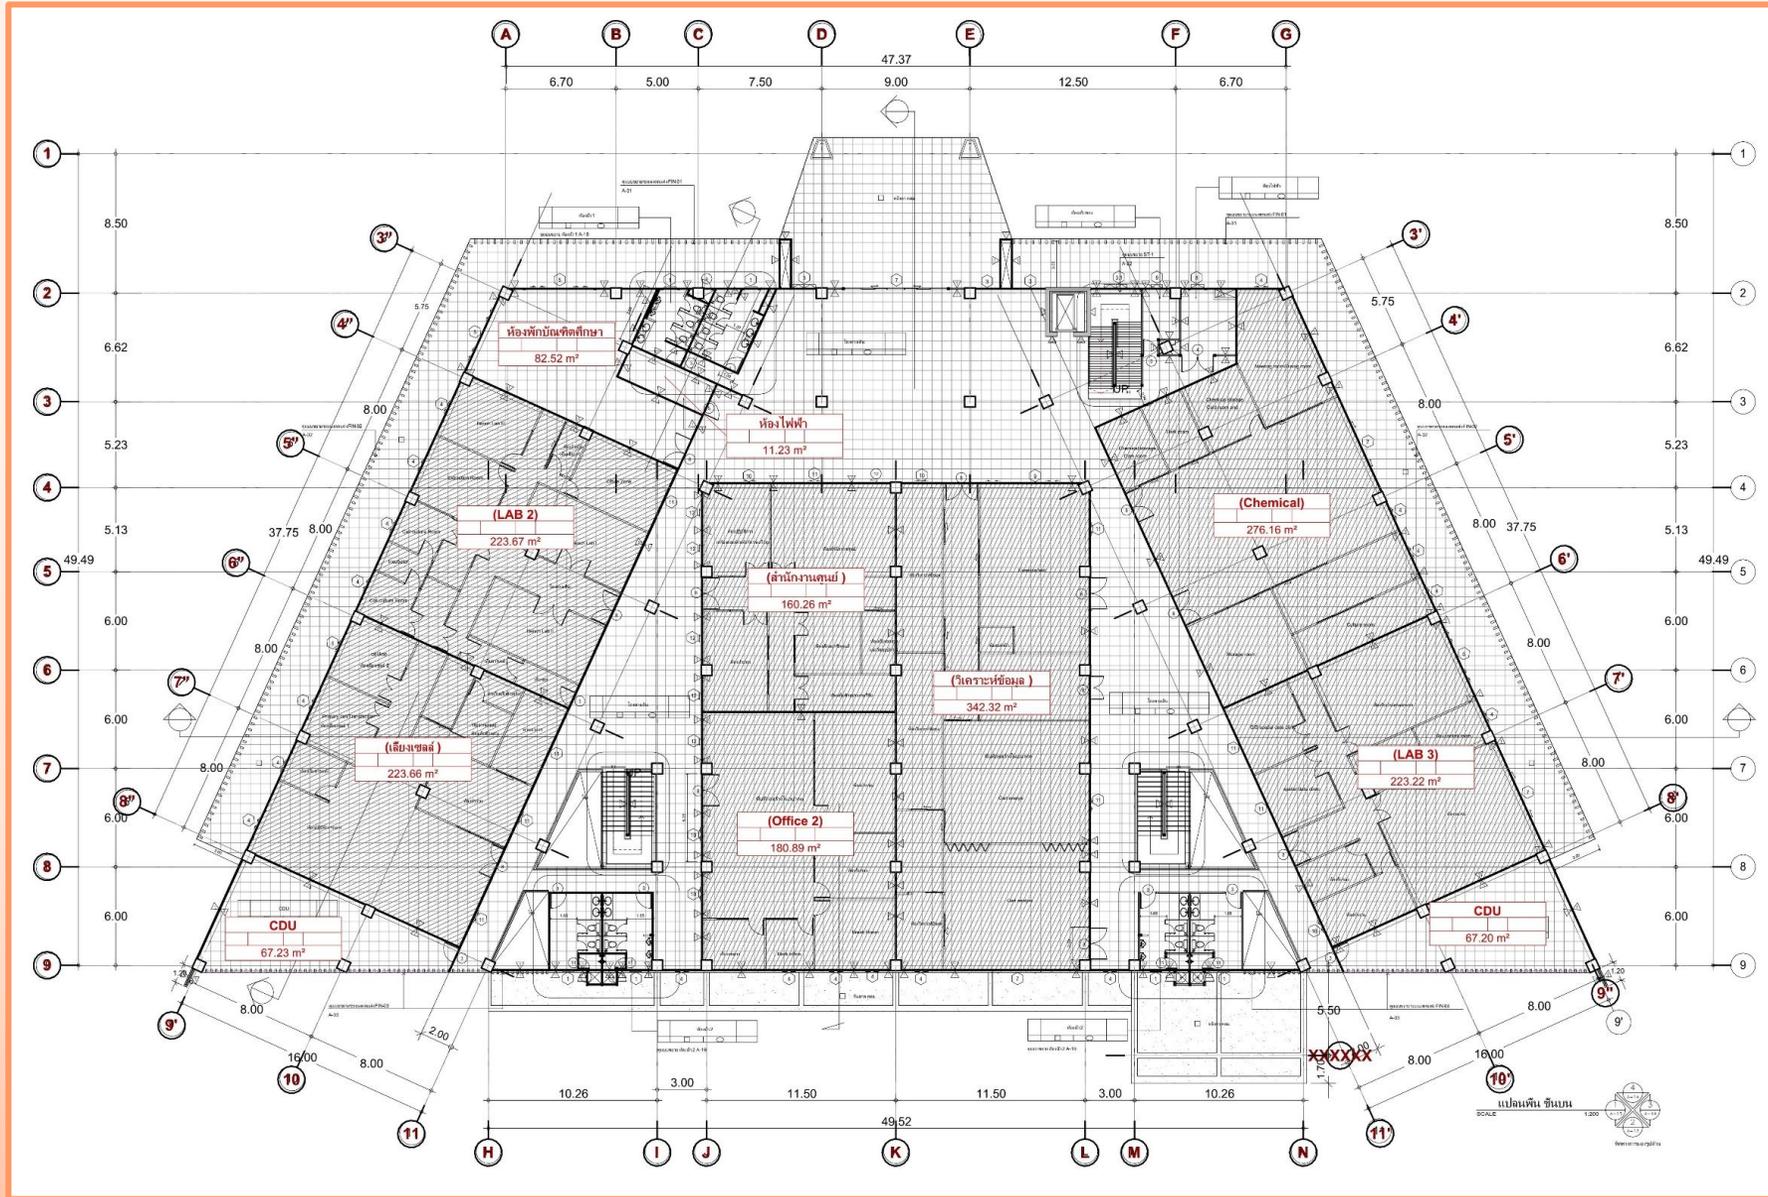







8

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด
145/2567 ลงวันที่ 16 ส.ค. 67
61,200,00.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



17 ส.ค. 67 – 20 ก.ย. 68 (400 วัน)
161 วัน (40.25%)
239 วัน (59.75%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



16.61 %
3/12 งวด
30 คน








โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน

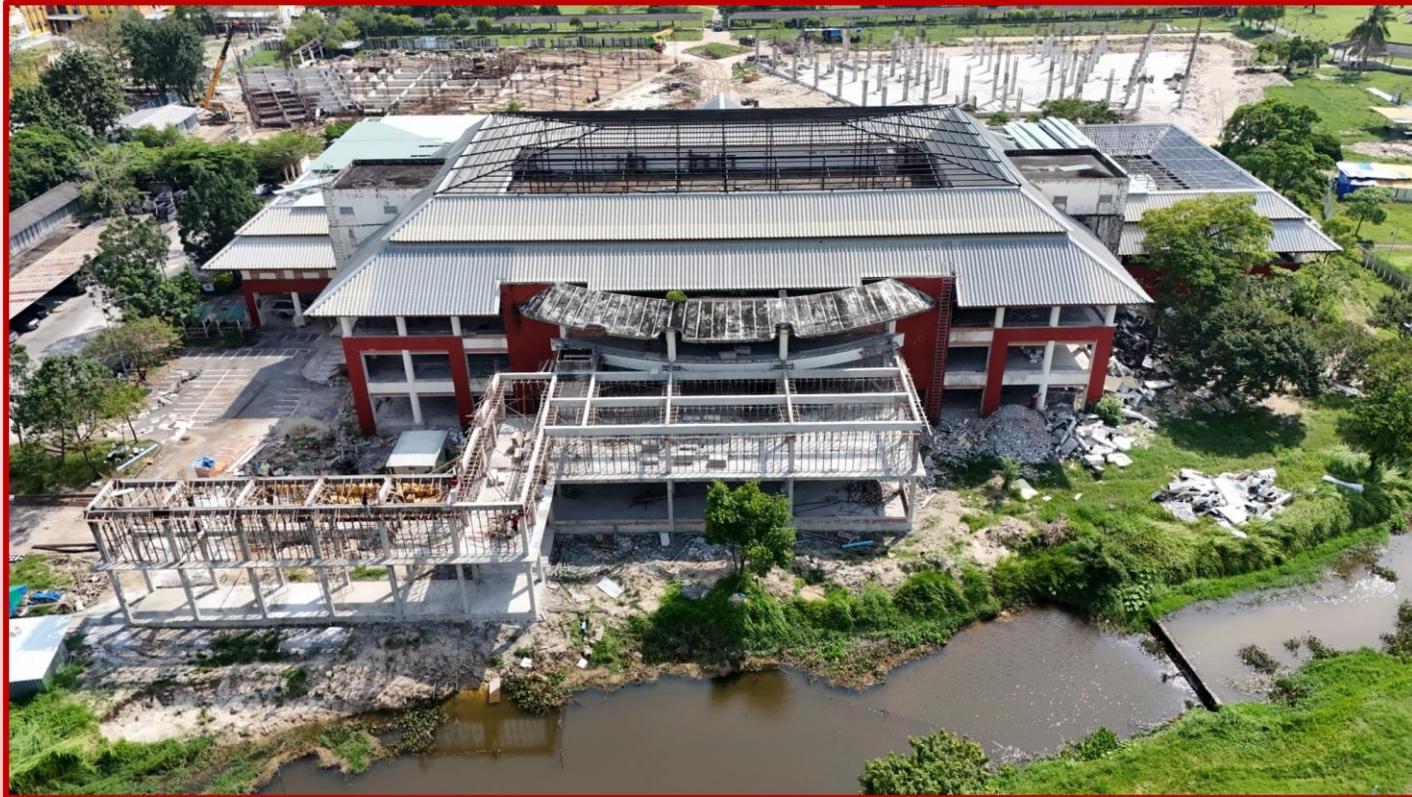



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา


เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





7

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน

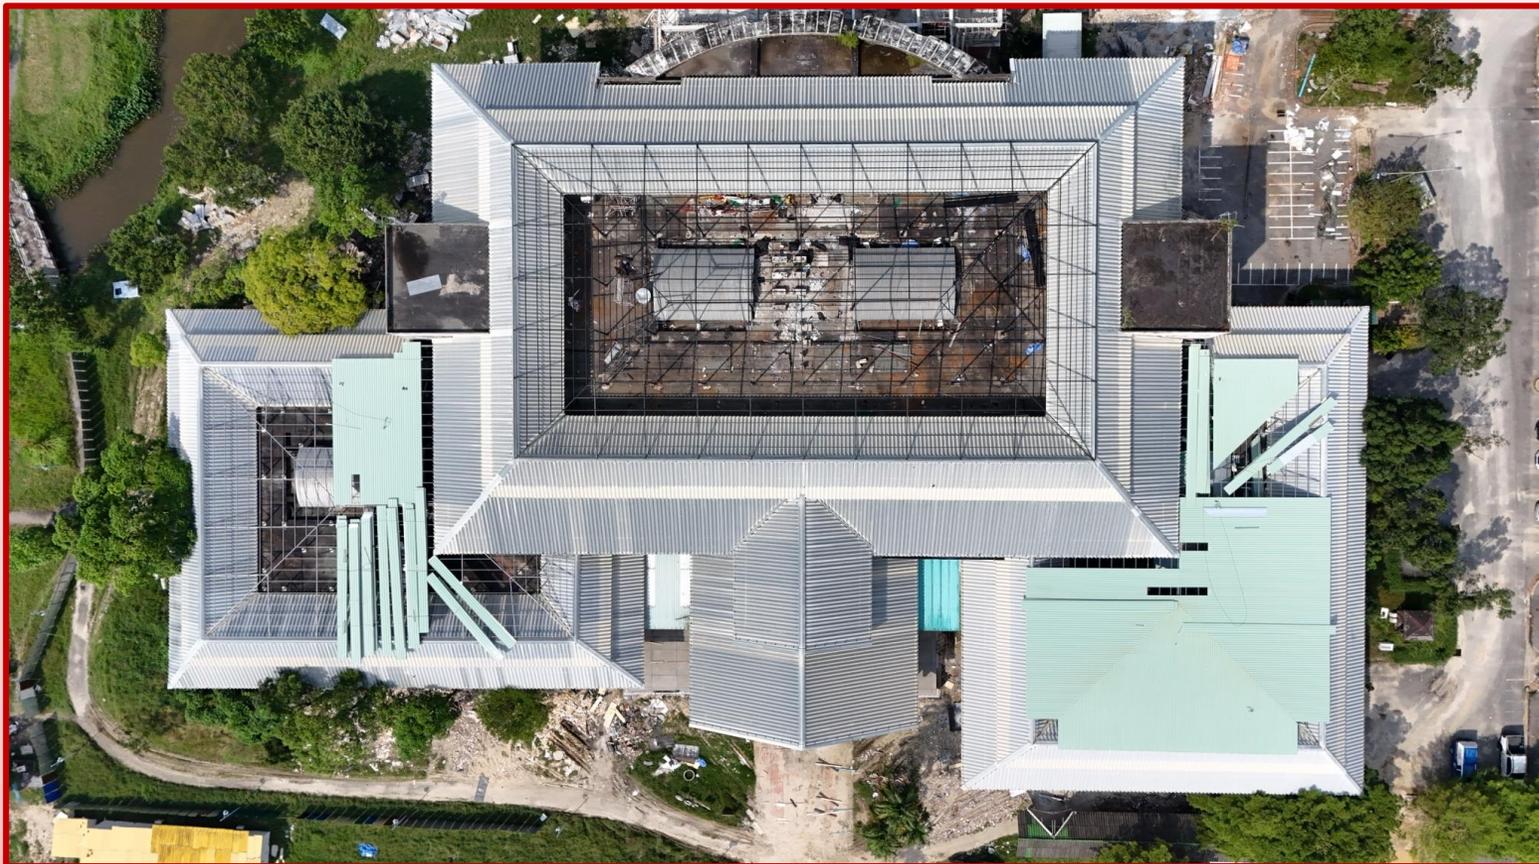

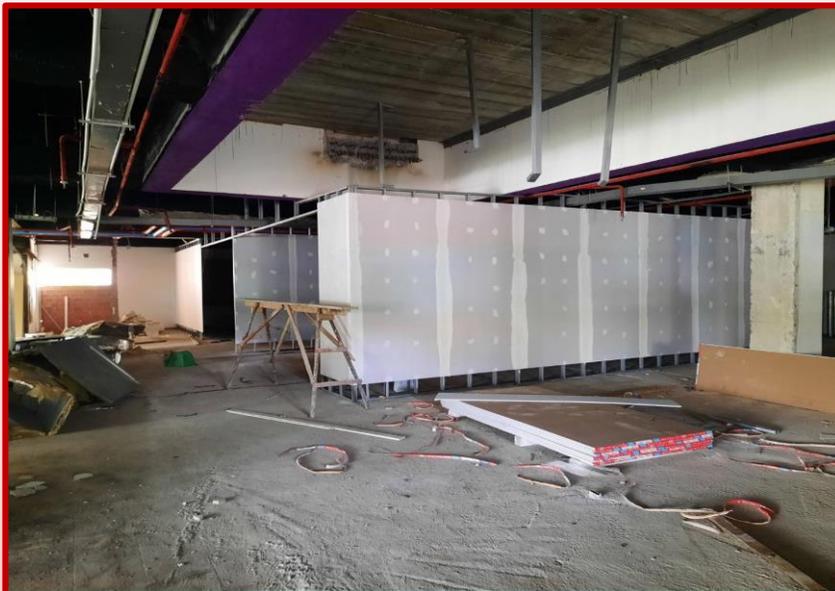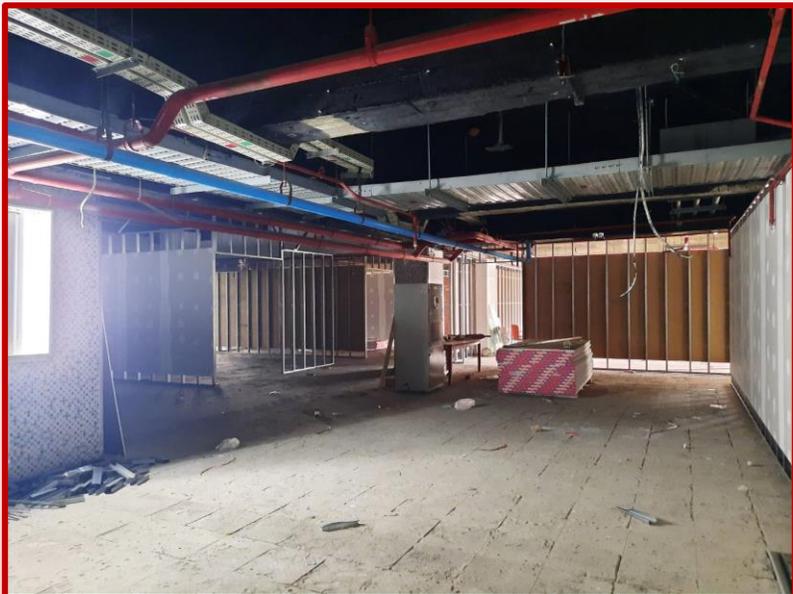

ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 1

1. งานรื้อถอน //แล้วเสร็จ 95 %
2. งานผนังก่ออิฐ //แล้วเสร็จ 100 %
3. งานฉาบปูนผนัง //แล้วเสร็จ 50 %
4. งานผนังเบา //แล้วเสร็จ 30 %
5. งานสทิมท้องพื้นฟ้าเพดานชั้น 1 //แล้วเสร็จ 100 %
6. งานจัดทำโครงสร้างเพิ่มเติมพื้นที่ชั้น 1 //แล้วเสร็จ 100%



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา





ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 2

1. งานรื้อถอน //แล้วเสร็จ 95 %
2. งานก่ออิฐฉาบผนัง //แล้วเสร็จ 100 %
3. งานฉาบผนัง //แล้วเสร็จ 50 %
4. งานจัดทำโครงสร้างเพิ่มเติมพื้นที่ชั้น 2 //แล้วเสร็จ 100%




โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

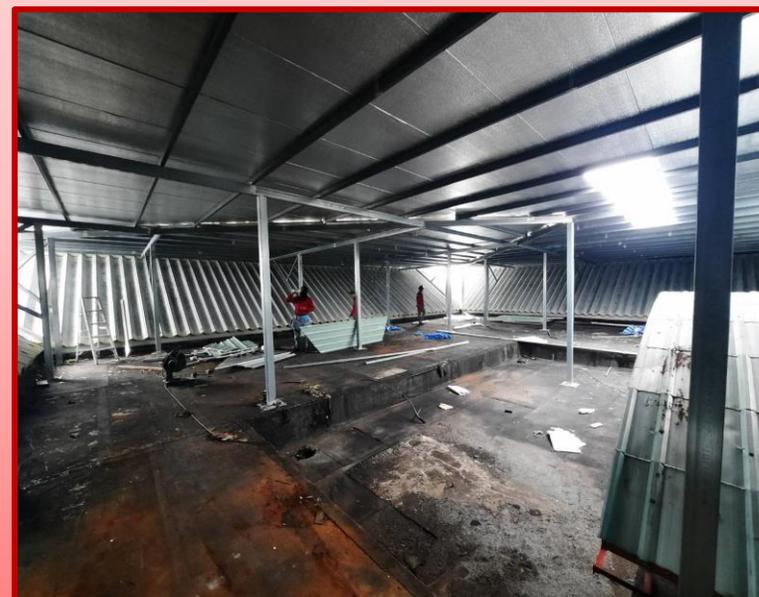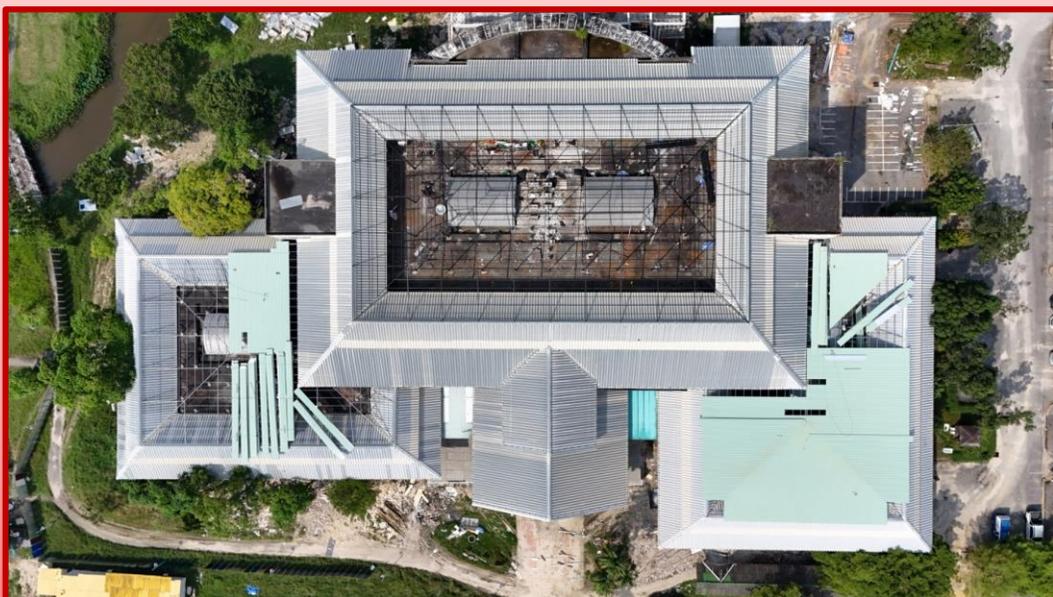

ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 3


1. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 95 %
2. งานก่ออิฐปูนัง แล้วเสร็จ 100 %
3. งานฉาบปูนัง แล้วเสร็จ 50 %
4. งานจัดทำโครงสร้างเพิ่มเติมพื้นที่ชั้น 3 แล้วเสร็จ 80%
5. งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ 100 %
6. งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ 80 %

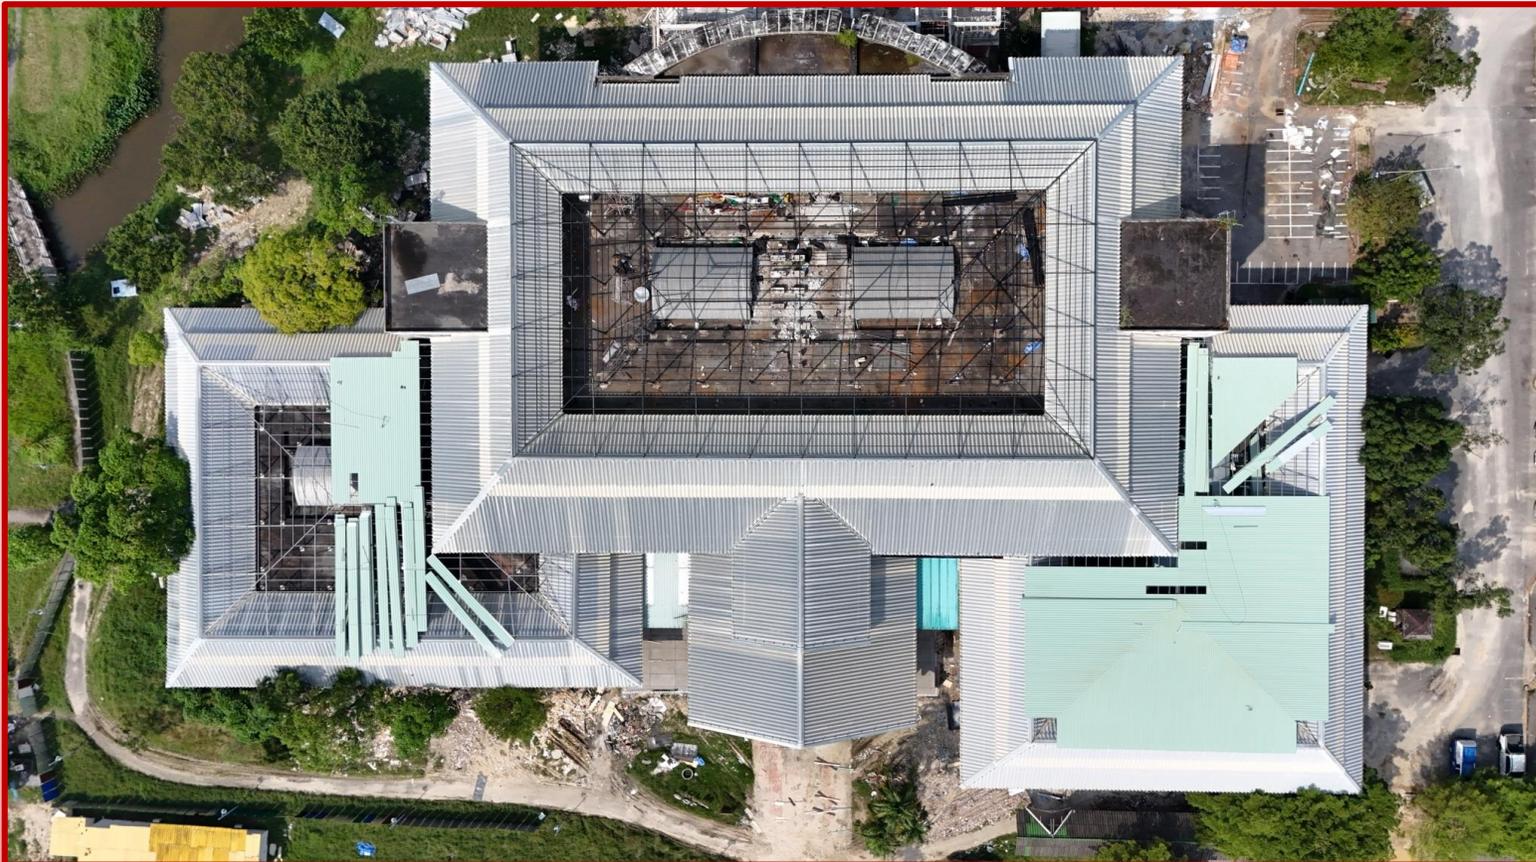

ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 4

1. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 95 %
2. งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ 95 %

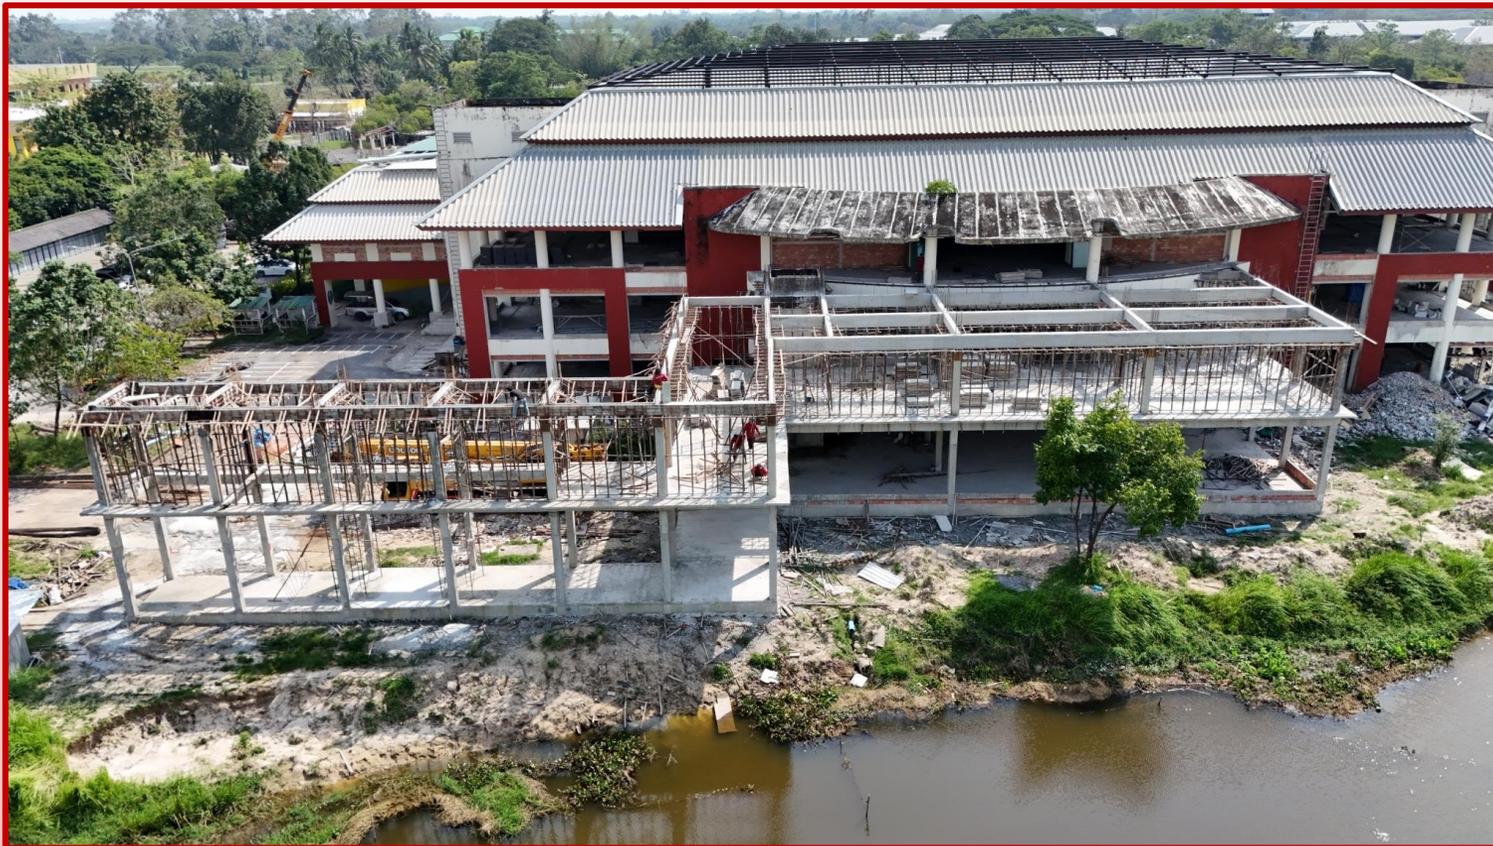

ความก้าวหน้างาน

งานก่อสร้างส่วนต่อเติมด้านทิศเหนือ

1. งานเทคอนกรีตฐานราก+เสาตอม่อ //แล้วเสร็จ 100 %
2. วางท่อระบบกำจัดปลวก //แล้วเสร็จ 90 %
3. งานเทคอนกรีต คาน+ พื้น+เสา ชั้น 1+2 //แล้วเสร็จ 100 %
4. งานเทคอนกรีต คาน ชั้น 3 //แล้วเสร็จ 100 %
5. งานผนังก่ออิฐ ชั้น 1 //แล้วเสร็จ 20 %


งานงวดที่ 4 พูรับจ้างส่งแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ

อาคาร 10*25 บันได 3.5*25


- พื้นที่ก่อสร้างใหม่
- พื้นที่อ่านหนังสือ-กิจกรรม
- พื้นที่นิทรรศการ
- พื้นที่สำนักงาน-ประชุม
- พื้นที่ห้องน้ำ
- พื้นที่ทางเดิน-โถง
- พื้นที่ไม่มีปรับปรุง



- พื้นที่ก่อสร้างใหม่
- พื้นที่อ่านหนังสือ-กิจกรรม
- พื้นที่นิทรรศการ
- พื้นที่สำนักงาน-ประชุม
- พื้นที่ห้องน้ำ
- พื้นที่ทางเดิน-โถง
- พื้นที่ไม่มีปรับปรุง

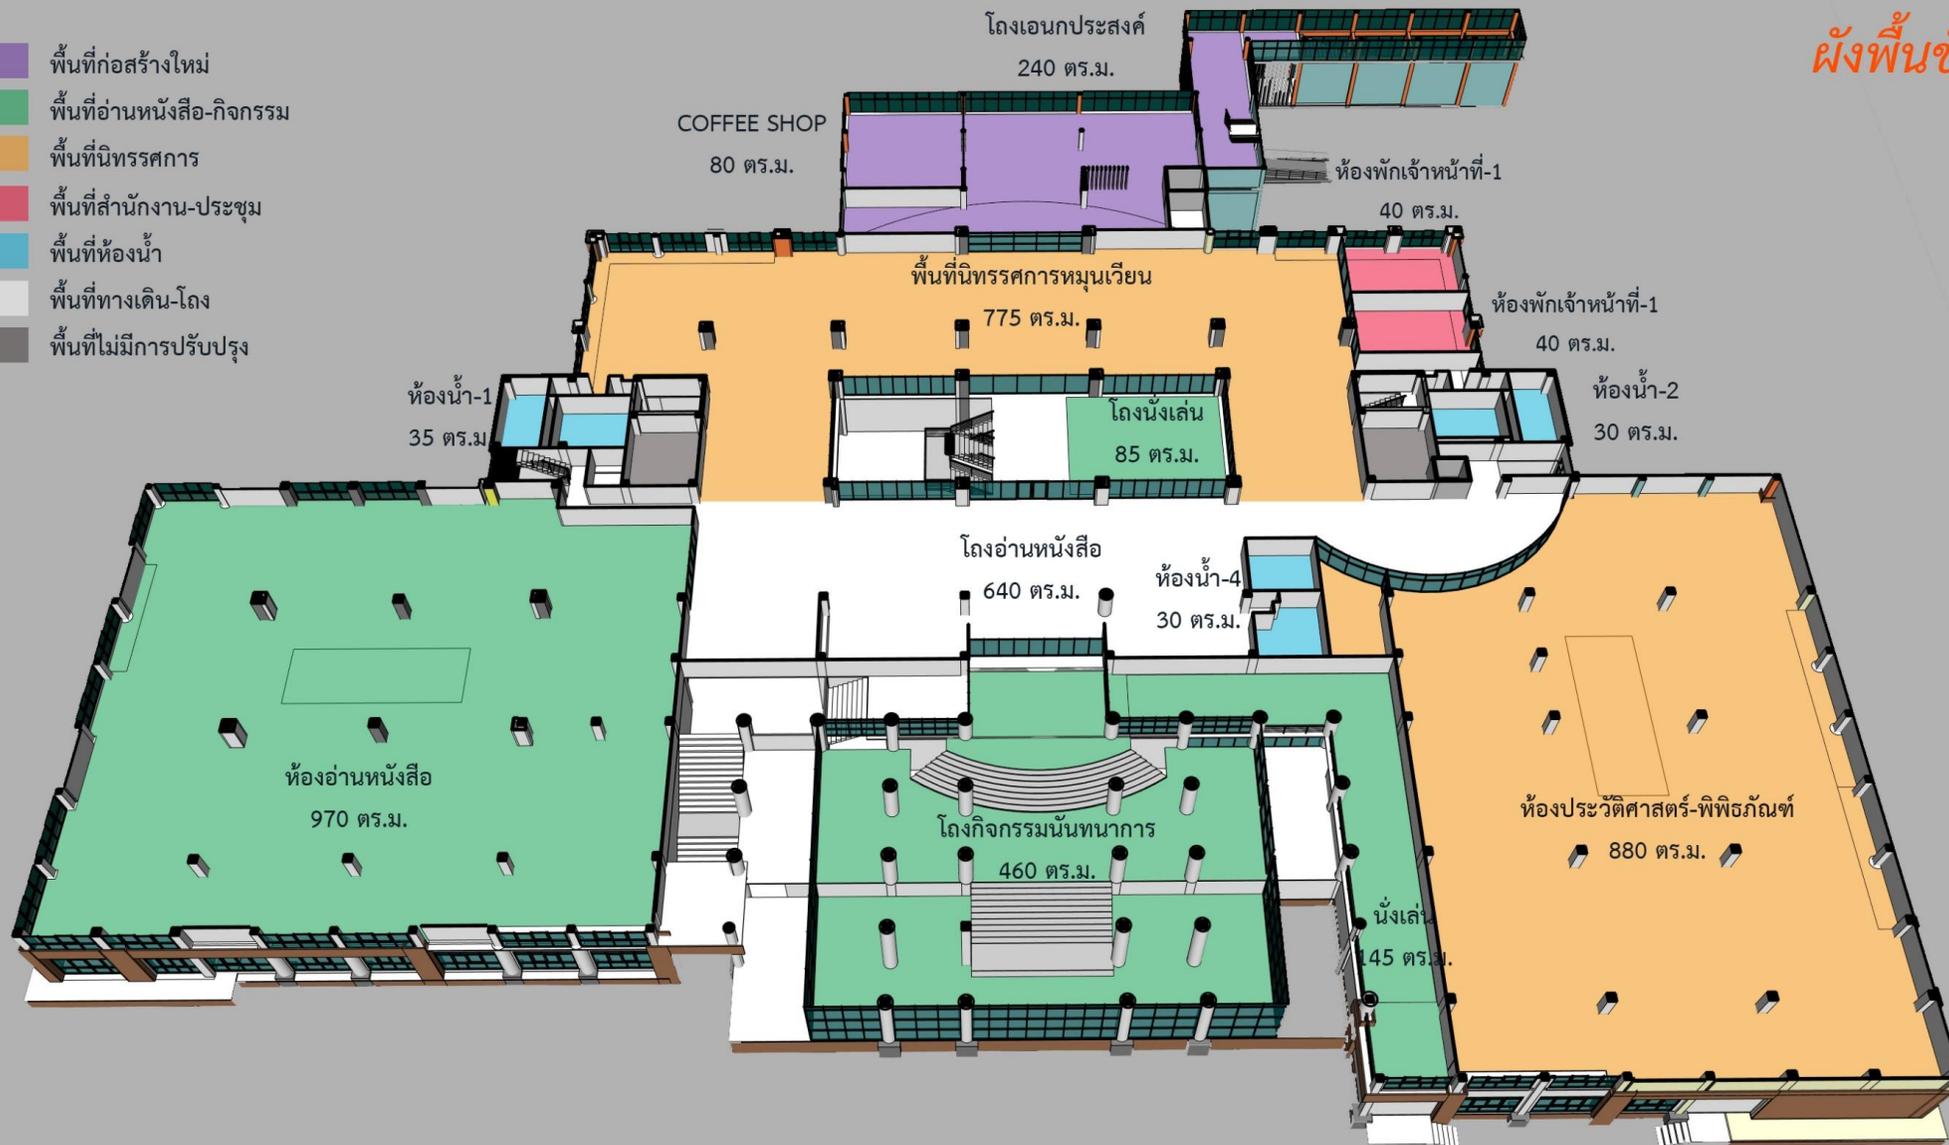

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

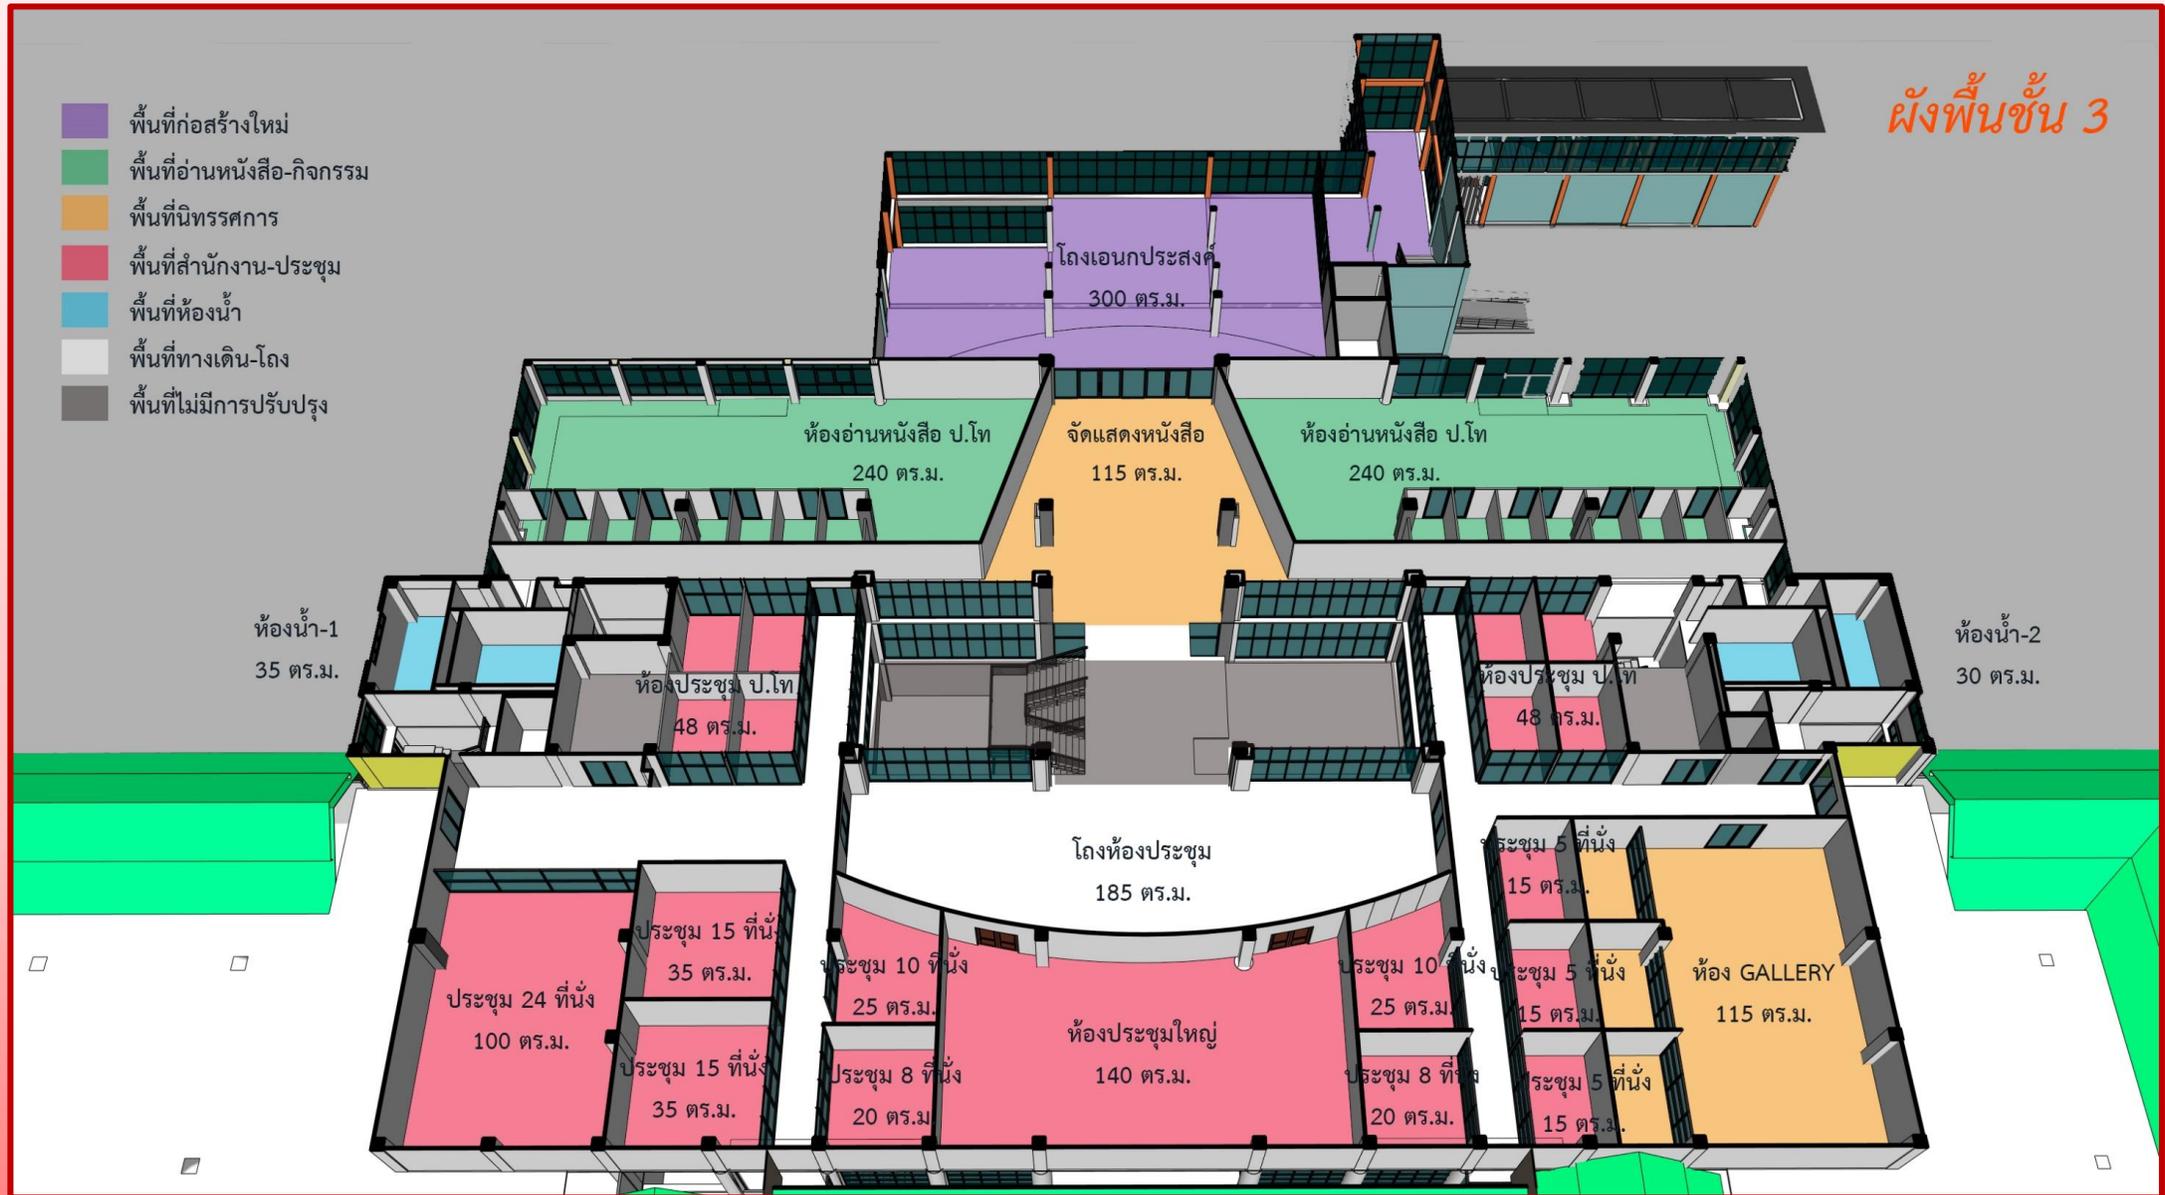



9


โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		บริษัท ซี.ซี.จัทกรกลและก่อสร้าง จำกัด 148/2567 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 65 21,650,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		23 ส.ค. 67 – 27 พ.ค. 68 (278 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1) 155 วัน (55.75%) 123 วัน (44.25%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		60.00% 0/6 งวด 28 คน

โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด



- พื้นที่ปรับปรุงถนน 6000 เมตร
- ถนนกว้าง 7 เมตร
- ไหล่ทาง 2.5 เมตร
- ซ่อมถนน 7 จุด

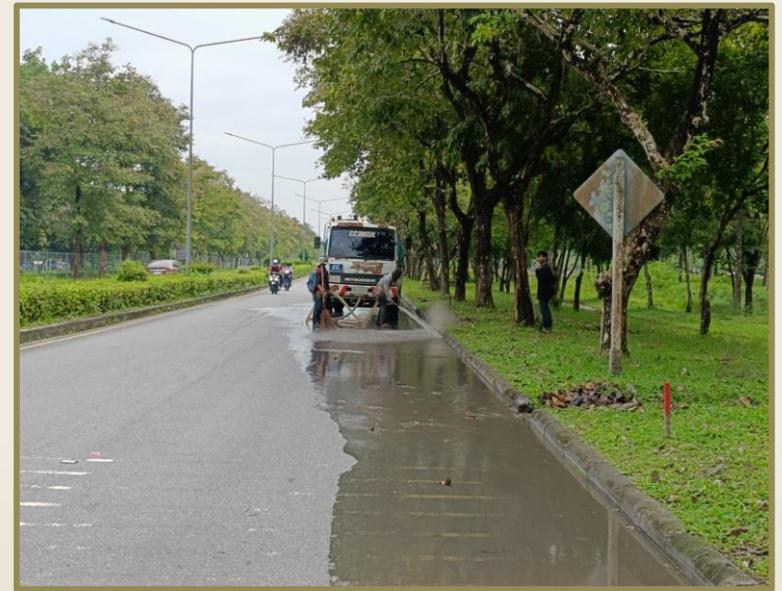














โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด

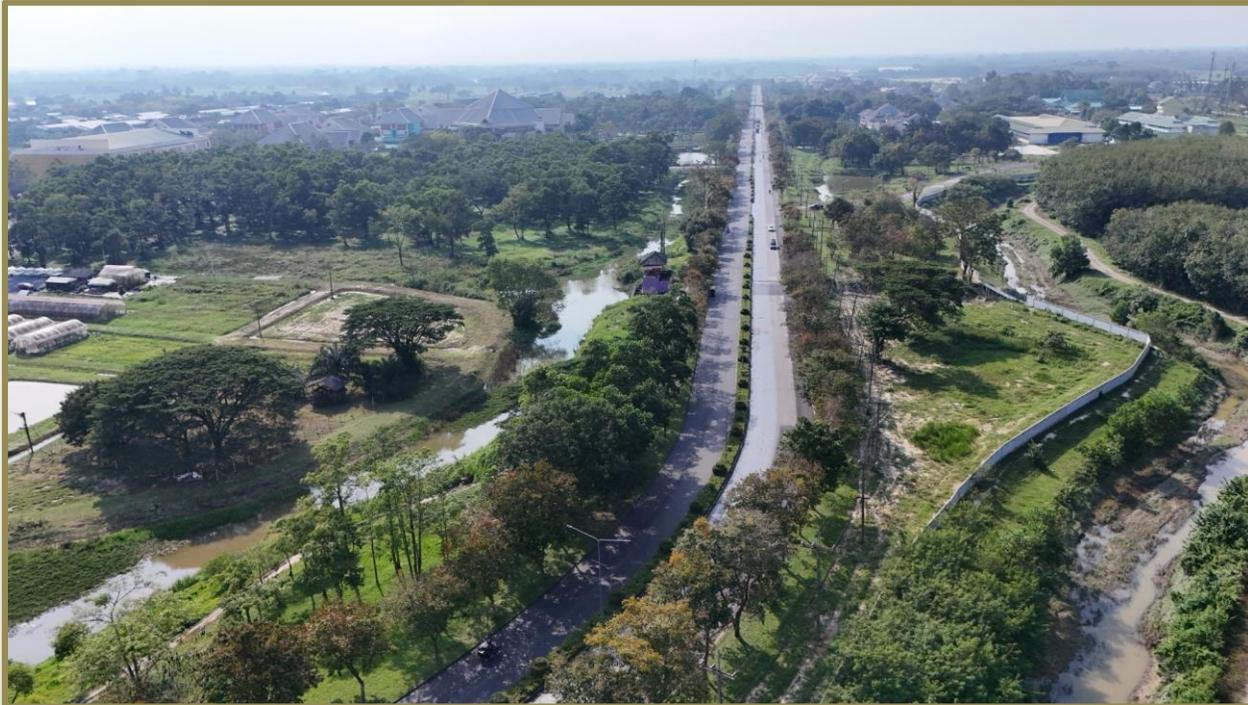



โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด






โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด





โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด

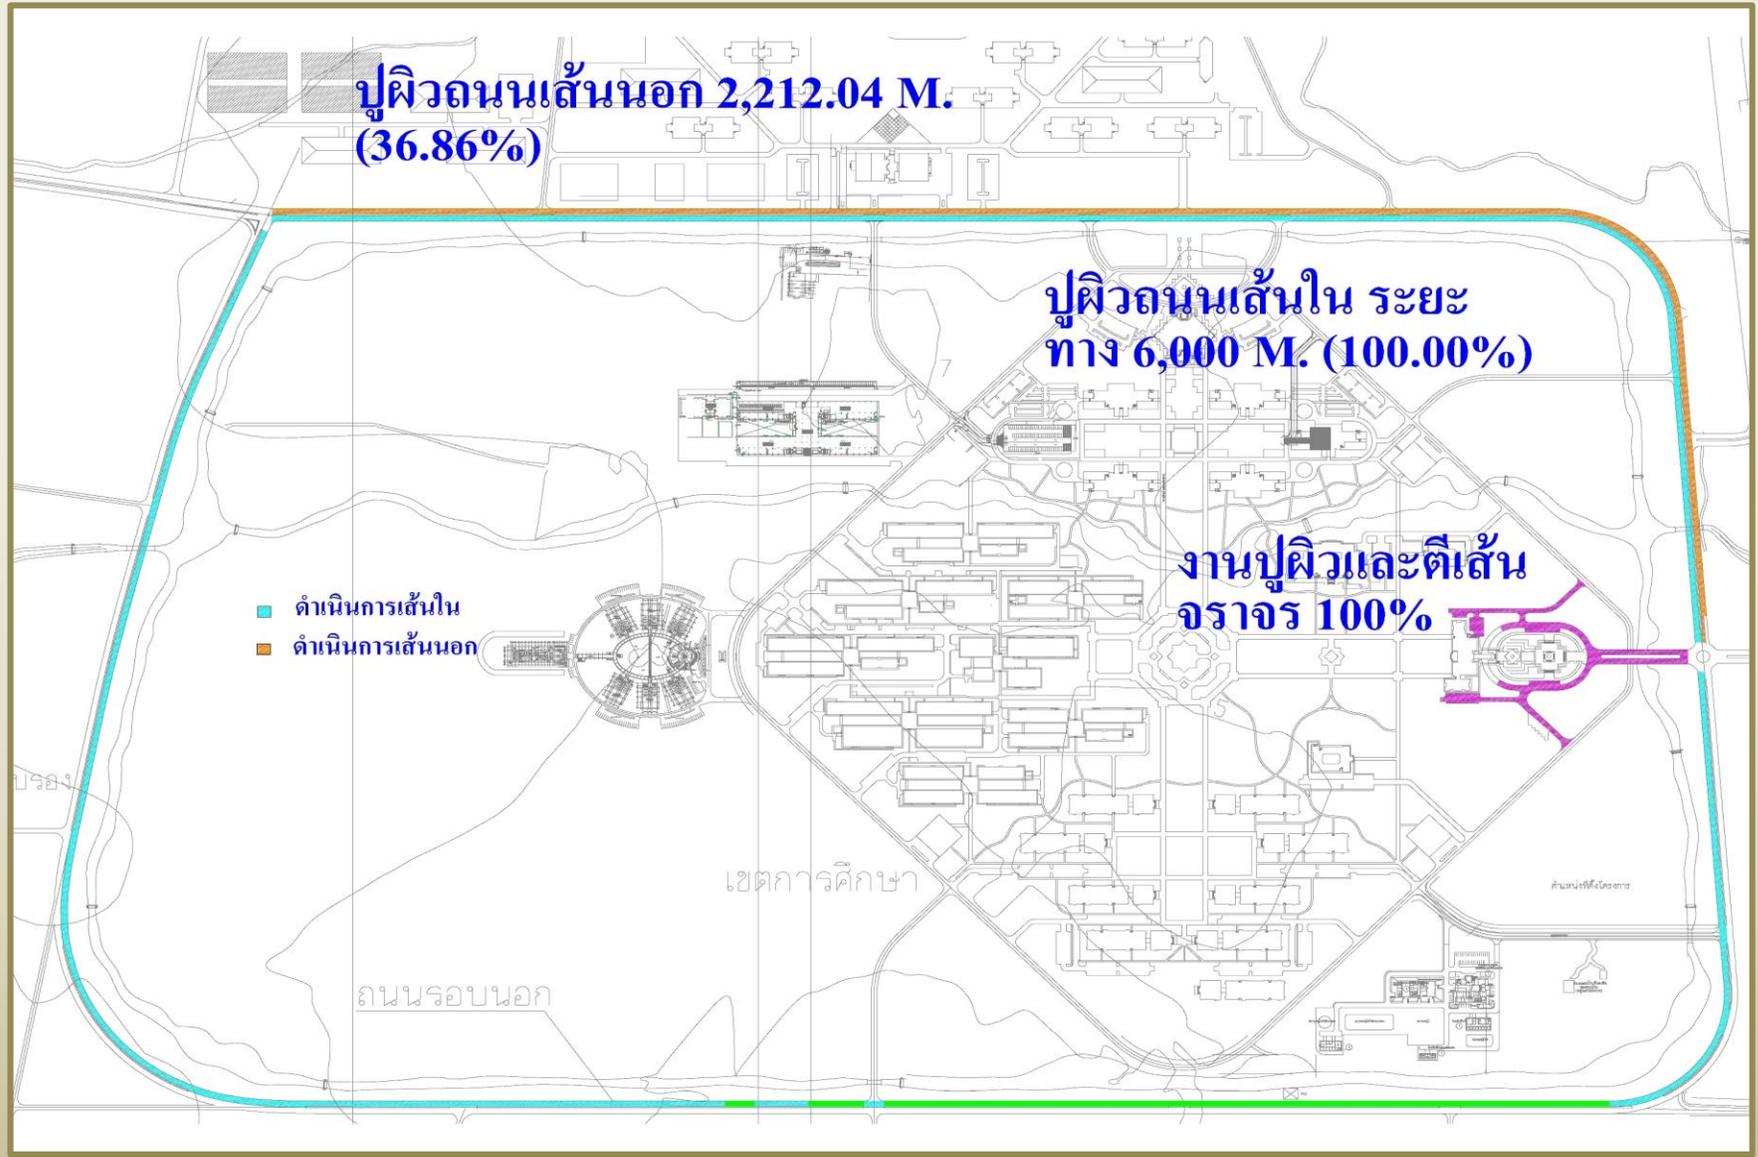

อาคารบริหาร


- ปูผิวถนน และตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ ถนนวงแหวนรอบนอก เส้นใน
- ปูพื้นผิวถนน ความยาว 6,000 ม. แล้วเสร็จ 60 %
- ถนนวงแหวนรอบนอก เส้นนอก
- ปรับพื้นผิวถนน ความยาว 2,212 ม. แล้วเสร็จ 37 %



โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	รถบรรทุกสิบล้อ	8	คัน
2	รถ RECYCLING	1	คัน
3	รถขุดไผ่ (Milling)	1	คัน
4	รถBack Hoe	1	คัน
5	รถเกรดเดอร์	1	คัน
6	รถบดล้อเหล็ก	1	คัน
7	รถบดล้อยาง	3	คัน
8	รถบดสันสะเทือน	1	คัน
9	รถบรรทุกน้ำ	2	คัน
10	รถบรรทุกหัวลากพ่วง	6	คัน
11	รถสเปรย์ยาง	1	คัน
12	รถไม้กวาด	1	คัน
13	ชุดตีเส้นจราจร	1	ชุด
14	รถปูยาง	1	คัน
15	กล้องแนว - กล้องระดับ	1	ชุด
16	รถปิกอัพ	1	คัน
17	รถเครน	1	คัน



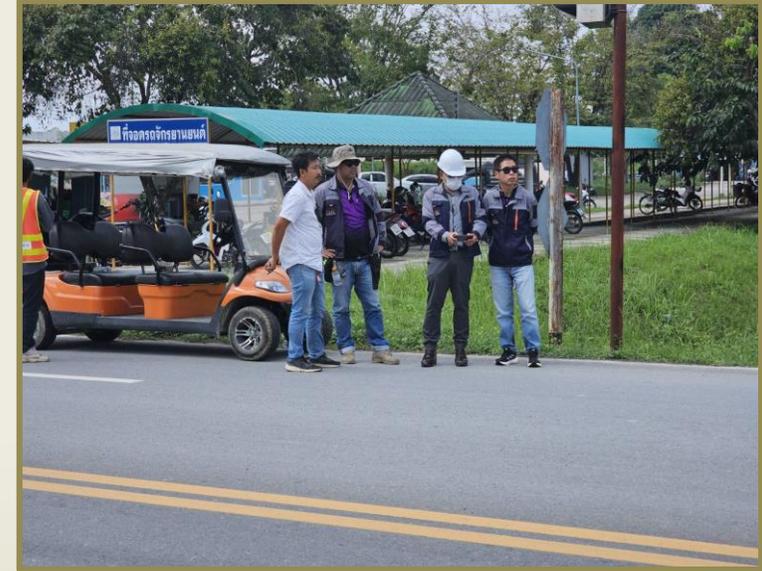



โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรม และการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
179/2567 ลงวันที่ 30 ก.ย. 67
43,171,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



1 ต.ค. 67 – 30 เม.ย 68 (212 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1)
116 วัน (54.71%)
96 วัน (45.29%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



40.00 %
2/5 งวด
40 คน










เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน



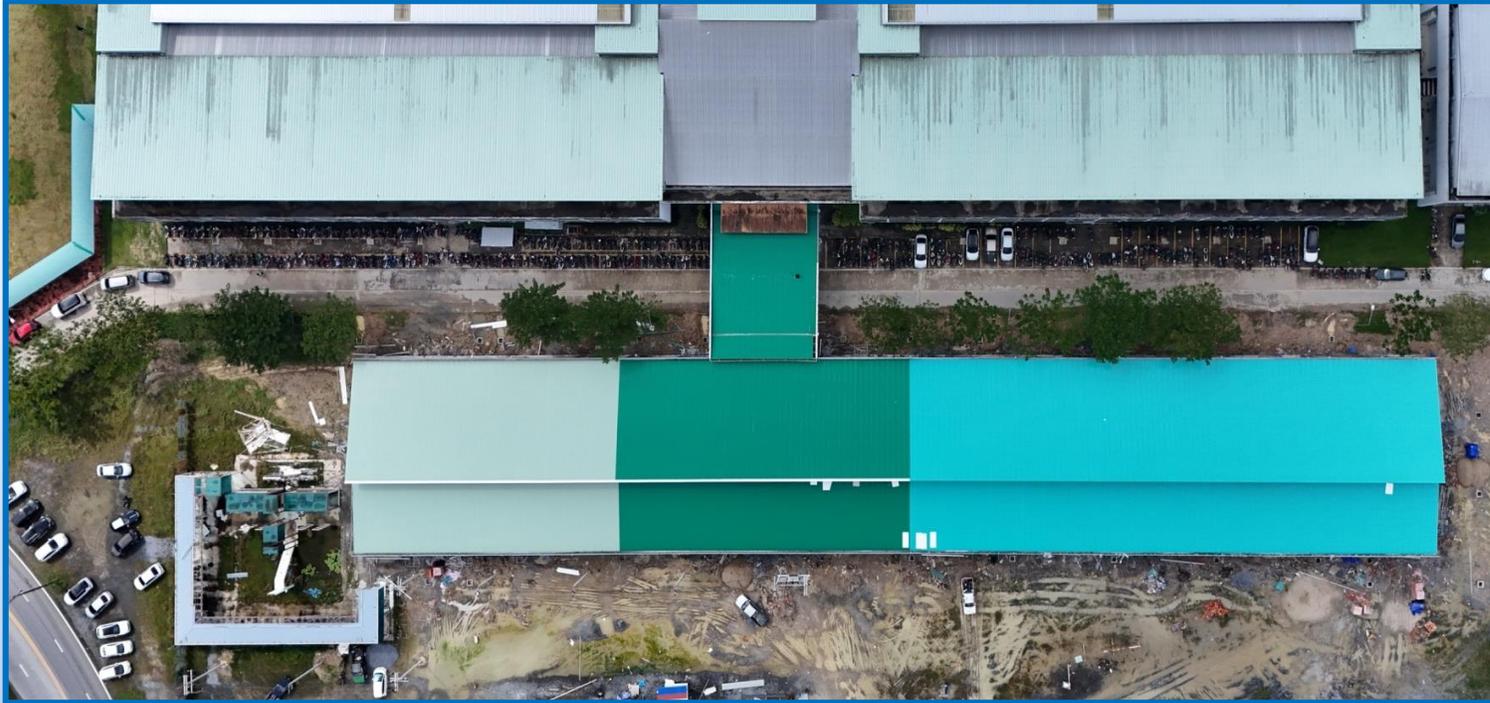



เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน









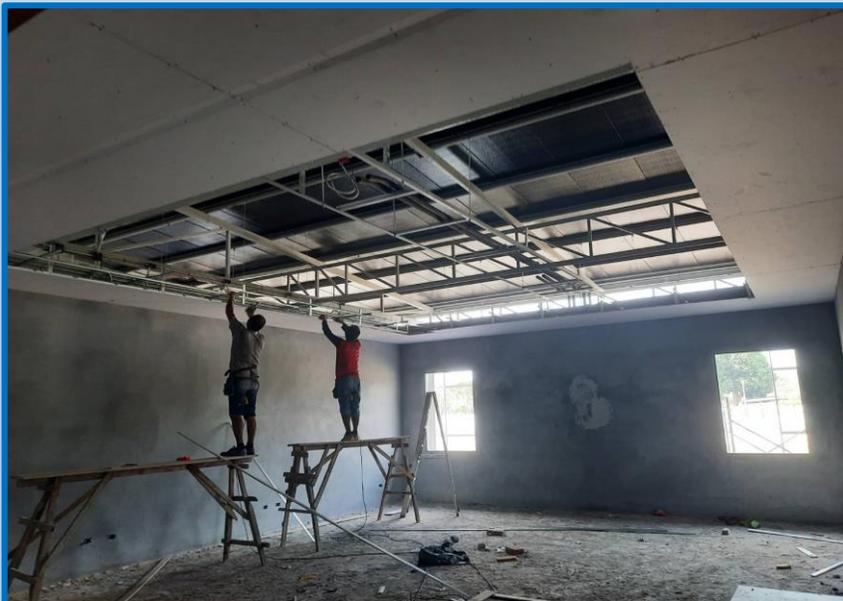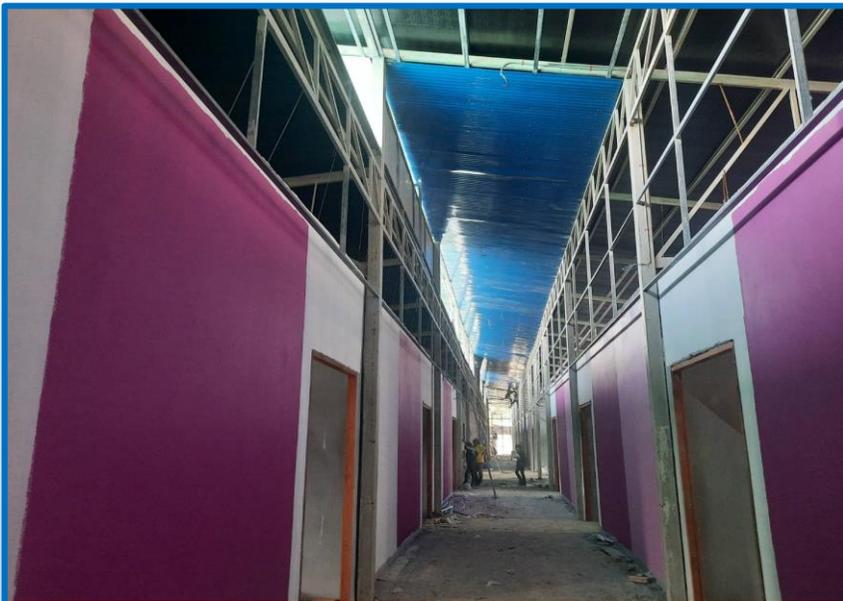

ความก้าวหน้างาน

1. งานเทคอนกรีตพื้นอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
2. งานโครงสร้างคานา+ มุงหลังคา+รางน้ำสแตนเลส แล้วเสร็จ 95 %
3. งานผนังก่ออิฐ+ ฉาบปูน แล้วเสร็จ 98 %
5. งานติดตั้งวงกบไม้ประตูห้องเรียน แล้วเสร็จ 95 %
6. งานไฟฟ้าเดินภายในห้อง แล้วเสร็จ 30 %
7. ไฟฟ้าเดิน METAL SHEET แล้วเสร็จ 15 %
8. งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จ 20 %
9. งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 70 %
10. งานเดินท่อ+ร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 60 %
11. งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 15 %



ความก้าวหน้างาน

11. งานติดตั้ง SIDING METAL SHEET แล้วเสร็จ 35 %
12. งานติดตั้งท่อ คสล. ระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ 85%
13. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ 90 %



โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ



ความก้าวหน้างาน งานทางเชื่อมอาคาร

1. งานโครงสร้าง+หลังคา+รางน้ำ แล้วเสร็จ 95 %
2. งานติดตั้ง คอมโพสิท แล้วเสร็จ 70 %

กว้าง 15 ยาว 22 สูง 4.6




ความก้าวหน้างาน งานทางเชื่อมอาคาร

1. งานโครงสร้าง+หลังคา+รางน้ำ แล้วเสร็จ 95 %
2. งานติดตั้ง คอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ 70 %

กว้าง 15 ยาว 22 สูง 4.6

งานงวดที่ 3 (51%) ส่งประมาณ ต้นเดือน ก.พ. 68

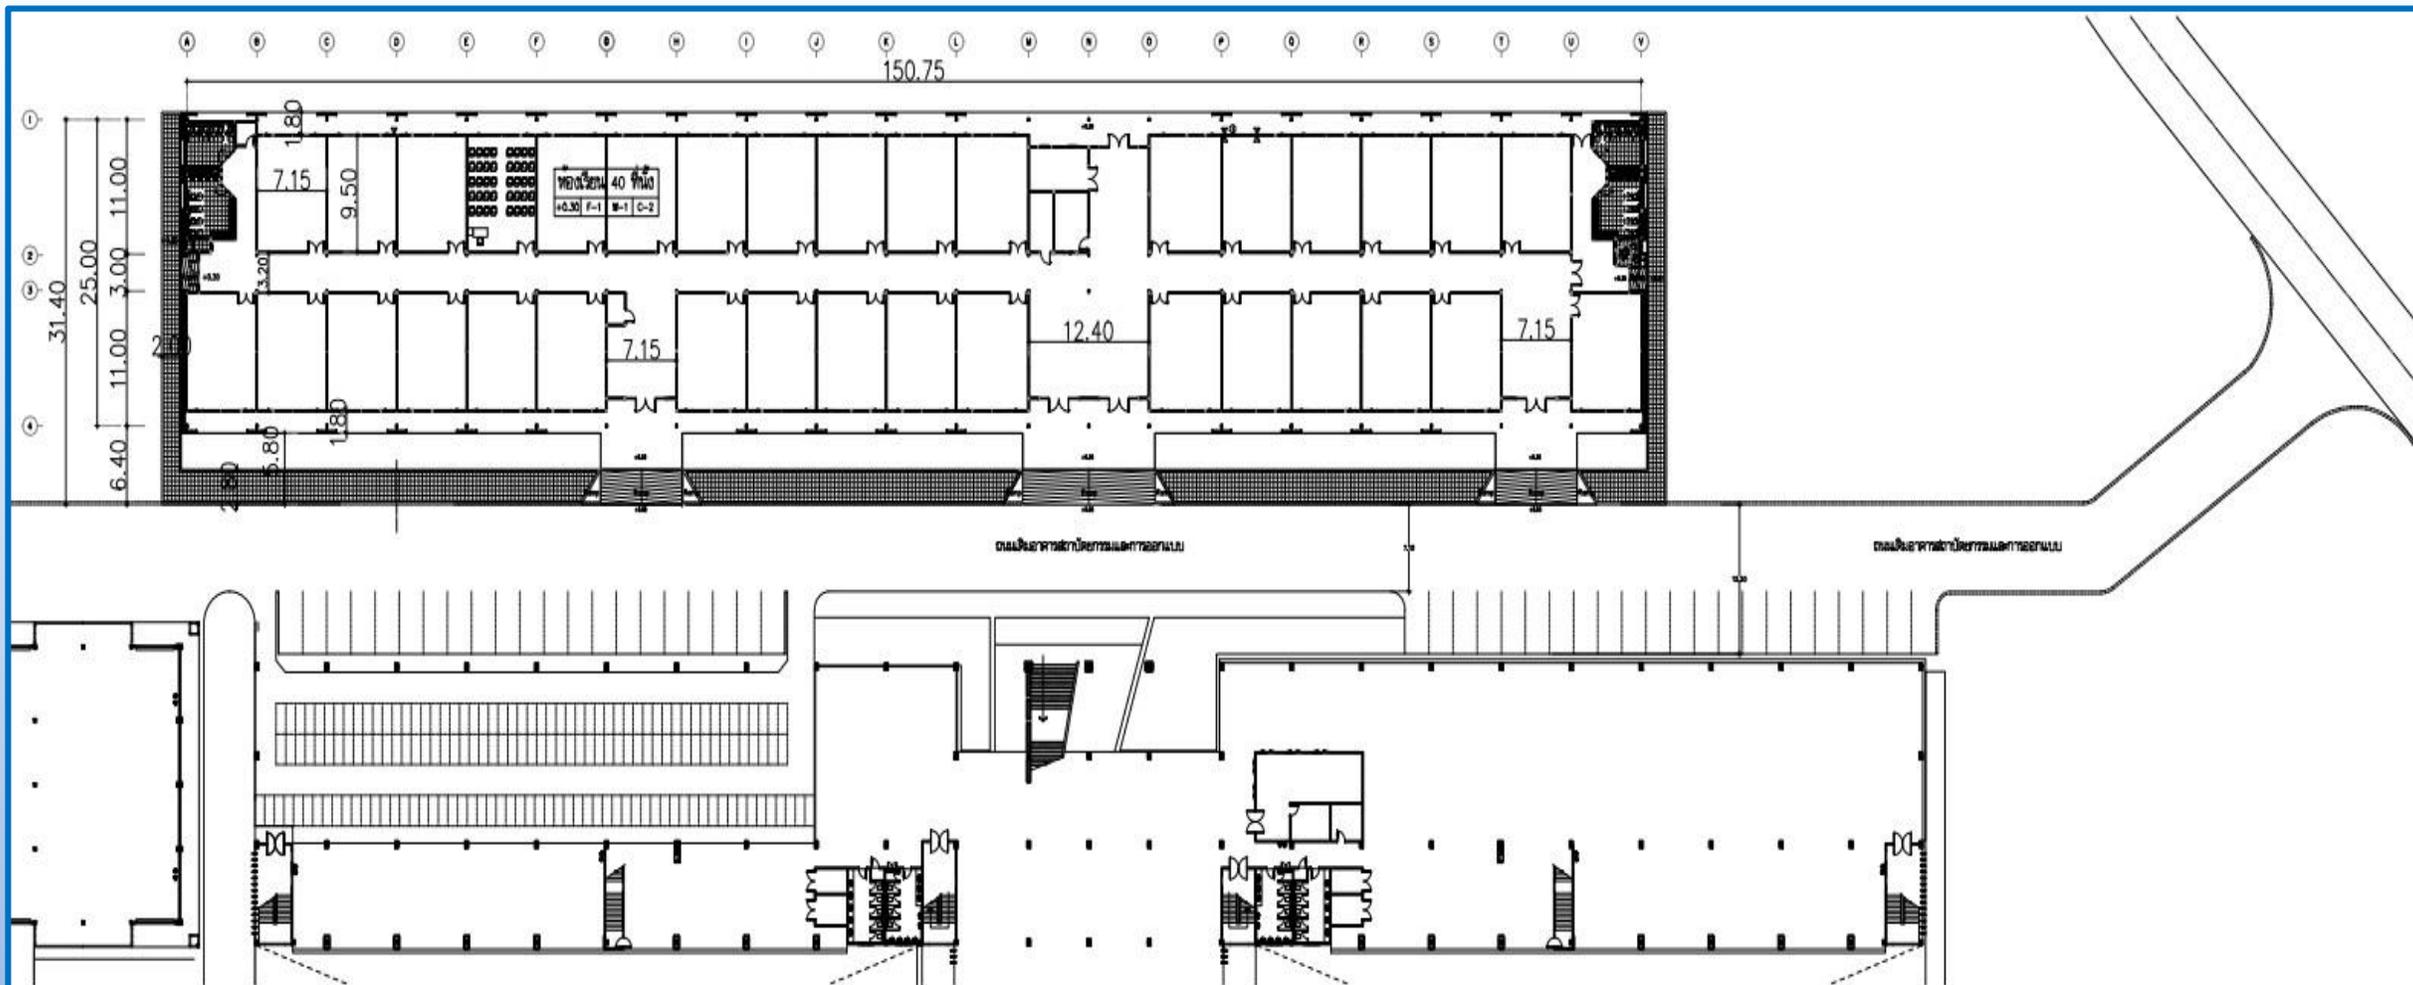


อาคาร 26*151 ม.

พื้นที่ห้องเรียน 7.15*9.50 ม =68 ตร.ม. 34 ห้อง

ห้องเรียน ปูกระเบื้อง 60*60

ทางเดินกลาง หินแกรนิต ทางเท้าโดยรอบ กระเบื้อง 40*40

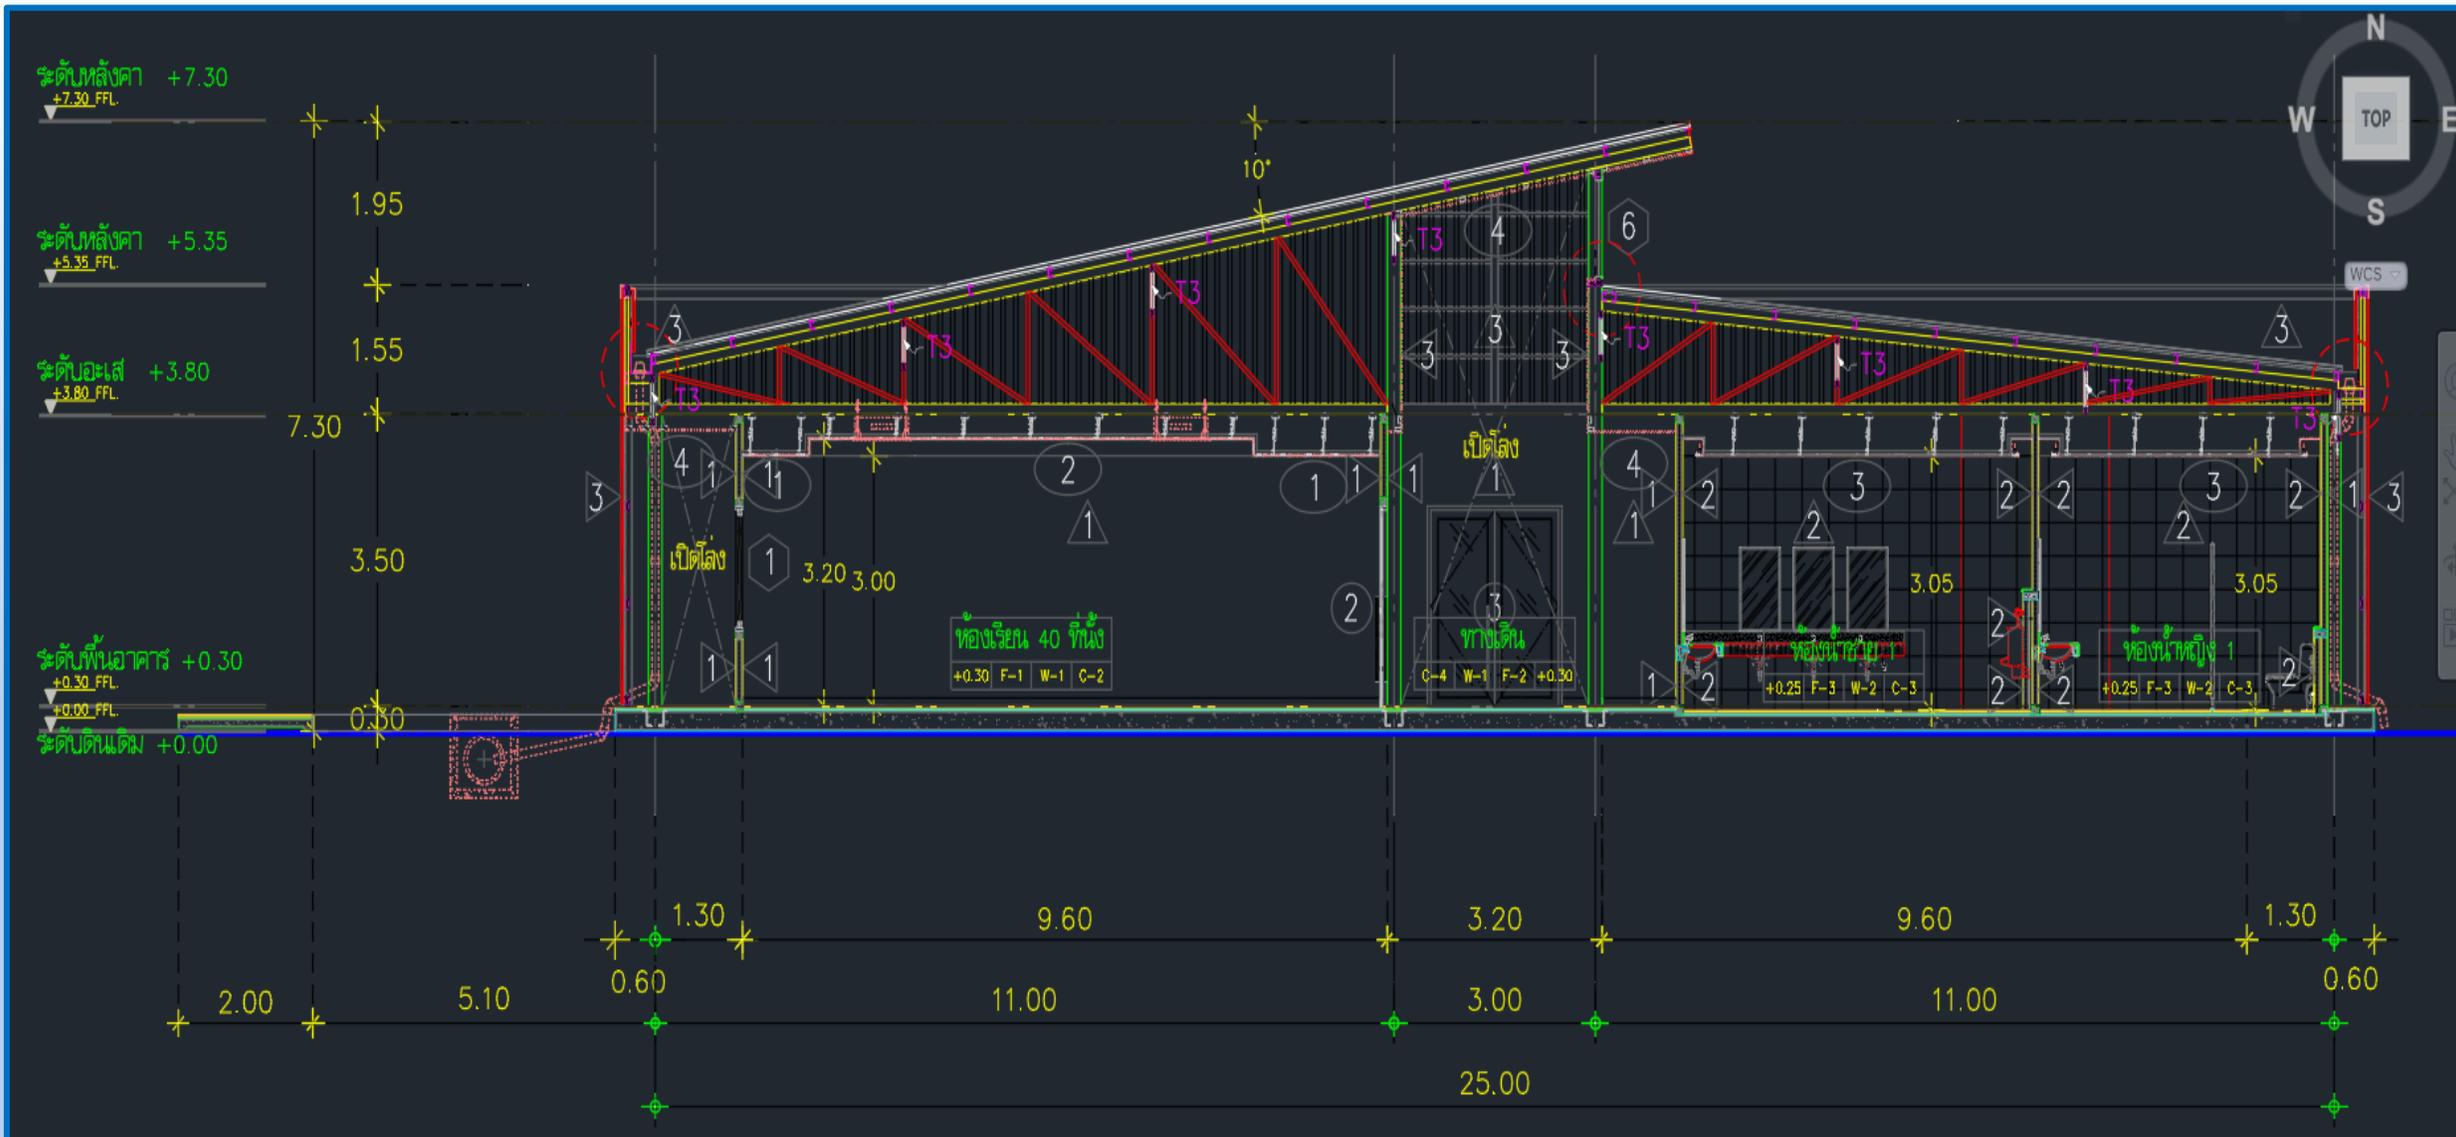







โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

<p>ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง</p>		<p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค. คอนสตรัคชั่น (2007) 150/2567 ลงวันที่ 26 ส.ค. 67 322,000,000.00 บาท</p>
<p>ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา</p>		<p>27 ส.ค. 67 – 12 ก.ย. 70 (900 วัน) 151 วัน (16.70%) 749 วัน (83.30%)</p>
<p>ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย</p>		<p>0.56 % 0/30 งวด 10 คน</p>
<p>จำนวนเครื่องจักร</p>		<p>รถแมคโคร 2 คัน ,รถเกรด 1 คัน, รถไถ 1 คัน,รถสิบล้อ 4 คัน</p>




ความก้าวหน้างาน

1. งานเจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ 100 %
2. งานถมดินปรับระดับ แล้วเสร็จ 37 %
แผนถมดินถึงระดับ -1.00 ปลายเดือน
ก.พ. 68 และ จะเริ่มตอกเสาเข็มก่อนเพื่อ
เร่งรัดงานก่อสร้าง
3. เสาเข็มทำ PILOT PILE ได้สั่งผลิตแล้ว
เริ่มตอก ปลายเดือน ก.พ. 68







โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล


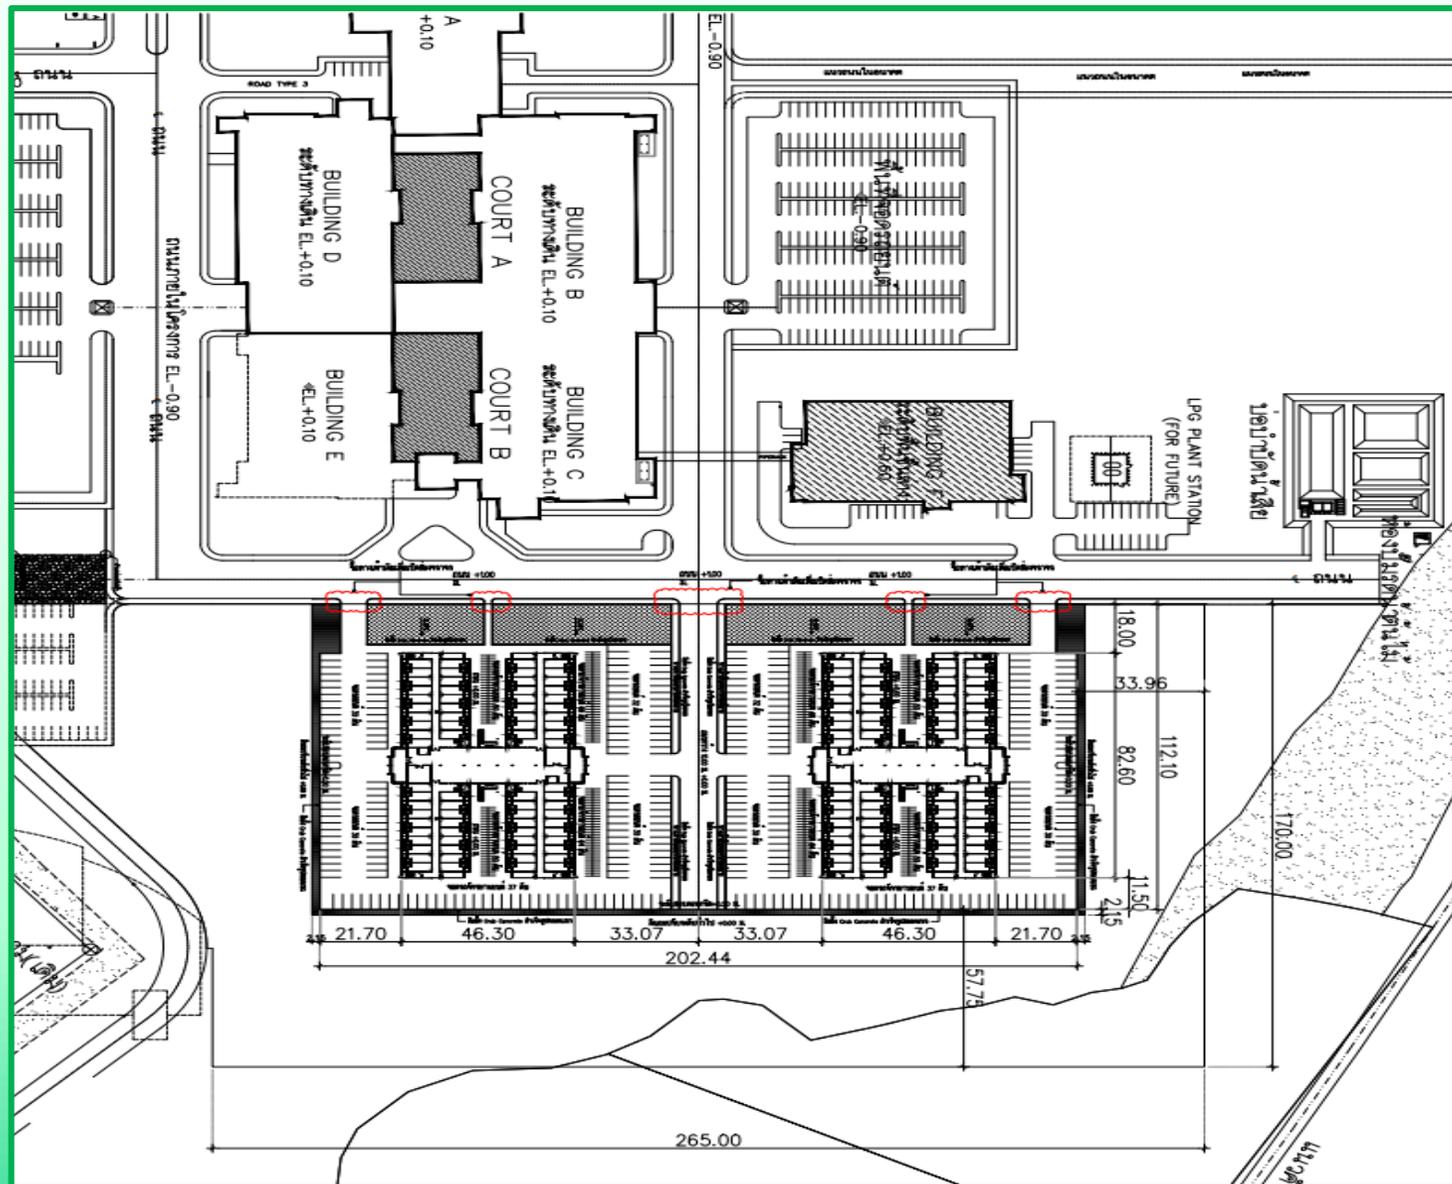


ดินถม 100000 ลบ.ม. ดินเดิม - 4.00 ดมสูง 3 ม.
 ดินถมระดับ -1.00
 บ่อขี้ม -2.60 ห่างแนวกำแพง 3 ม.

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

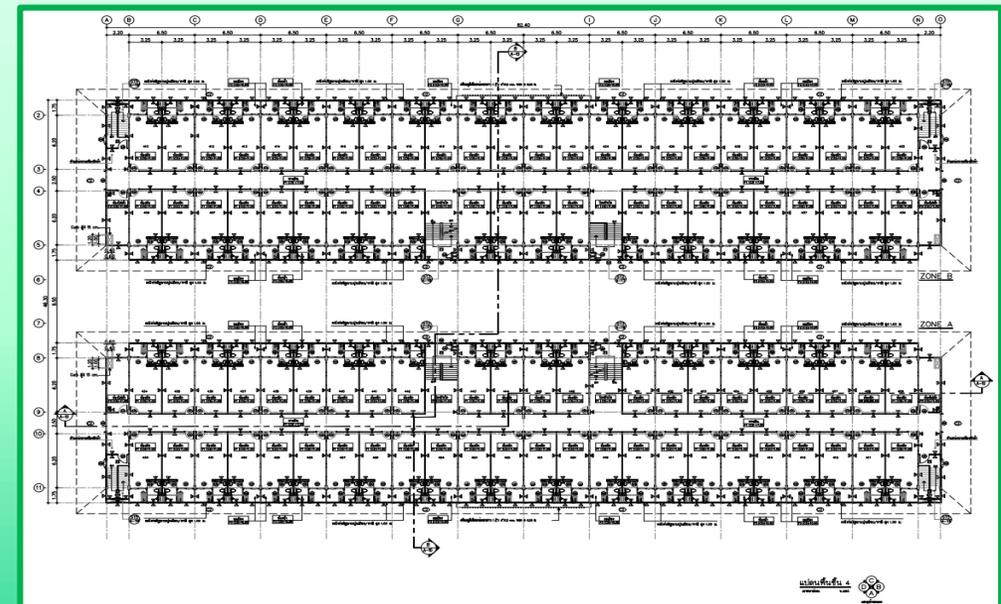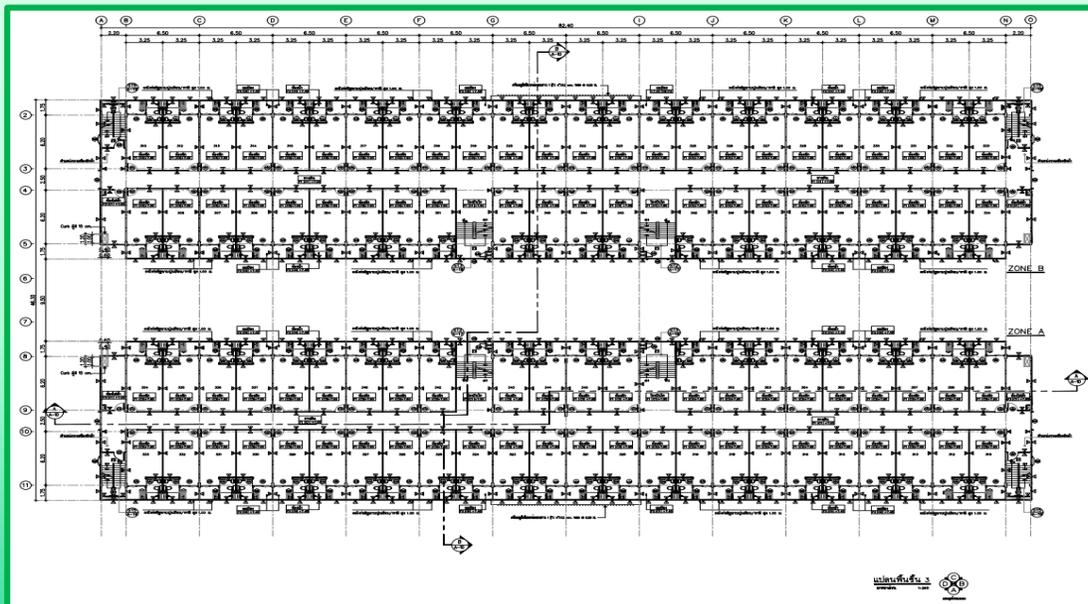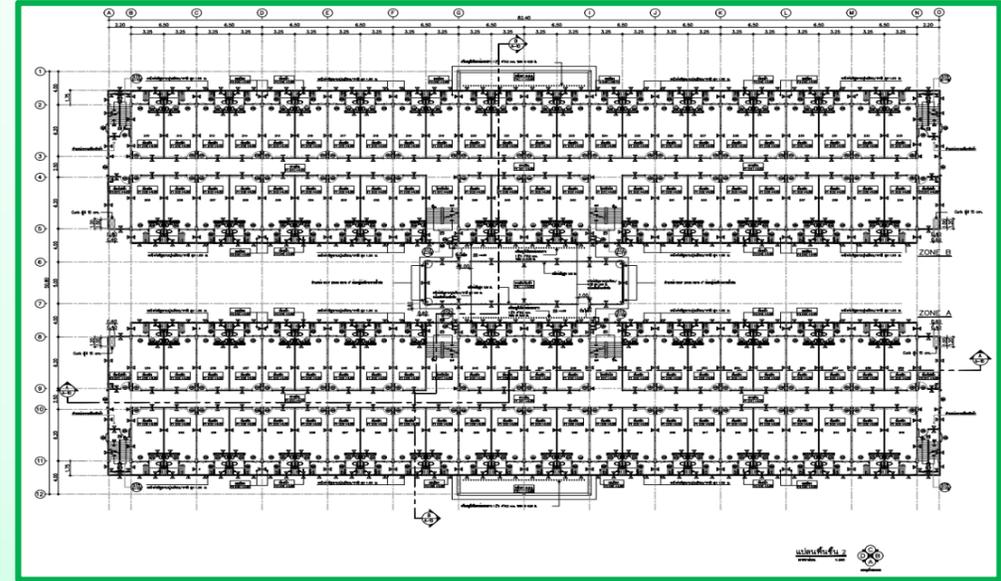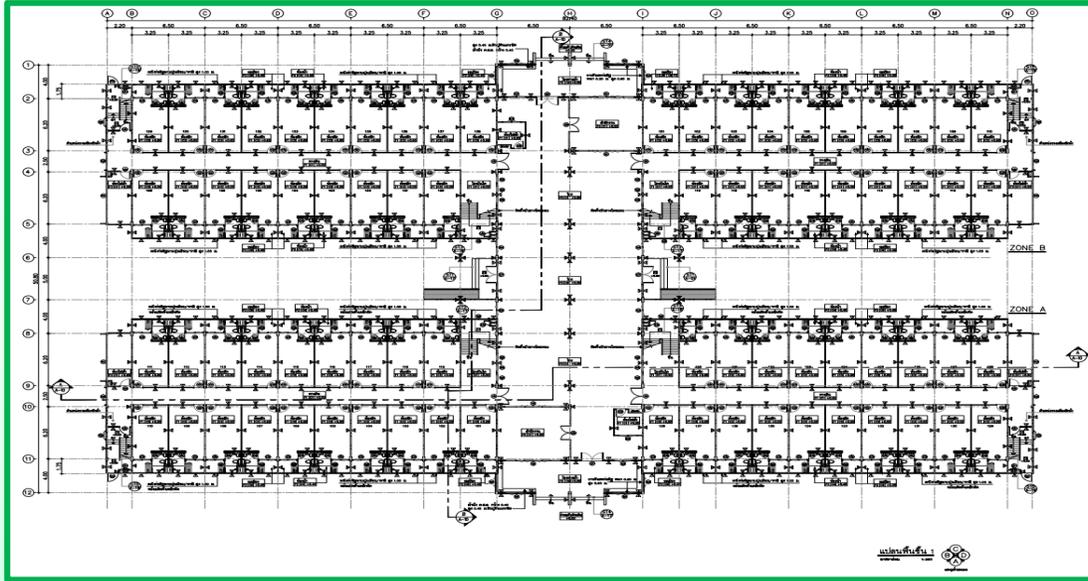

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

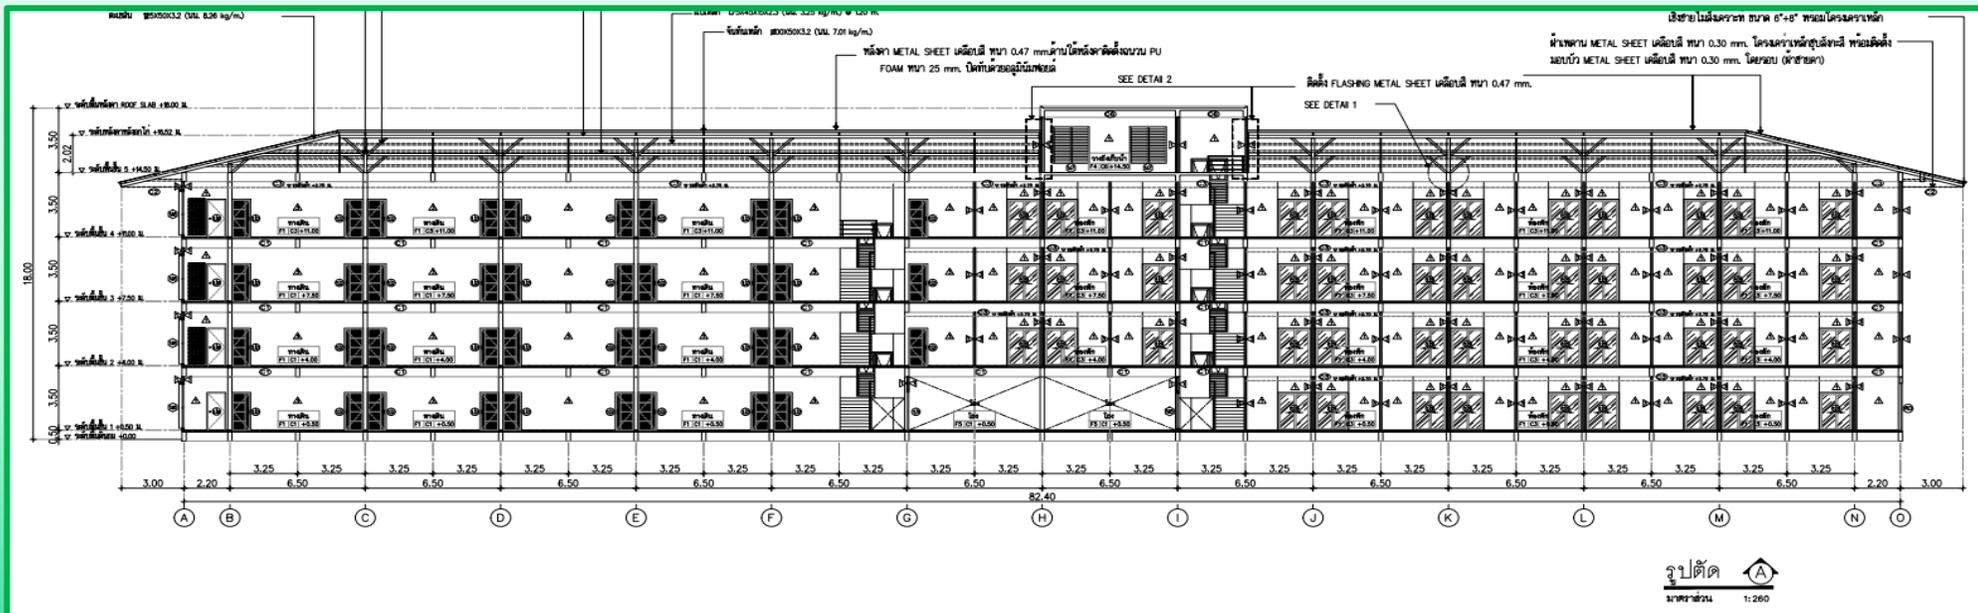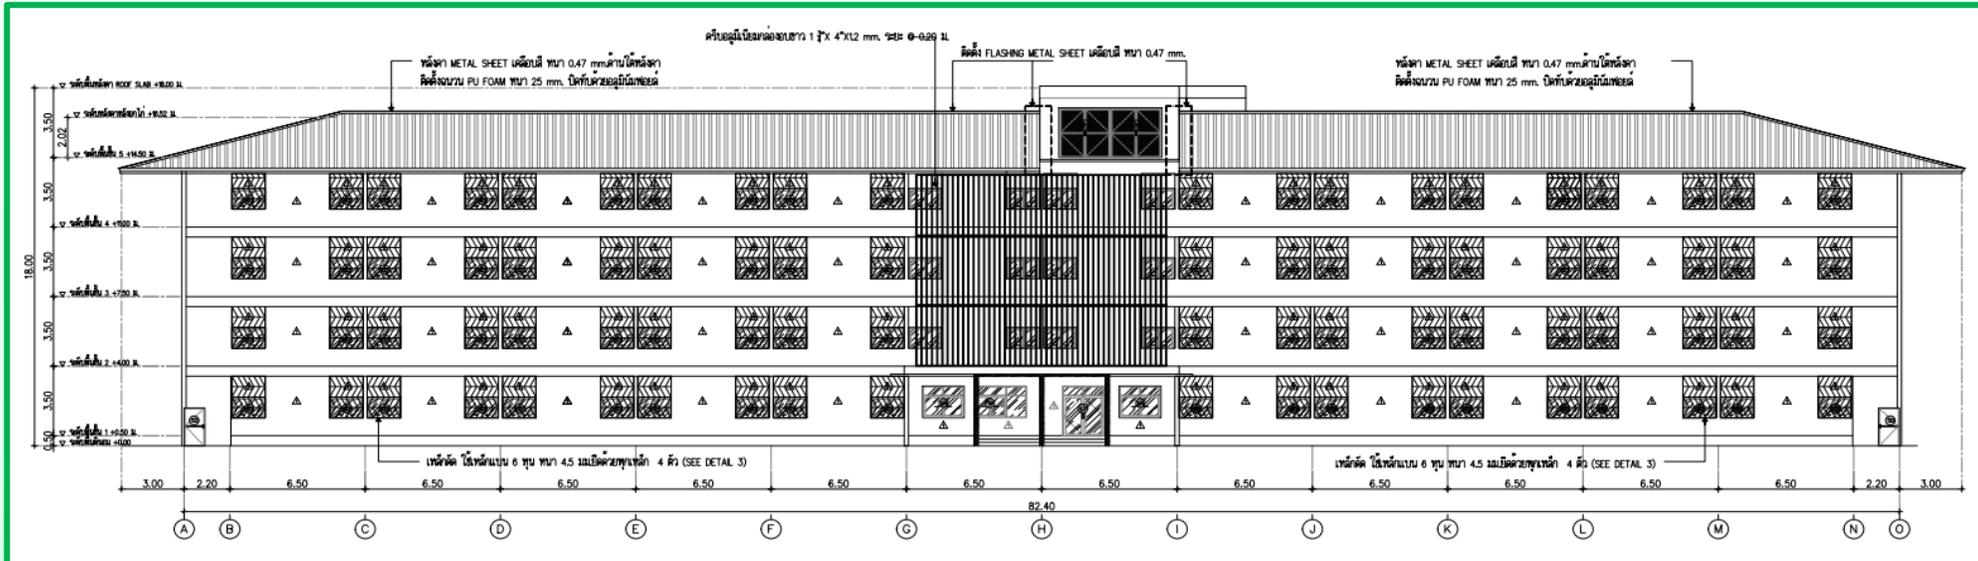



12

โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไป เชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษาด้านทิศตะวันตก

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท สันยาคอนกรีต จำกัด
027/2568 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2567
4,000,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




14 ธ.ค. 67 – 12 เม.ย. 68 (120 วัน)
42 วัน (35.00%)
78 วัน (65.00%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



5.00%
0/3 งวด
3

โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไปเชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษาด้านทิศตะวันตก

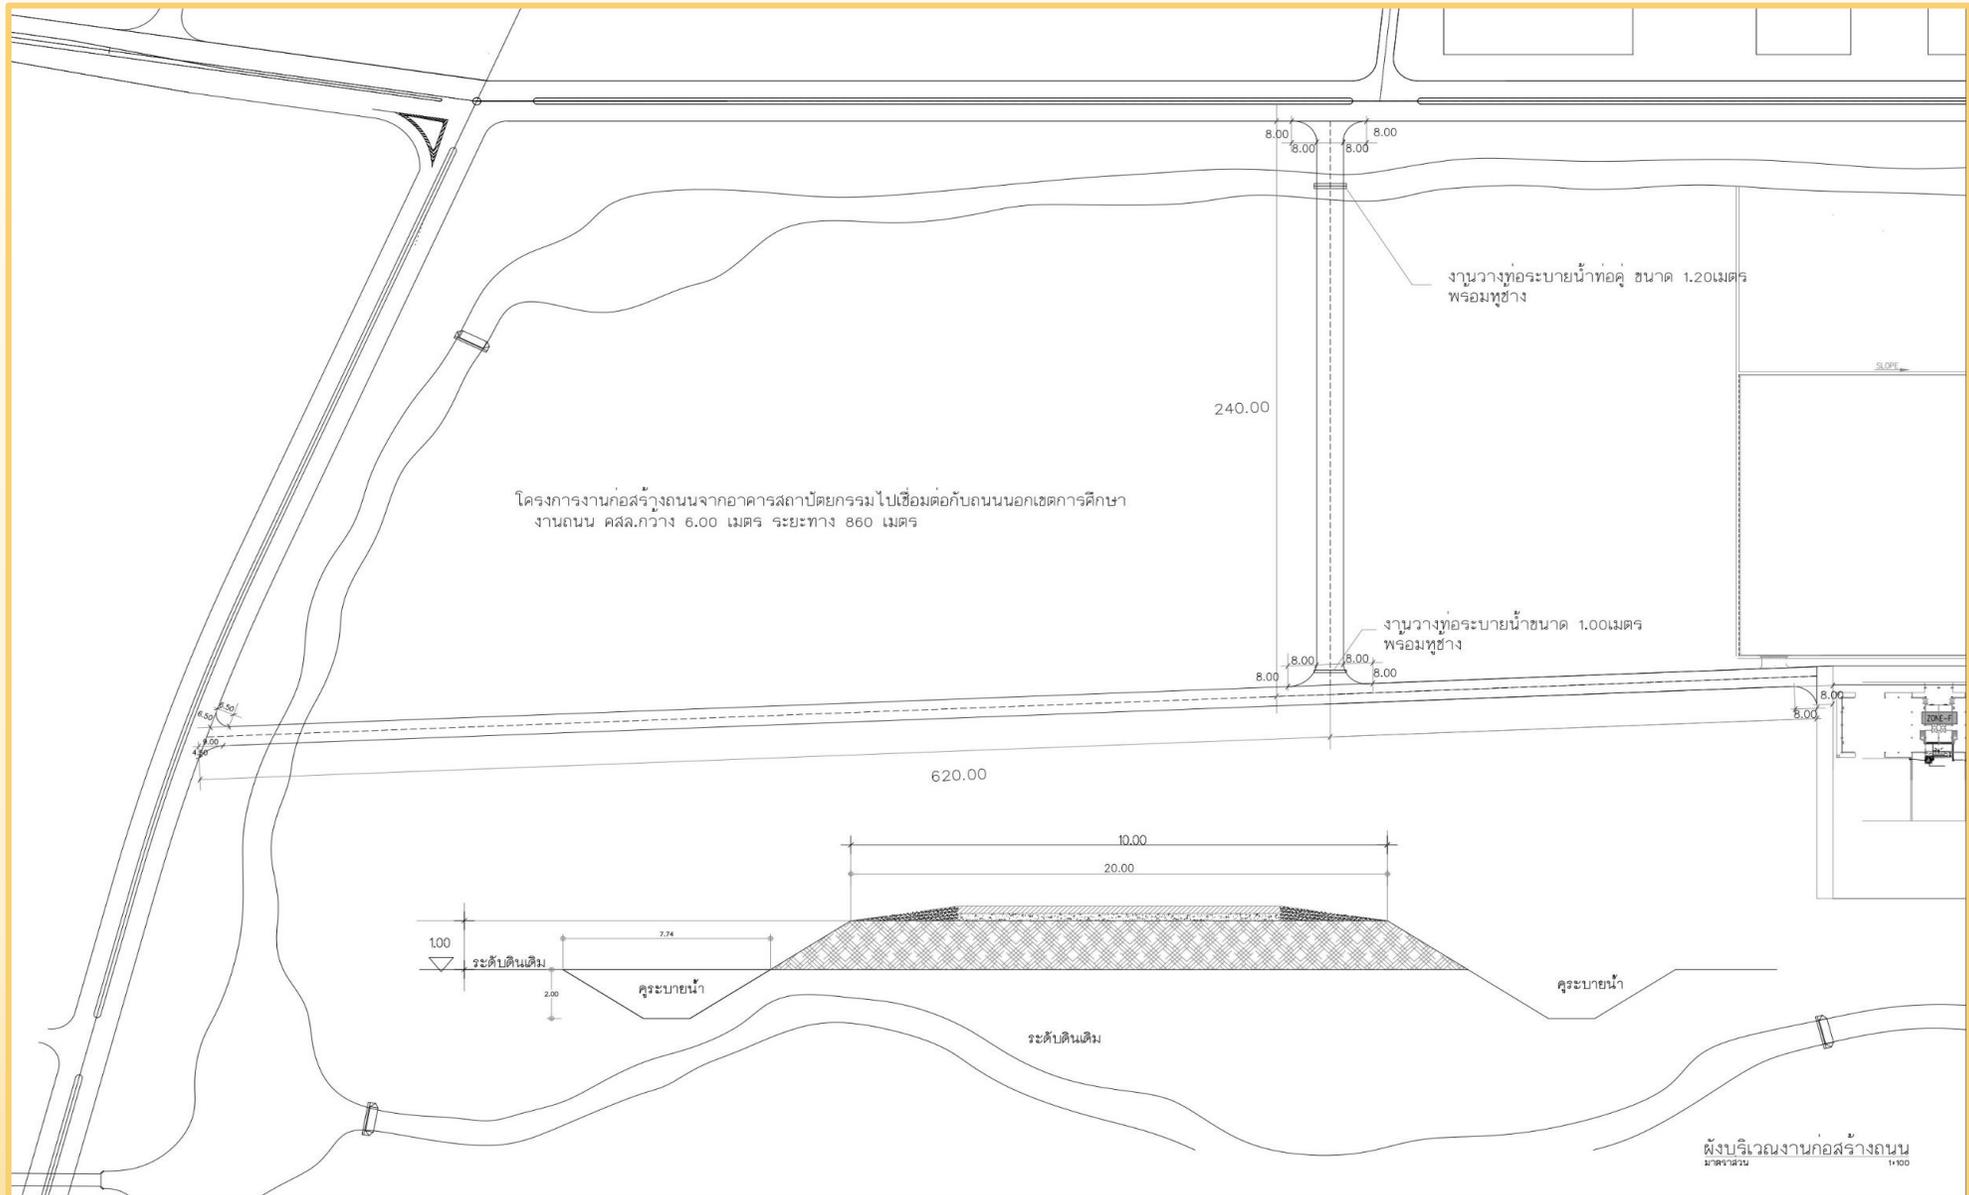

โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไปเชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษาด้านทิศตะวันตก





ความก้าวหน้างาน


งานถนนแวนนอน


1. งานขุดร่องระบายน้ำ แล้วเสร็จ 80 %


งานถนนแนวตั้ง

1. งานขุดร่องระบายน้ำ แล้วเสร็จ 60 %
2. งานถมดินปรับระดับ แล้วเสร็จ 60 %

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 068/2568 ลงวันที่ 10 ม.ค. 68 60,000,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		11 ม.ค. 68 – 6 ม.ค. 69 (360 วัน) 14 วัน (3.88%) 346 วัน (96.12%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		0.00% 0/9 งวด 5 คน

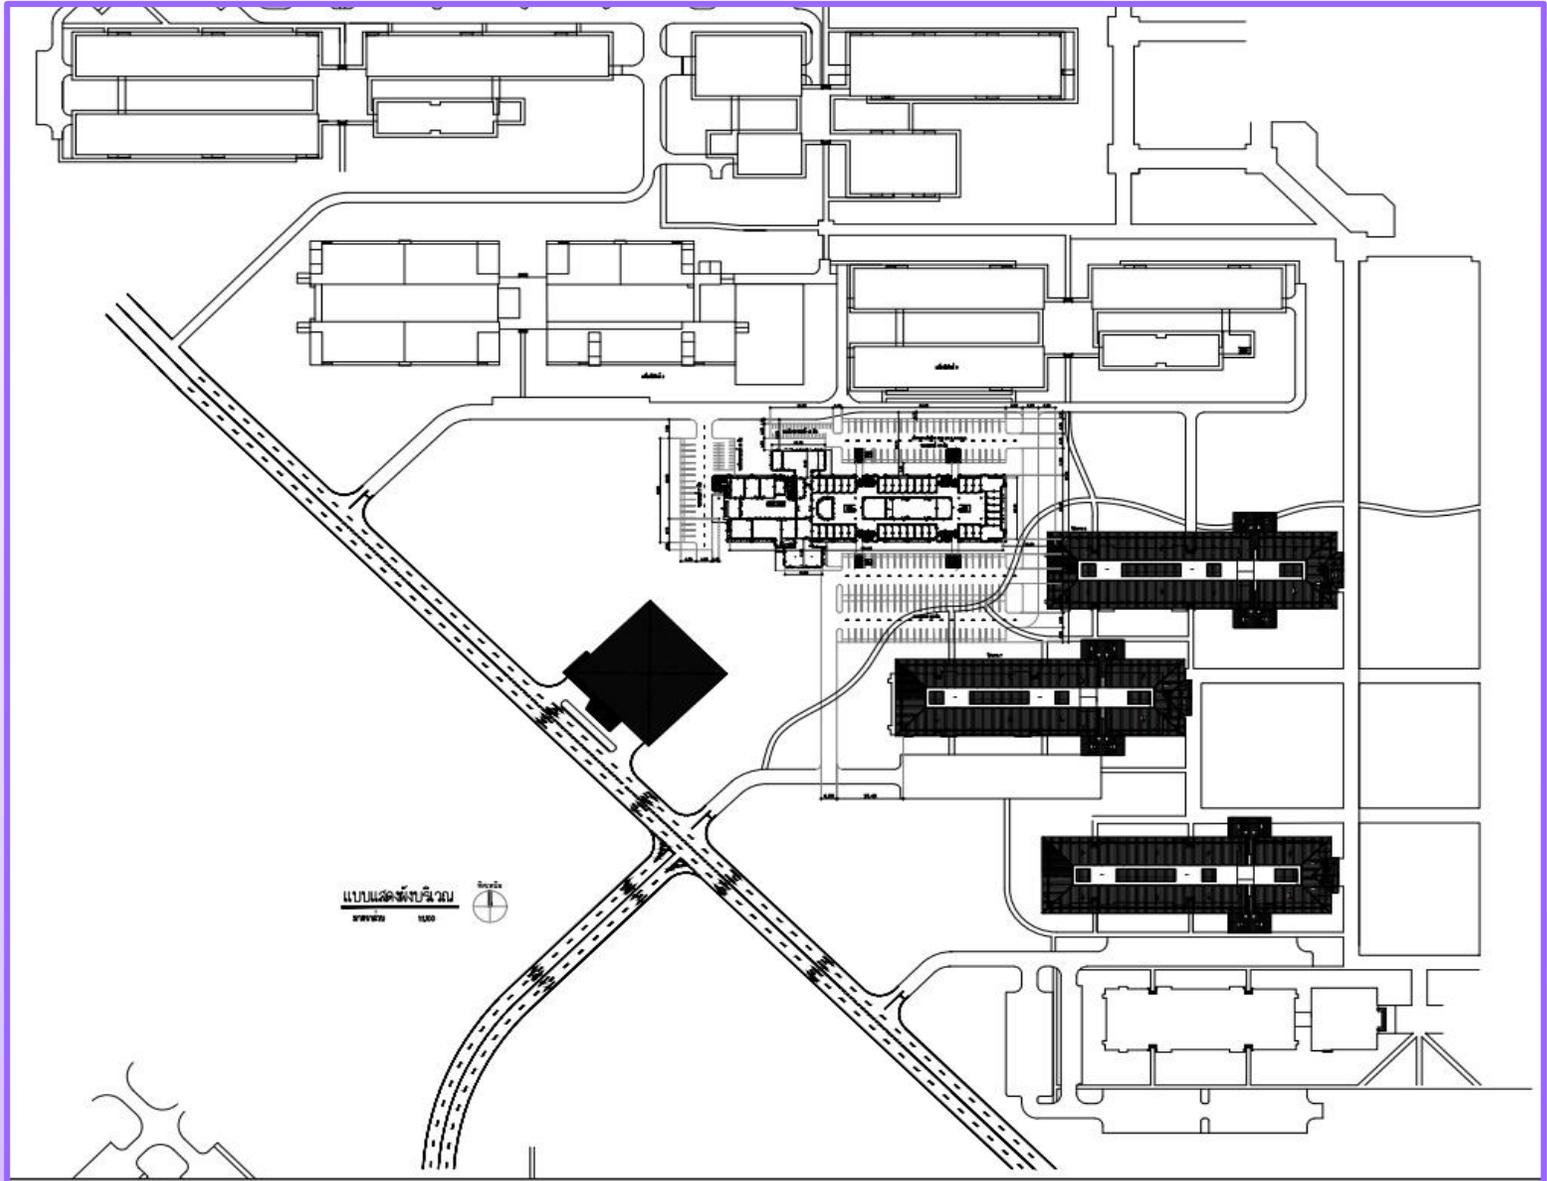


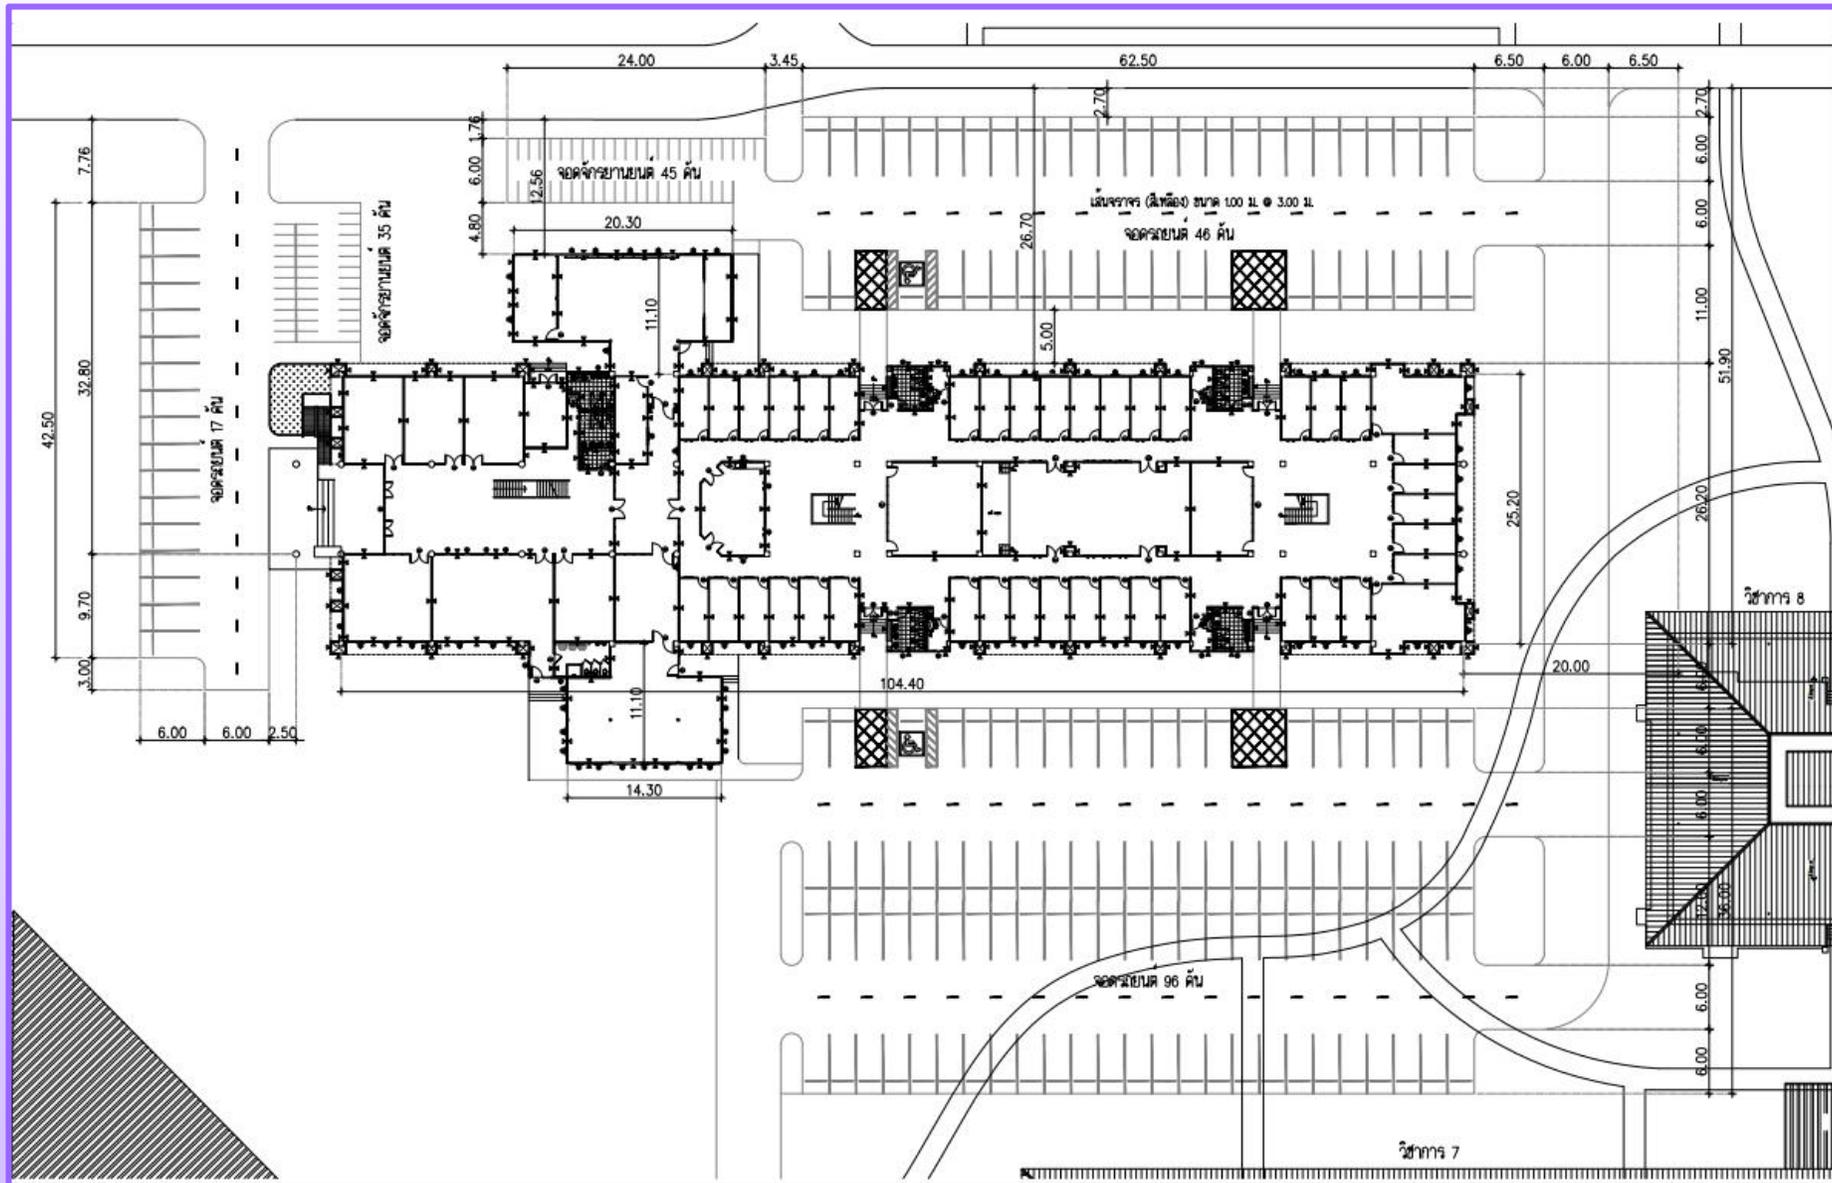


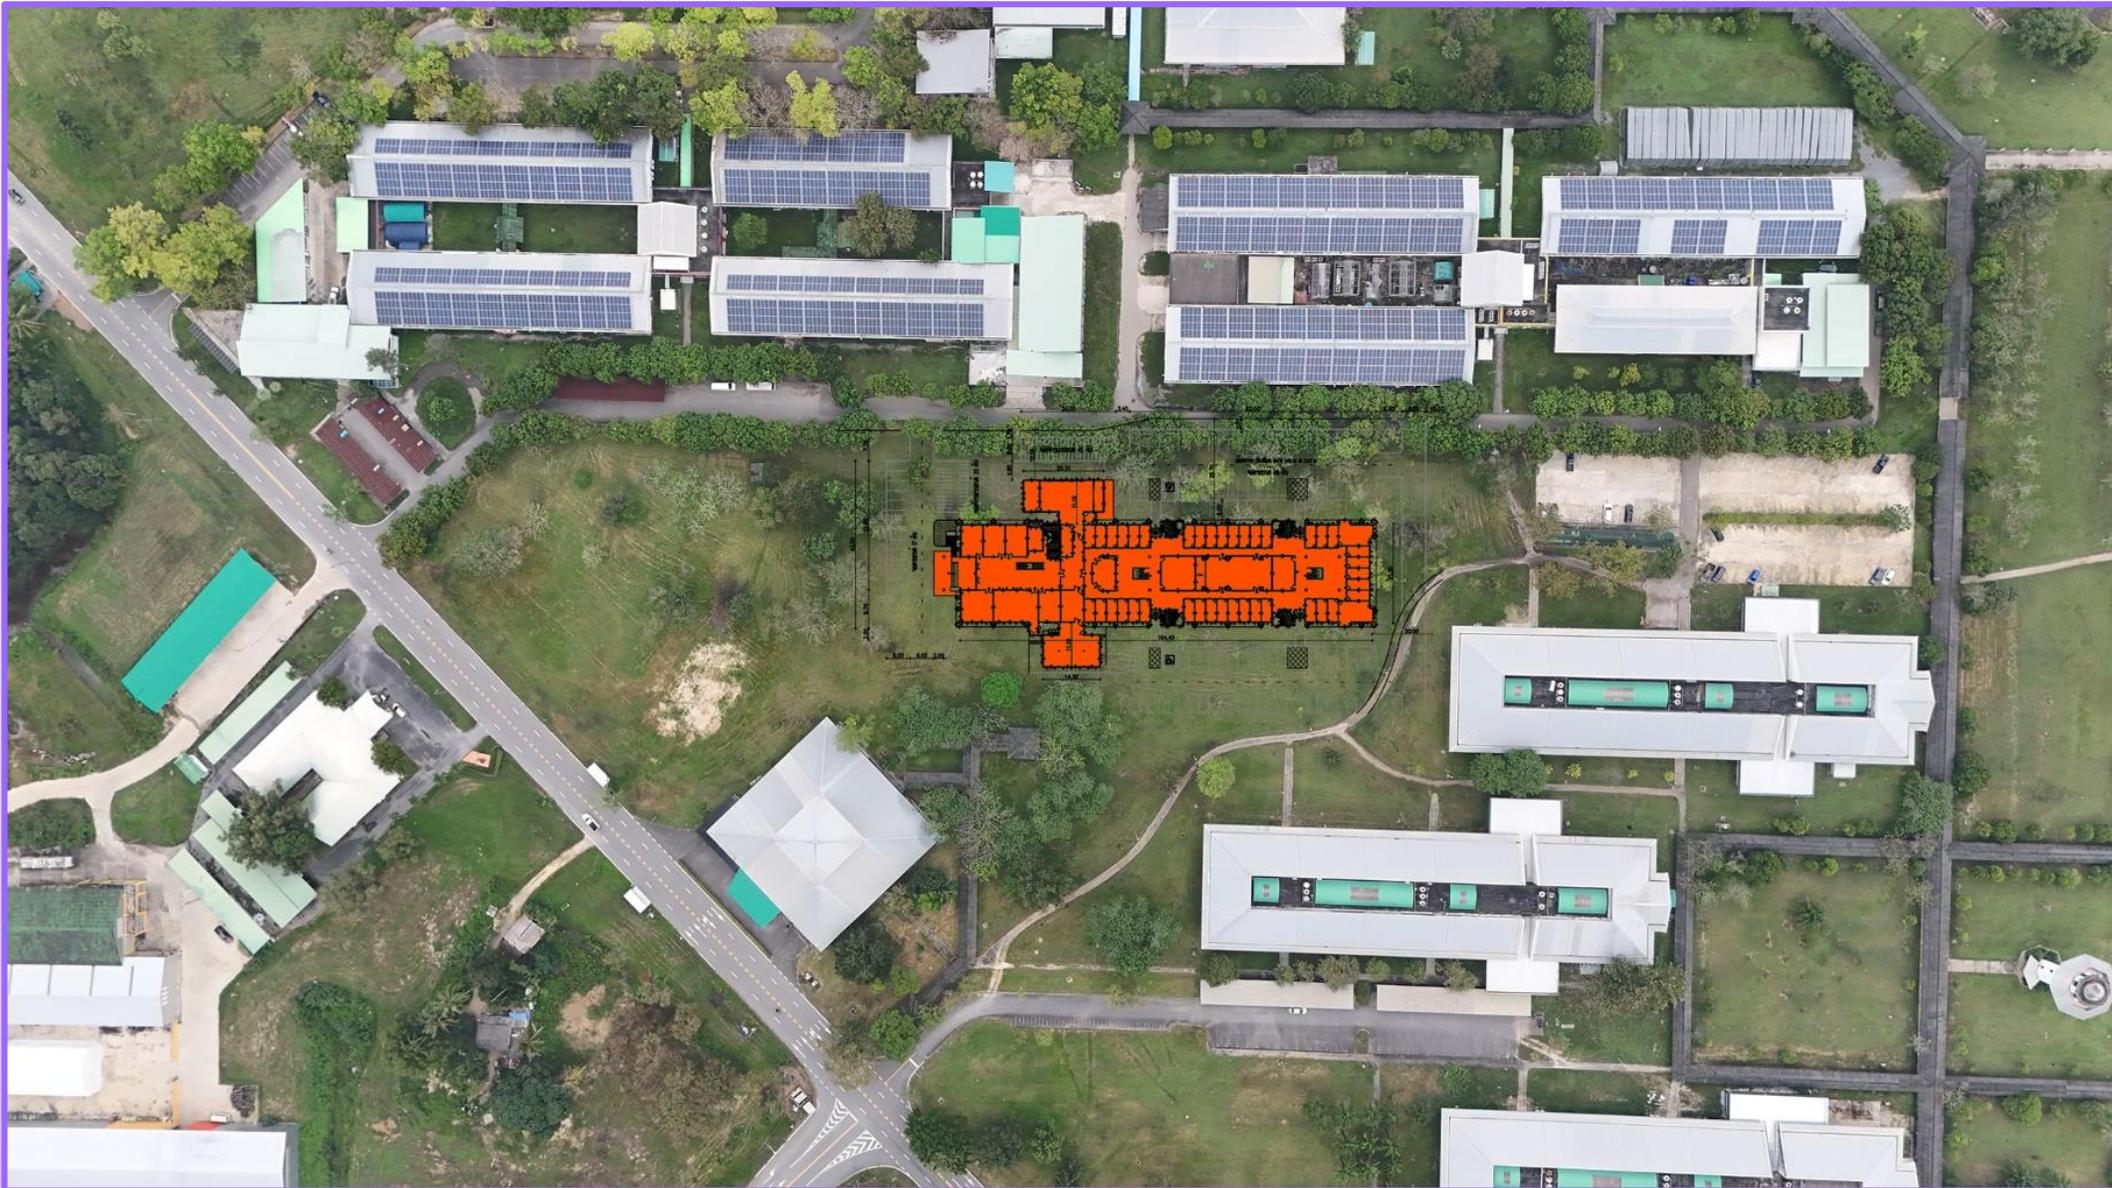





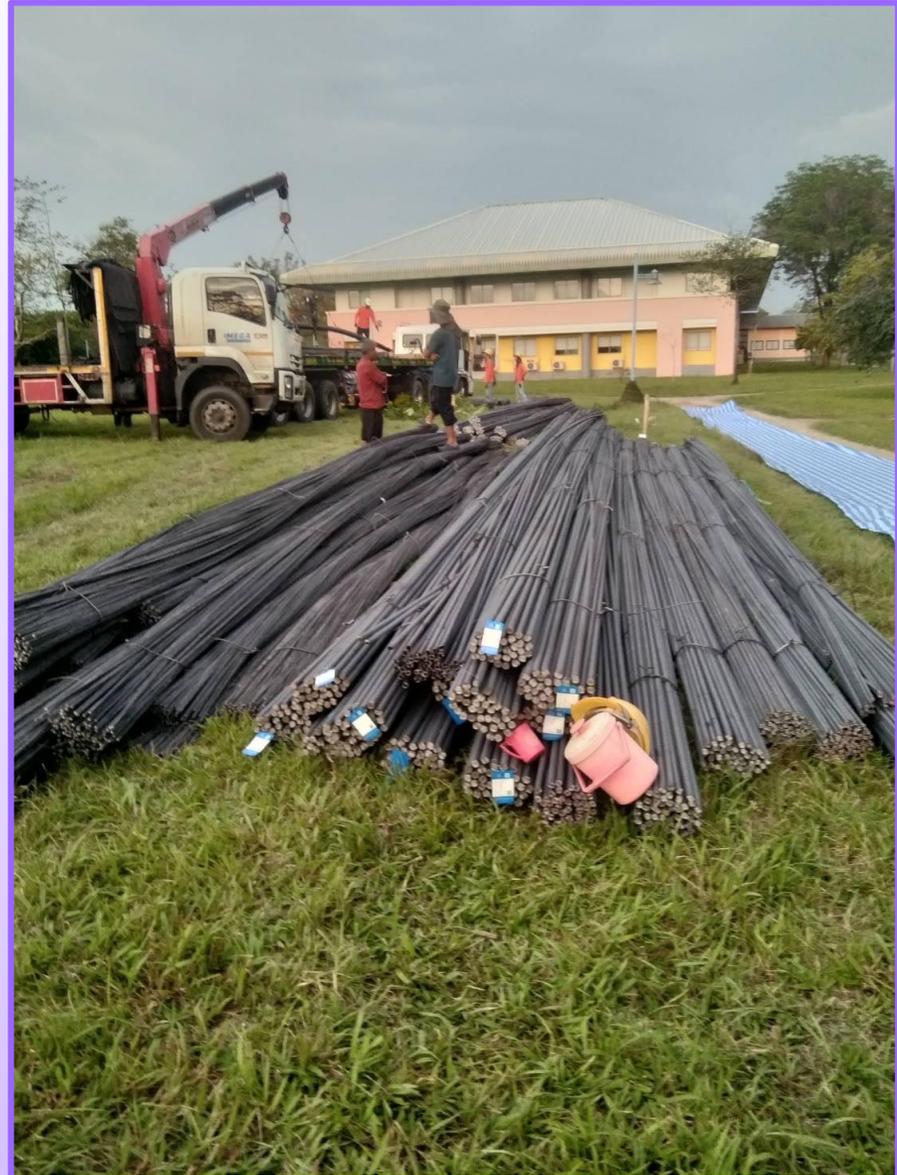

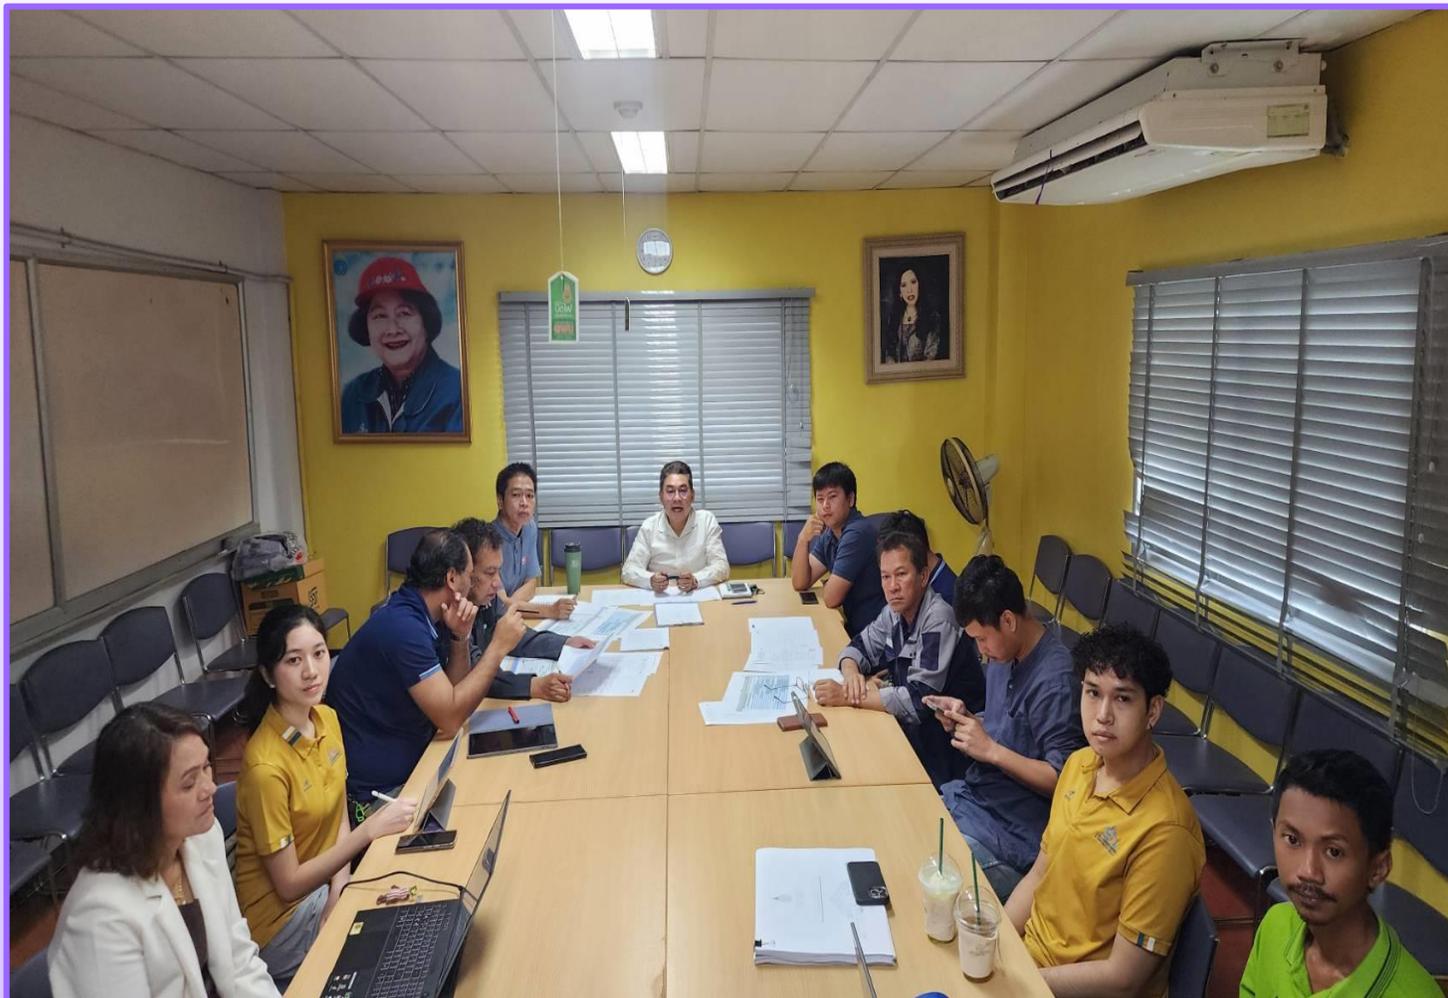

14

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านสังคม

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
-
79,500,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



-
-
-

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



หมดระยะเวลาอุทธรณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างมาลงนามสัญญาจ้าง
-
-

โครงการก่อสร้างหุบจำลองชาติพันธุ์มานี (20 ต.ค. 67)





โครงการก่อสร้างหุ้่นจำลองชาติพันธุ์มาบิ (20 ต.ค. 67)



THANK YOU



WALAILAK UNIVERSITY

CONSTRUCTION INSPECTOR
TEAM

