

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง รวม 16 โครงการ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราเทพการโยธา
240/2566 ลงวันที่ 15 ส.ค. 66
22,858,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



16 ส.ค. 66 – 6 มี.ค. 68 (569 วัน) (แบบท้ายครั้งที่5)
556 วัน (97.71%)
13 วัน (2.29%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



100 %
17/17 งวด
15 คน

1

โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อวท. วัฒนธรมวลยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อวท.มว. วัฒนธรมวลยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อัครมวฒนธรรมวลัยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อัครมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อวท. วัฒนธรมวลยลักษณ์



ชั้น 1





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อวศร มศว วัฒนธรรมวิทยาลัยลักษณะ


ชั้น 1

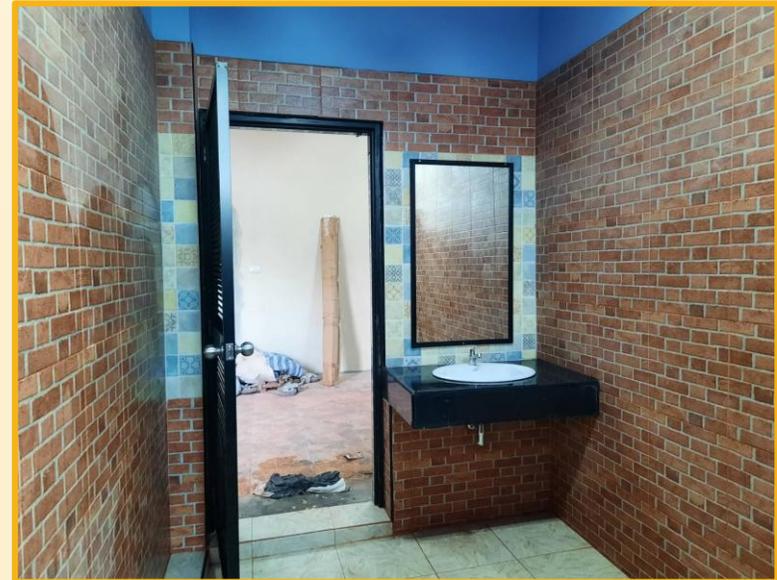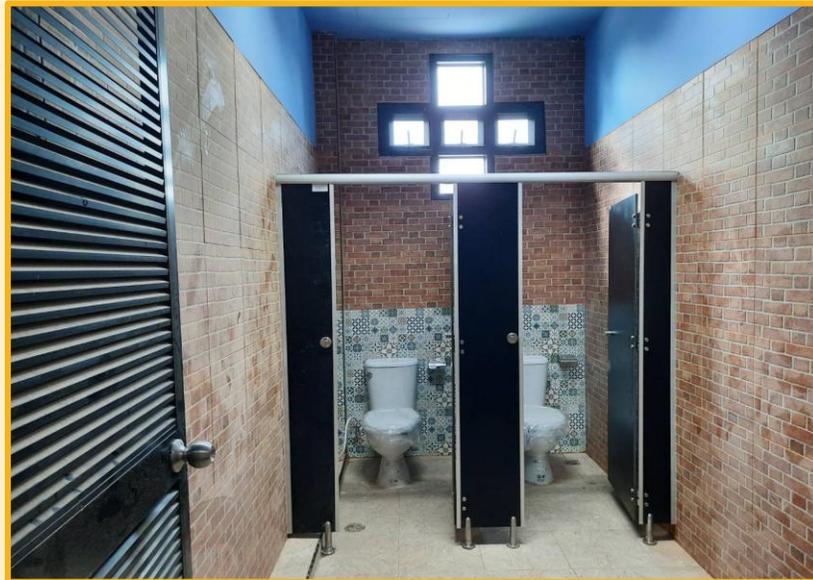



โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวิทยาลัยสงฆ์

ชั้น 1

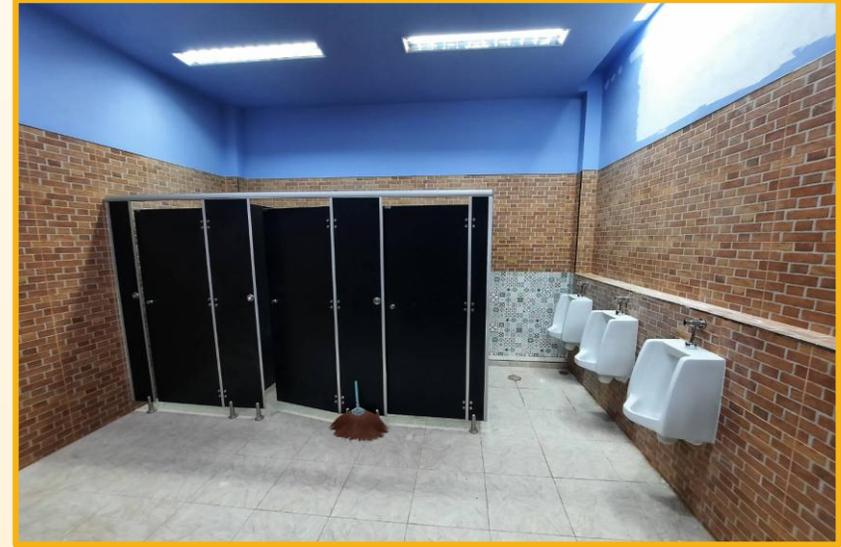

ชั้น 2





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์






โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์






โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

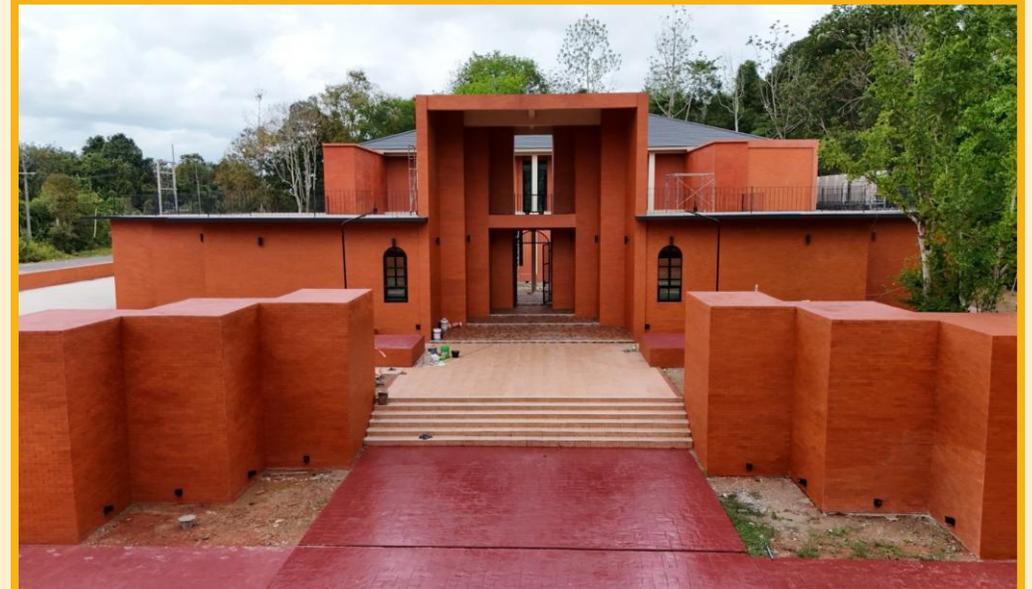

1

โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

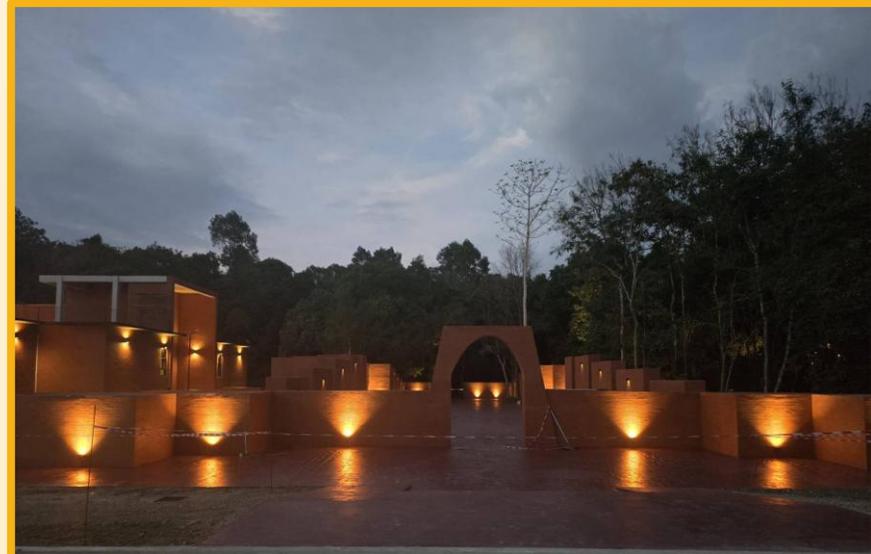

1

โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ประชุมประจำสัปดาห์ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

อธิการบดี ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

อธิการบดี ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

อธิการบดี ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง





โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 17



2

โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โยธากิจ (2000)
270/2566 ลงวันที่ 6 พ.ย. 66
2,940,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



7 พ.ย. 66 – 14 มี.ค. 67 (494 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 6)
473 วัน (95.74%)
21 วัน (4.26%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย




90.00 %
2/3 งวด
4 คน

จำนวนเครื่องจักร



รถแมคโคร 1 คัน ,รถสิบล้อ 2 คัน ,รถไถ 1 คัน

โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง

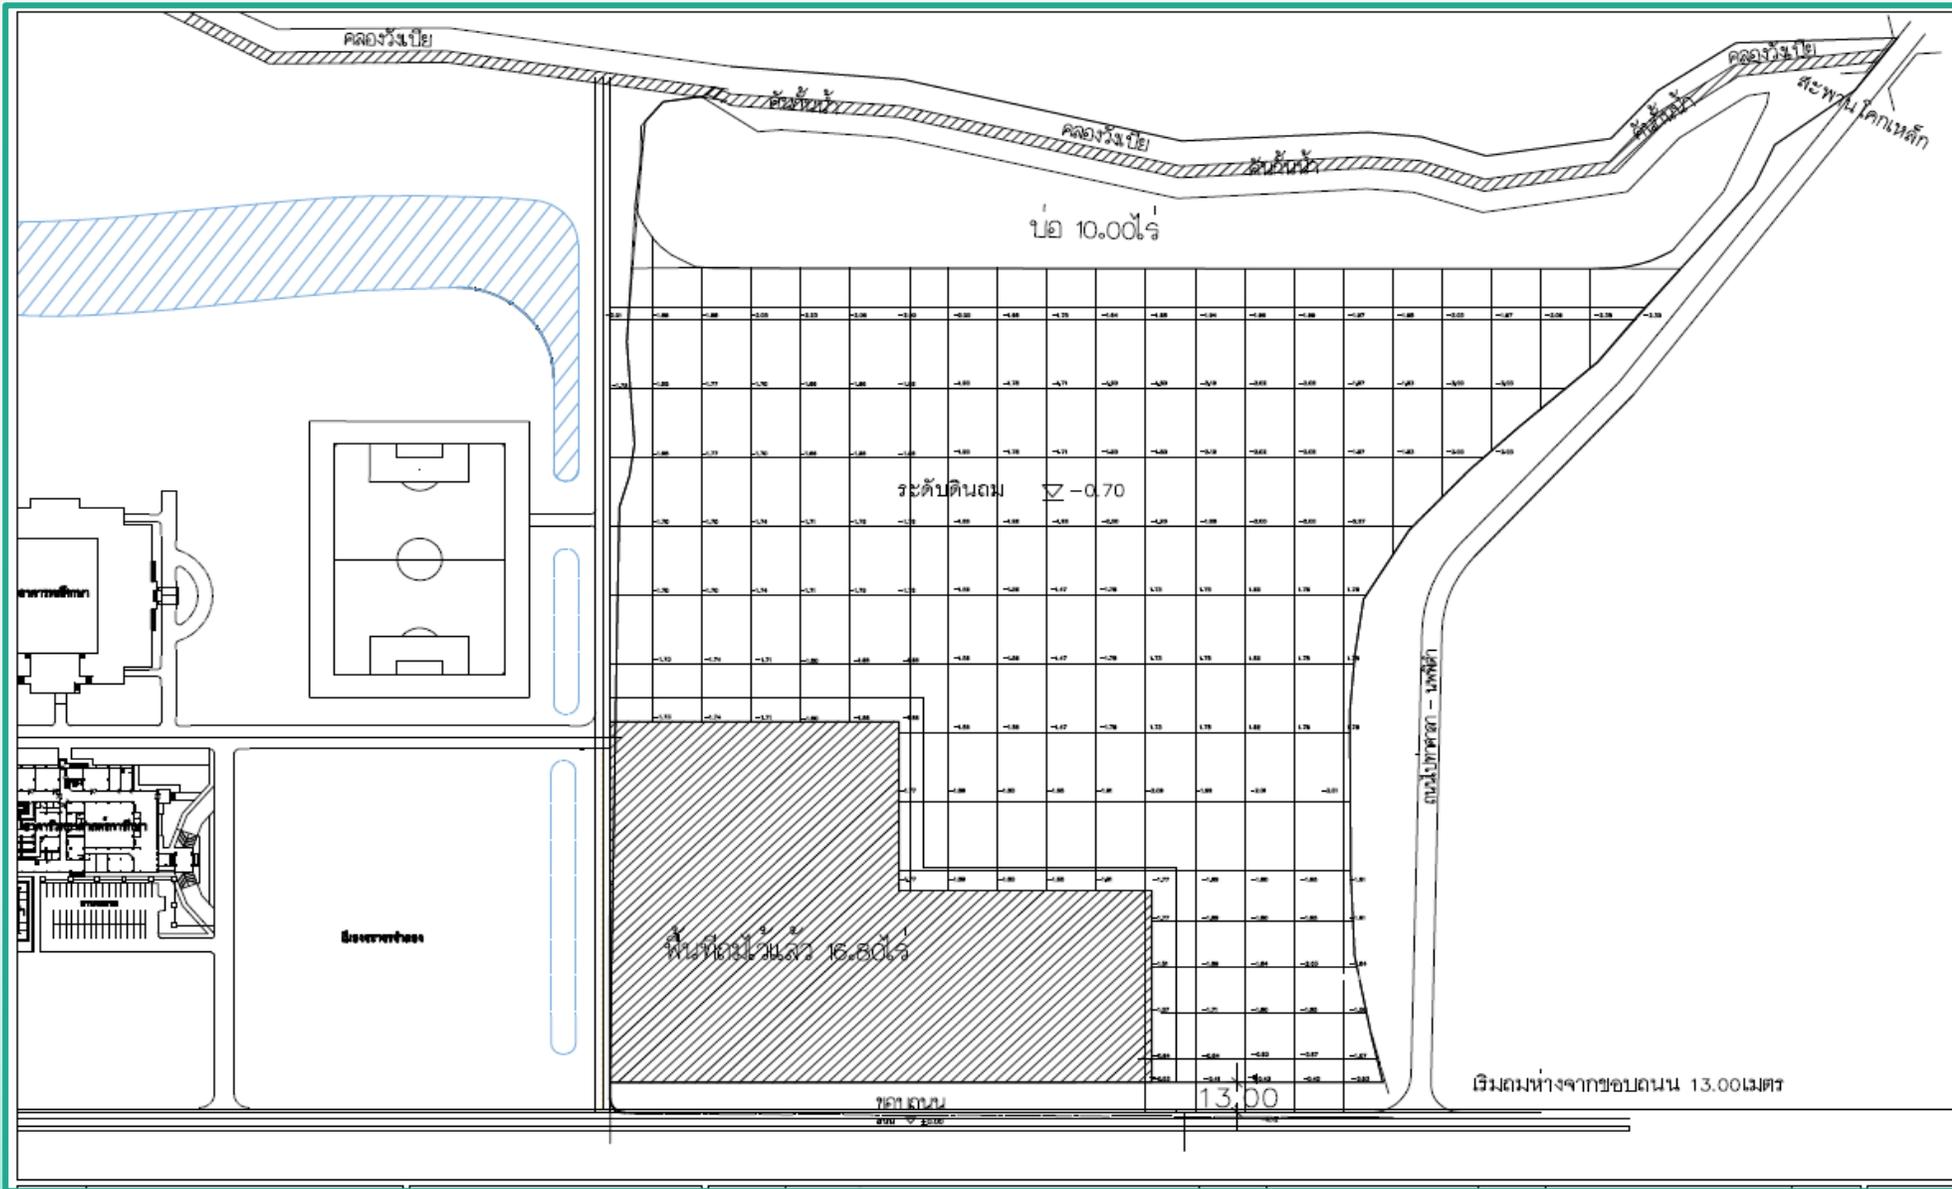

*พื้นที่ขุดบ่อดิน 10 ไร่ ลึก 8 เมตร

*พื้นที่ถมดิน 50 ไร่ สูง 1.2 เมตร

ระดับดินเดิม -1.90 ระดับดินถม -0.70 เมตร)

*ปริมาตรดินถม 100,000 ลบ.ม.



ความก้าวหน้างาน

- งานถมดิน 95 %
- งานปรับระดับอยู่ระหว่างดำเนินการ



- ระดับดิน ที่พักคนงาน ต่ำกว่า ระดับดินถนนอยู่ 40 ซม.
- กองดินหลังที่พักคนงาน 2,400 ลบ.ม. (80*60*0.5 ม.)

2

โครงการงานจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาากลางตุมปัง



3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เอกرنซ์ เพ็นท์ จำกัด
023/2566 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 65
22,169,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



1 ก.พ. 67 – 10 มี.ค. 68 (404 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 3)
386 วัน (98.61%)
18 วัน (1.39%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



100%
8/8 งวด (พรจ. ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ)
10 คน



โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ความก้าวหน้างานภายนอก





โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ความก้าวหน้างานภายนอก



3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6




ความก้าวหน้างานห้องน้ำ ชั้น 1 และ 2



3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ชั้น 1 โซนด้านหน้า โถงทางเข้า และสำนักงาน

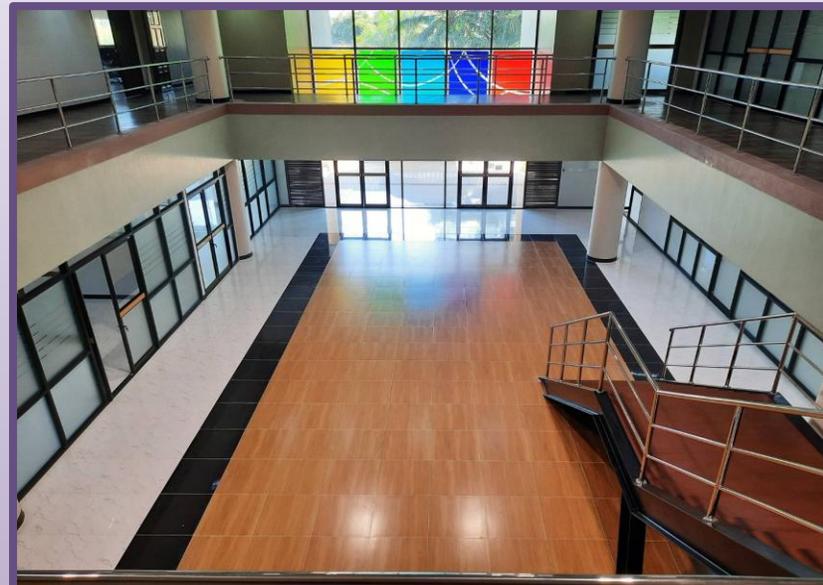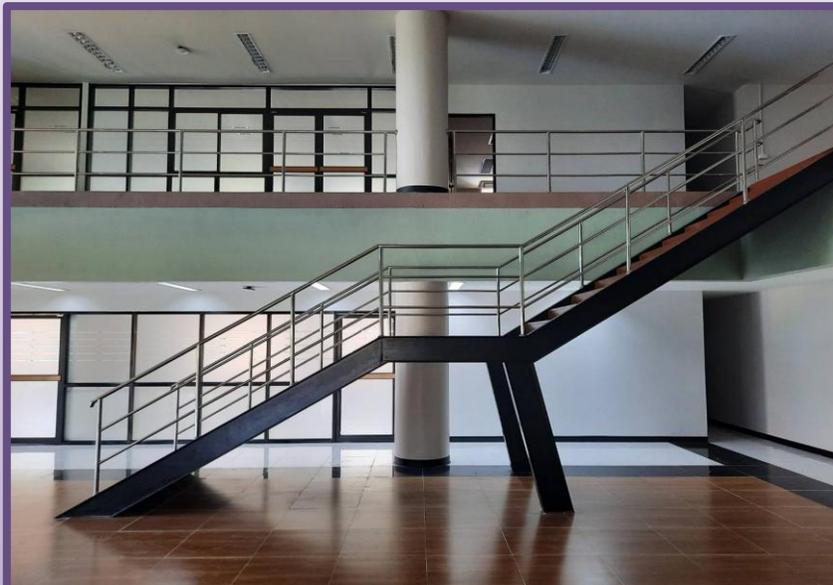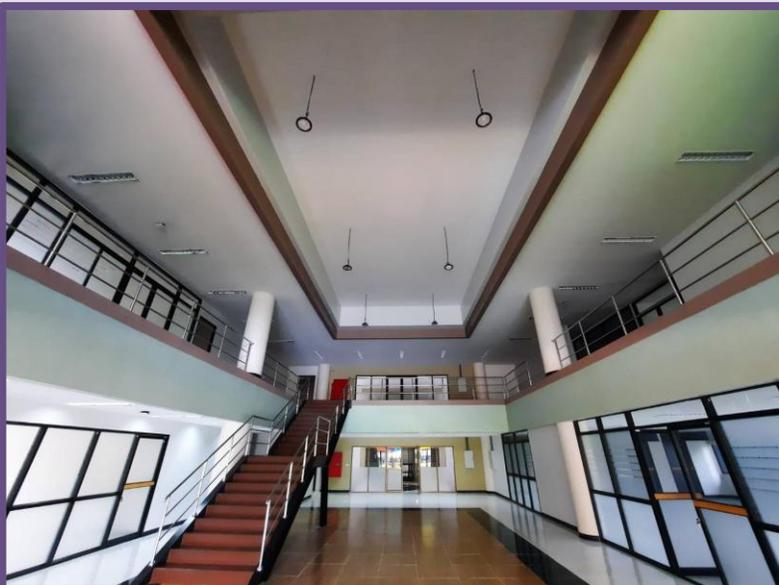

ชั้น 1 โชนกลางและหลัง ห้องทำงานอาจารย์ 47 ห้อง (2.7*4.6 =12.5)





โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6


ชั้น 1 โซนกลางและหลัง ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง








โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ชั้น 1 ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

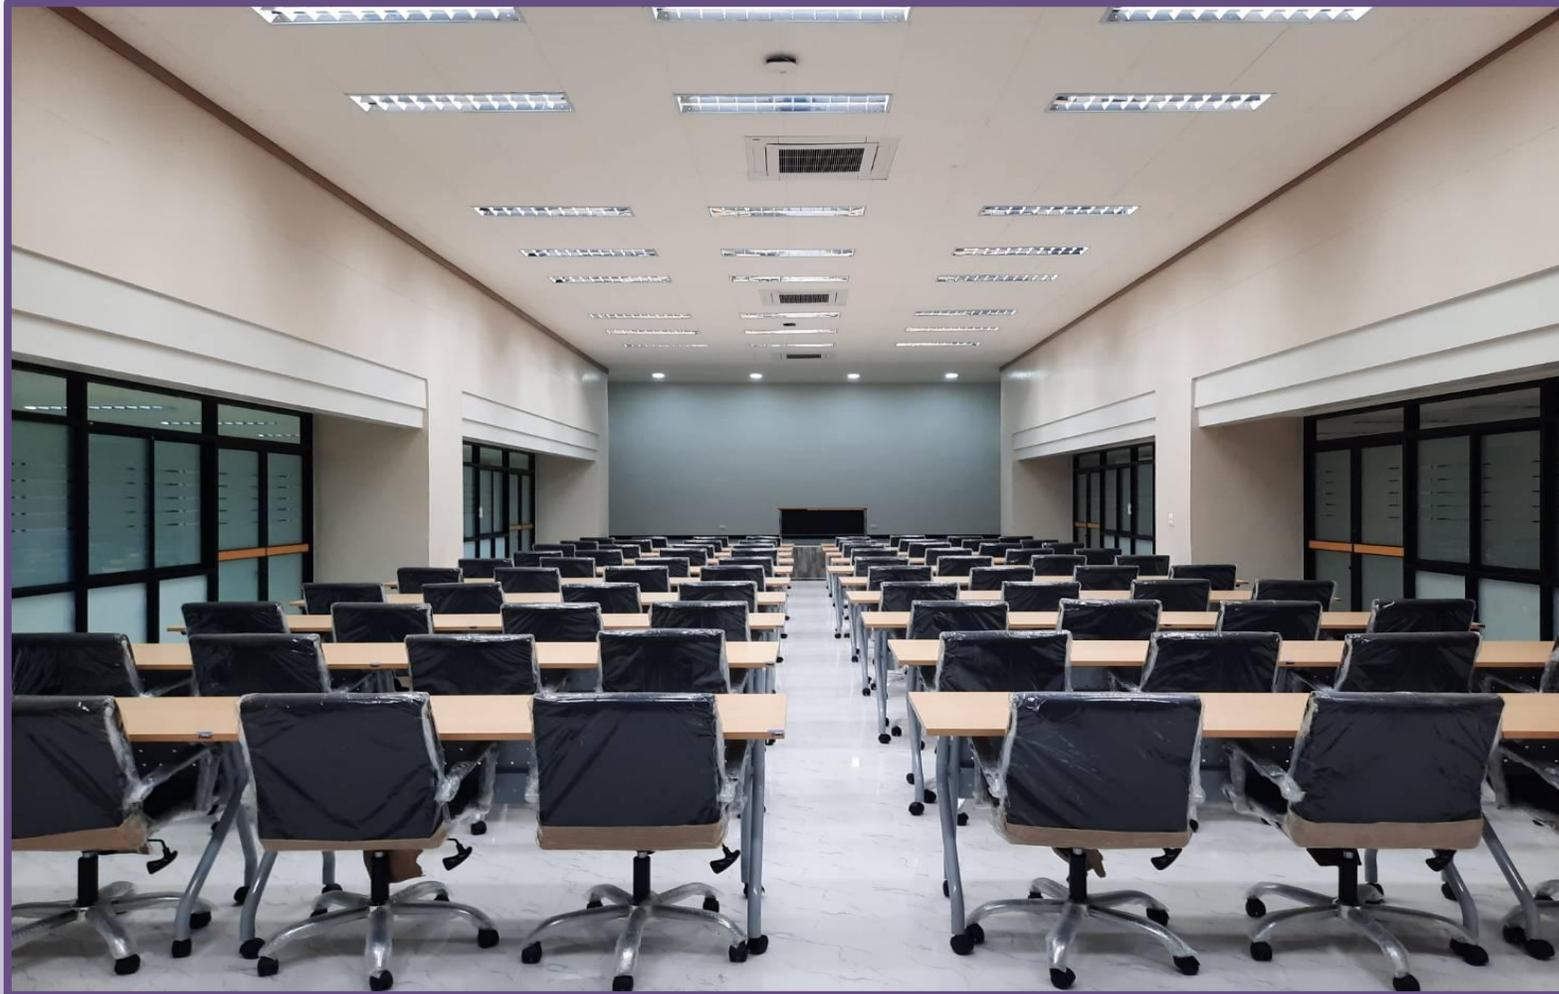


ชั้น 1 โชนกลางและหลัง บันได และ โถง

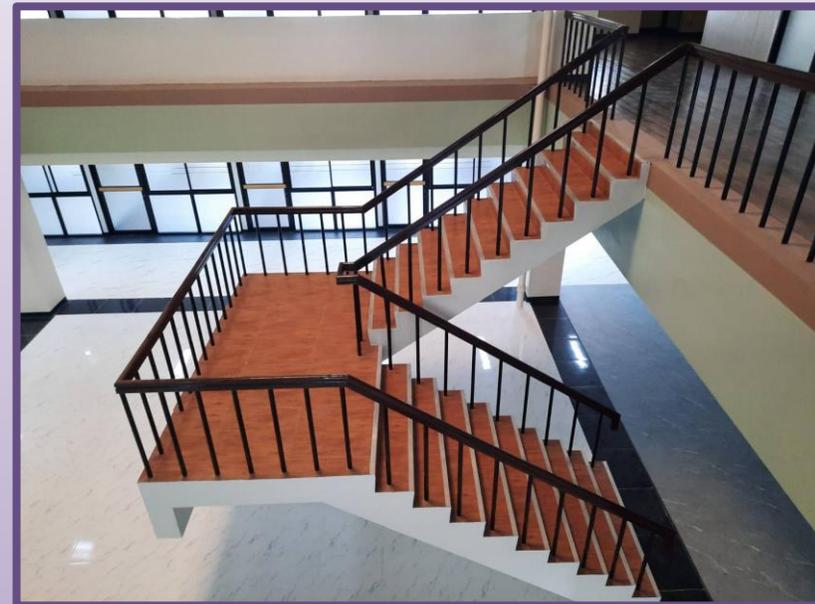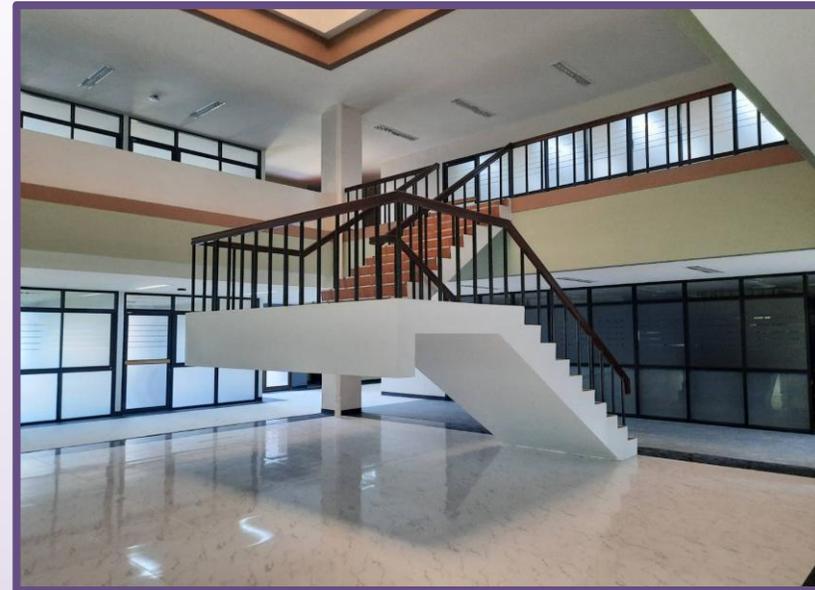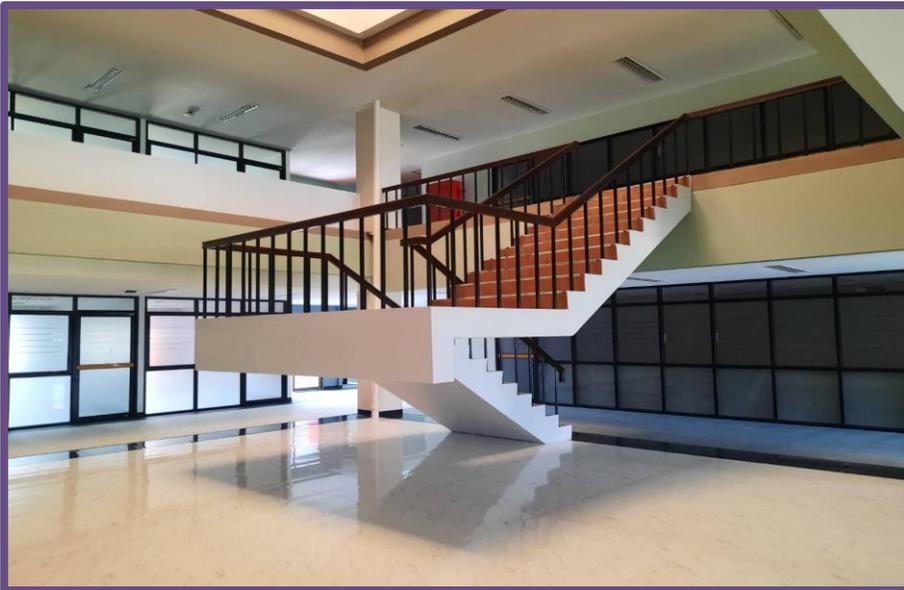

3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ชั้น 2 โซนด้านหน้า โถงทางเดิน ห้องทำงานคณบดี รองคณบดี

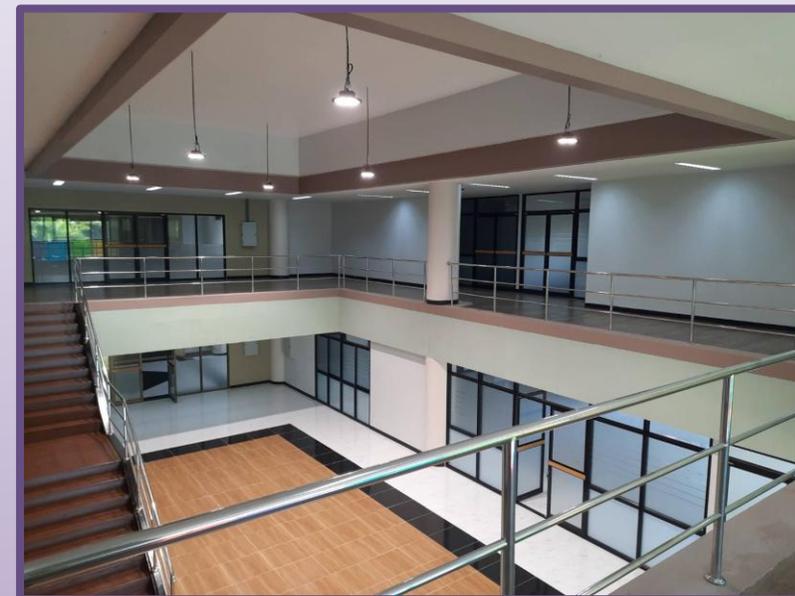

3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6


ชั้น 2 โซนด้านหน้า โถงทางเดิน ห้องทำงานคณบดี รองคณบดี



3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ชั้น 2 โชนกลางและหลัง ห้องทำงานอาจารย์ 47 ห้อง

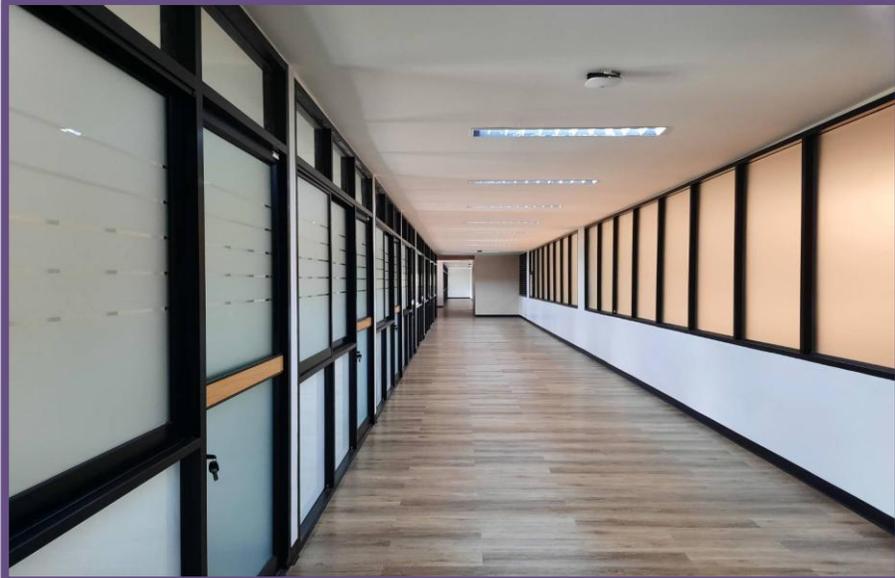




โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ชั้น 2 โซนกลางและหลัง ห้องประชุมเล็ก 2 ห้อง







ส่วนต่อเติมด้านทิศเหนือ วิชาการศึกษา 7

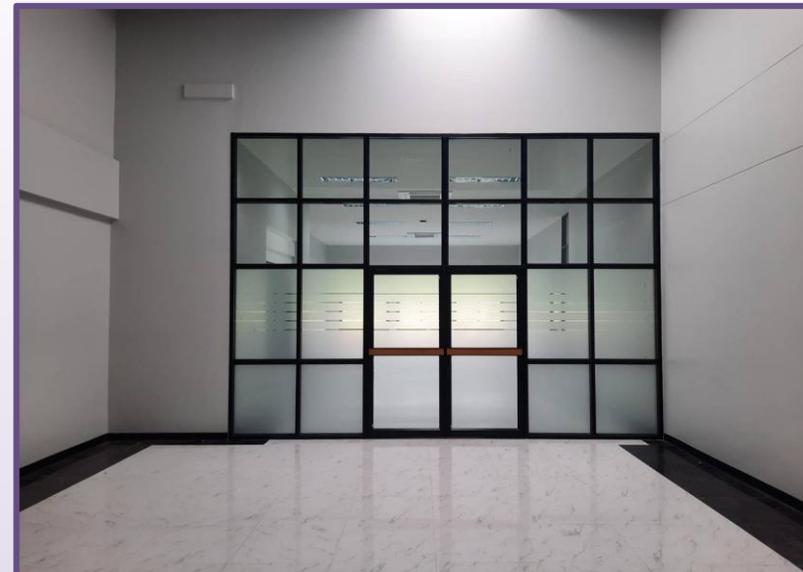


3

โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6

ส่วนต่อเติมด้านทิศใต้ วิชาการ 5

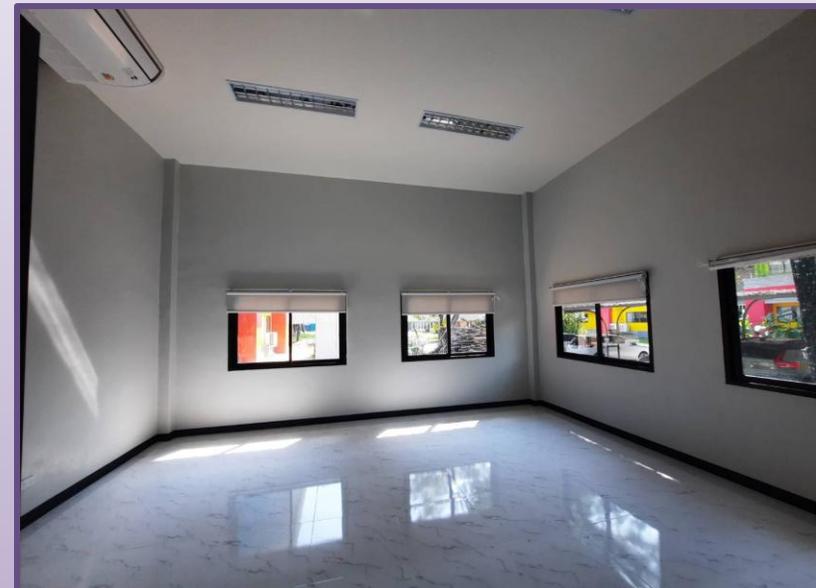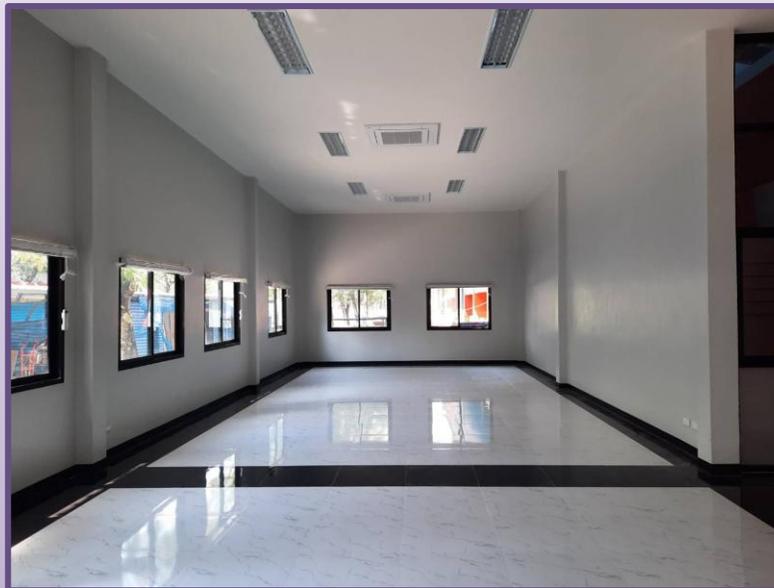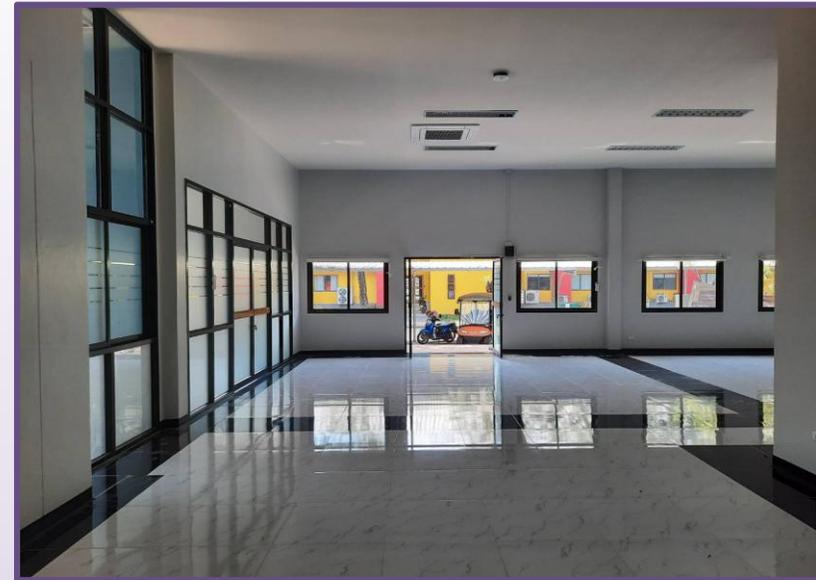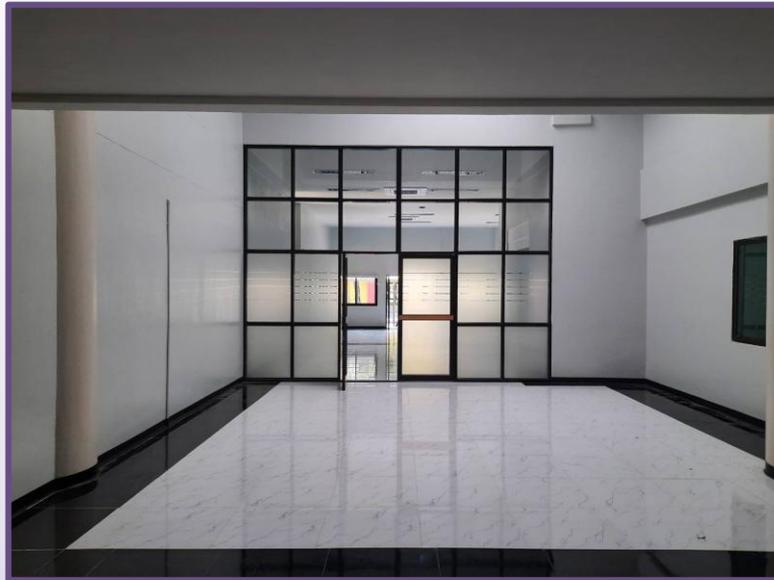



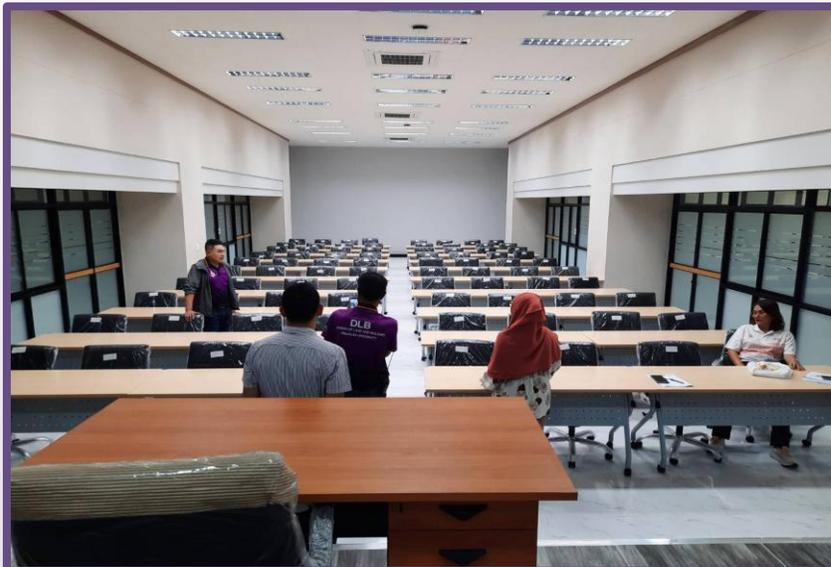

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เหล็กตริง จำกัด
217/2566 ลงวันที่ 22 พ.ค. 66
128,401,370.44 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



23 พ.ค. 66 – 28 เม.ย. 68 (707 วัน)
641 วัน (90.66%)
66 วัน (9.34%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



79.50%
12/18 งวด
130 คน



4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานระหว่างเดือน



352 ห้อง = 76+92+92+92

2 ห้องชั้น = (8+1) * 2

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานระหว่างเดือน







4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C



ความก้าวหน้างาน ห้องพักนักศึกษา ชั้น 1


- งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ความก้าวหน้า 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้อง ความก้าวหน้า 100 %
- งานพาดาน ความก้าวหน้า 100 %
- งานติดตั้งประตู+หน้าต่าง ความก้าวหน้า 95 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ความก้าวหน้า 100 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 90 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 90 %
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ความก้าวหน้า 100 %

352 ห้อง = 76+92+92+92

2 ห้องชัก = (8+1) * 2

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

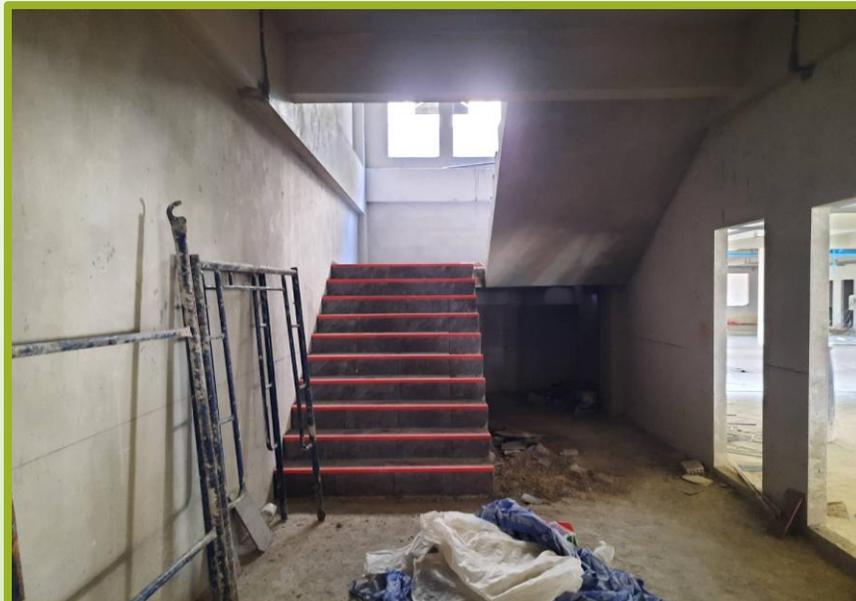

ความก้าวหน้างาน โถงทางเดิน ชั้น 1

- งานฉาบปูนผนัง ความก้าวหน้า 95 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นทางเดิน ความก้าวหน้า 40 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 80 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 80 %

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C




ความก้าวหน้างาน
ห้องพักนักศึกษา ชั้น 2



- งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ความก้าวหน้า 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้อง ความก้าวหน้า 100 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 100 %
- งานติดตั้งประตู+หน้าต่าง ความก้าวหน้า 95 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ความก้าวหน้า 50 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 80 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 90 %
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ความก้าวหน้า 92 %

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

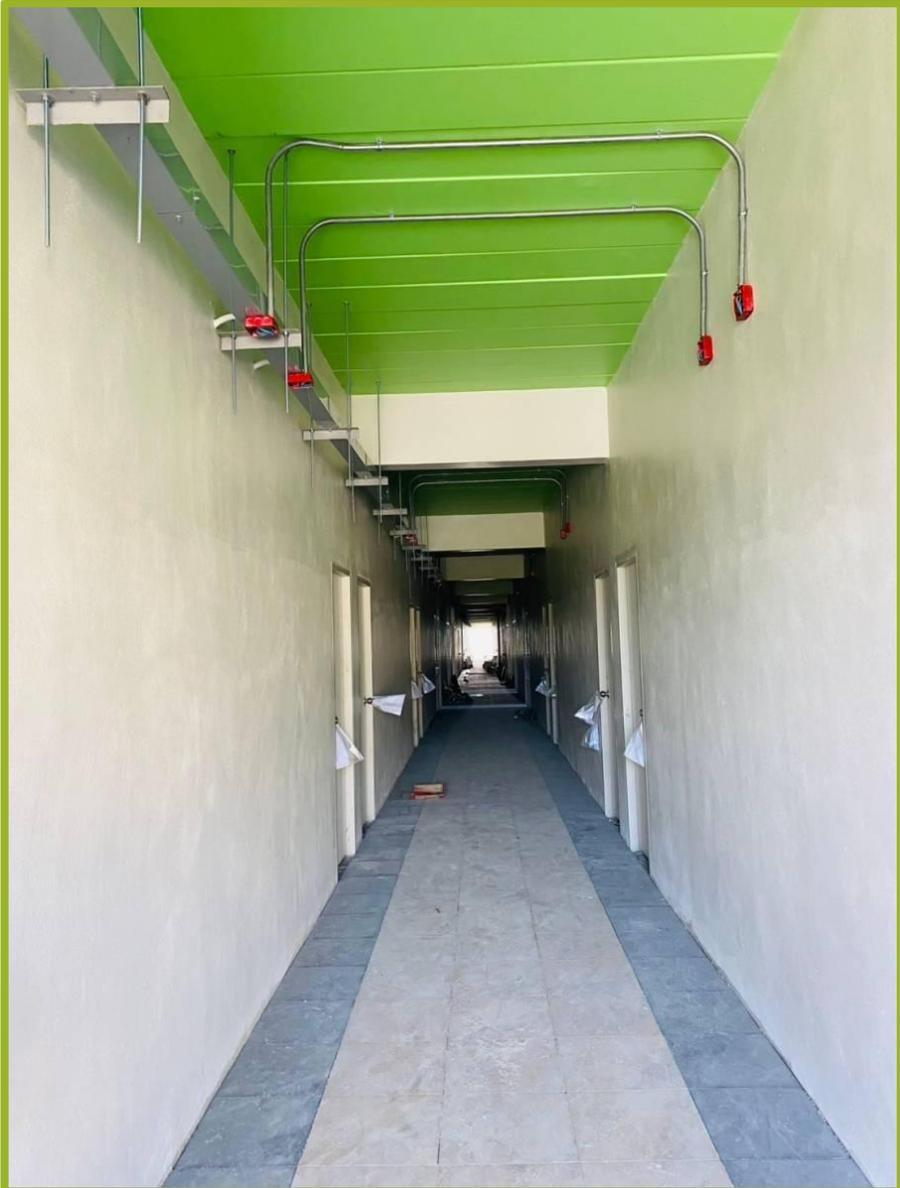


ความก้าวหน้างาน โถงทางเดิน ชั้น 2

- งานฉาบปูนผนัง ความก้าวหน้า 98 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นทางเดิน ความก้าวหน้า 100 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 80 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 84 %

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

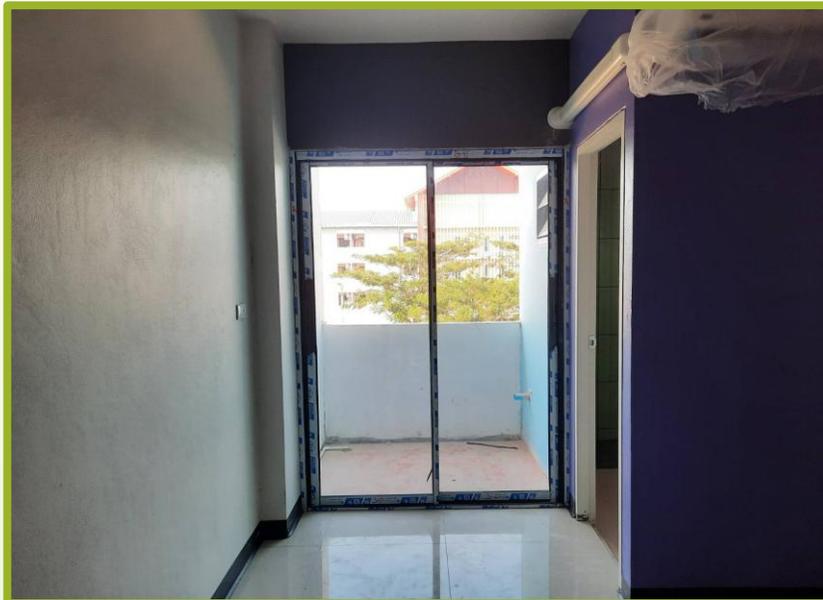

ความก้าวหน้างาน ห้องพักนักศึกษา ชั้น 3

- งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ความก้าวหน้า 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้อง ความก้าวหน้า 100 %
- งานพิน้ำพาดาน ความก้าวหน้า 100 %
- งานติดตั้งประตู+หน้าต่างต่าง ความก้าวหน้า 68 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ความก้าวหน้า 0 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 65 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 55 %
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ความก้าวหน้า 80 %

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C




ความก้าวหน้างาน โถงทางเดิน ชั้น 3

- งานฉาบปูนผนัง ความก้าวหน้า 98 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นทางเดิน ความก้าวหน้า 50 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 65 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 50 %

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

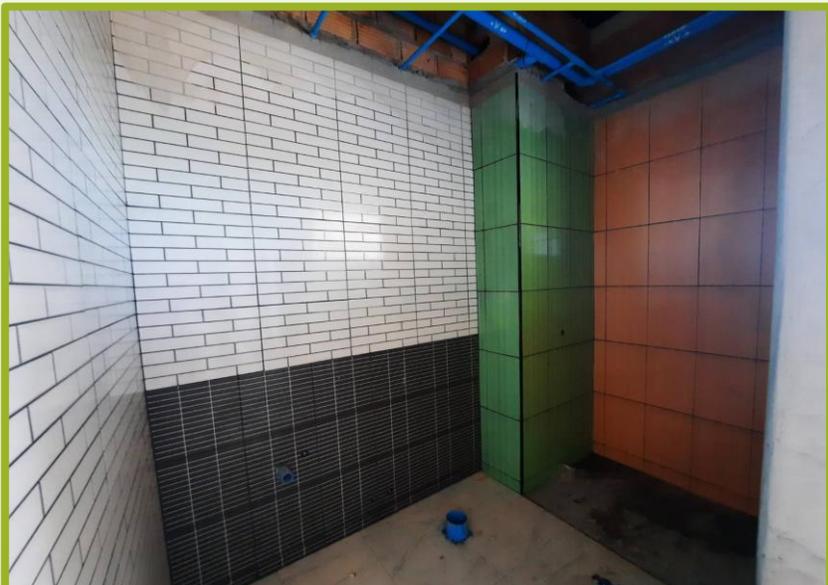


ความก้าวหน้างาน ห้องพักนักศึกษา ชั้น 4

- งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ความก้าวหน้า 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้อง ความก้าวหน้า 95 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 80 % (ห้องพัก 100 %)
- งานติดตั้งประตู+หน้าต่าง ความก้าวหน้า 12 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ความก้าวหน้า 0 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 28 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 50 %
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ความก้าวหน้า 0 %

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

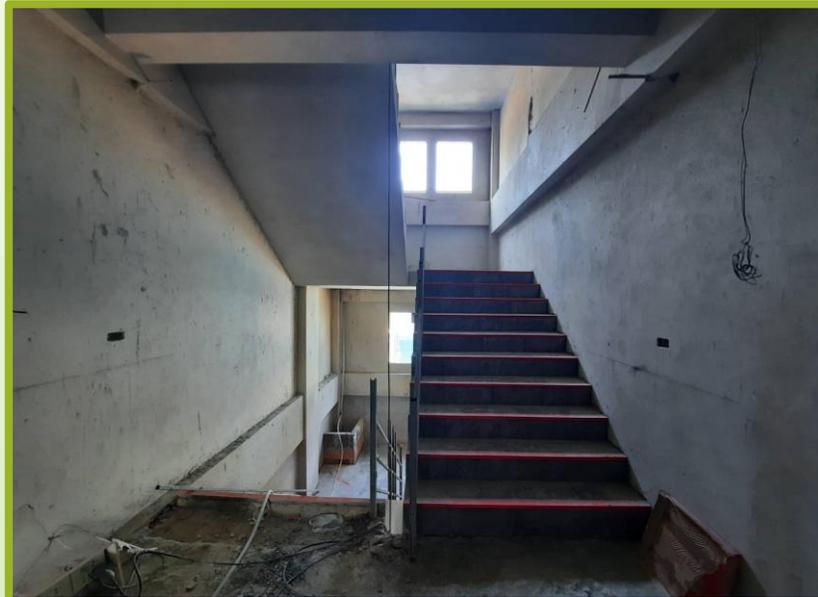ความก้าวหน้างาน
โถงทางเดิน ชั้น 4

- งานฉาบปูนผนัง ความก้าวหน้า 98 %
- งานฝ้าเพดาน ความก้าวหน้า 0 %
- งานปูกระเบื้องพื้นทางเดิน ความก้าวหน้า 20 %
- งานทาสี ความก้าวหน้า 28 %
- งานระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้า 0 %

4

โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C




ความก้าวหน้างาน งานภายนอก

1. งานฉาบปูนผนังภายนอก แล้วเสร็จ 100 %
2. งานทาสีผนังภายนอก แล้วเสร็จ 80 %
3. งานติดตั้งฟ้าพาดานภายนอก แล้วเสร็จ 100 %
4. งานวางท่อระบายน้ำฝน+บ่อพัก แล้วเสร็จ 80 %

งานงวดที่ 13 ส่งแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ

	รายละเอียดและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	กำหนดแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า
1	งานปูพื้นโถงทางเดินชั้น 1	15 มี.ค. 68	40%
2	งานปูพื้นทางเดินชั้น 2,3,4 (ชั้น2 100% , ชั้น3 50%)	7 มี.ค. 68	45%
3	งานปูพื้นโถงบันได ชั้น 1,2 ,3 ,4	28 ก.พ. 68	42%
4	งานฝ้าเพดานทางเดิน ชั้น 4	15 มี.ค. 68	-
5	งานติดตั้งฝ้าในห้องน้ำ ชั้น 4	28 ก.พ. 68	-
6	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ (ชั้น2 50%)	31 มี.ค. 68	37.5%
7	งานติดตั้งซิ้งค์ล้างจานที่ระเปียง	31 มี.ค. 68	-
8	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ชั้น1 100% , ชั้น2 92% , ชั้น3 80%)	7 เม.ย. 68	68%
9	งานก่อสร้างห้องซักผ้าทั้ง 2 ฟัง	31 มี.ค. 68	5%
10	งานติดตั้งคอมไพหลอดไฟ พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ (ชั้น1 80% , ชั้น2 84% , ชั้น3 40%)	15 เม.ย. 68	51%
11	งานทาสีภายใน-ภายนอก พร้อมเก็บรายละเอียด	20 เม.ย. 68	65%
12	งานภายนอกทั้งหมด ถนน ลานจอดรถ ระบบระบายน้ำ	20 เม.ย. 68	5%
13	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	31 มี.ค. 68	0%
14	เก็บรายละเอียดและงาน อื่นๆ	25 เม.ย. 68	-

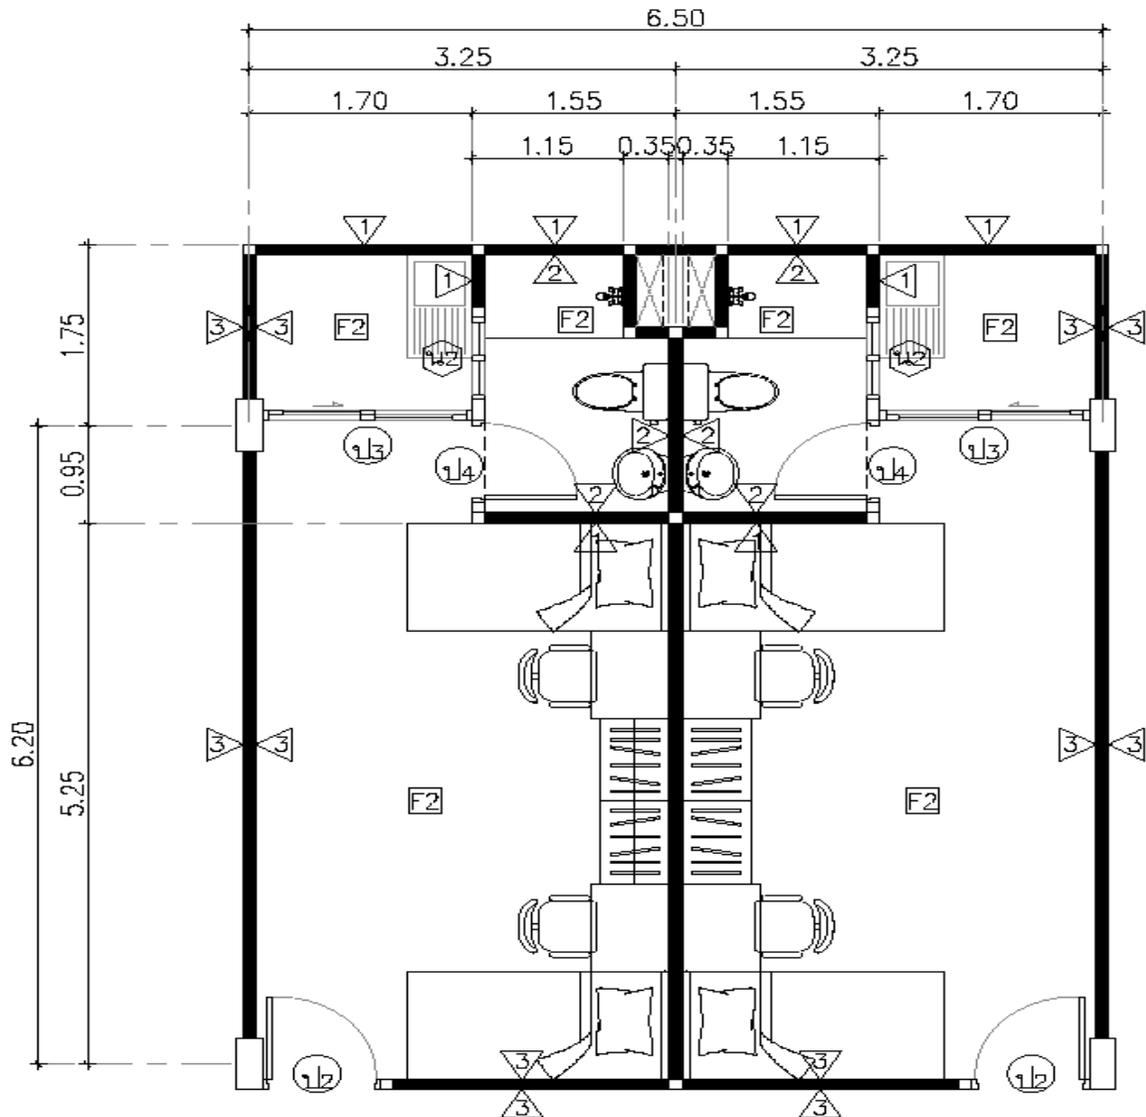


รายการประกอบแบบ

- F1 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40X40 cm. (ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี) พร้อมบัวยาว 10 cm.
- F2 = พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 40X40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 1 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- 2 = ผนังท่อน้ำกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40X40 cm.(ราคากระเบื้องตารางเมตรละ 235 บ.รวมภาษี)
- 3 = ผนังก่ออิฐมวลเบา 8 รู (อิฐท้องถิ่น) ฉาบปูนเรียบทาสี
- C1 = งานแต่งแนวท่อน้ำสำเร็จรูป พร้อมทาสี (ชั้น 1-3)
- C3 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานชั้น 4)
- C4 = ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงโครง T-BAR ขนาด 60X60 cm.เหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1-3)
- C5 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 4)


** หมายเหตุ ** -สีทามันให้ใช้สีทนสภาวะอากาศ ชนิดกึ่งเงา และมี มอก.
-ระดับฝ้าเพดานโถงทางเดิน และห้องพักชั้น 4 +3.00 m.

แบบแปลนขยายห้องพัก
มาตราส่วน 1:100

จำนวน 352 ห้อง พื้นที่ 26 ตร.ม.
ห้องนอน 19 ตร.ม. ห้องน้ำ 4 ตร.ม.
ระเบียง 3 ตร.ม. ฝ้าเพดาน 2.6 ม.
76+92+92+92=352

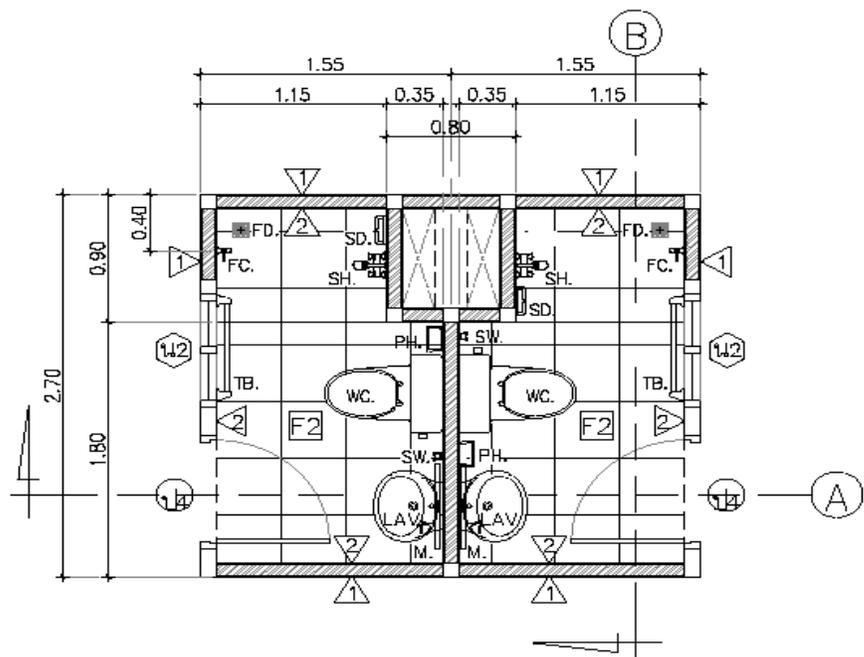

แปลนพื้นห้องน้ำ
ขนาดส่วน 1:100

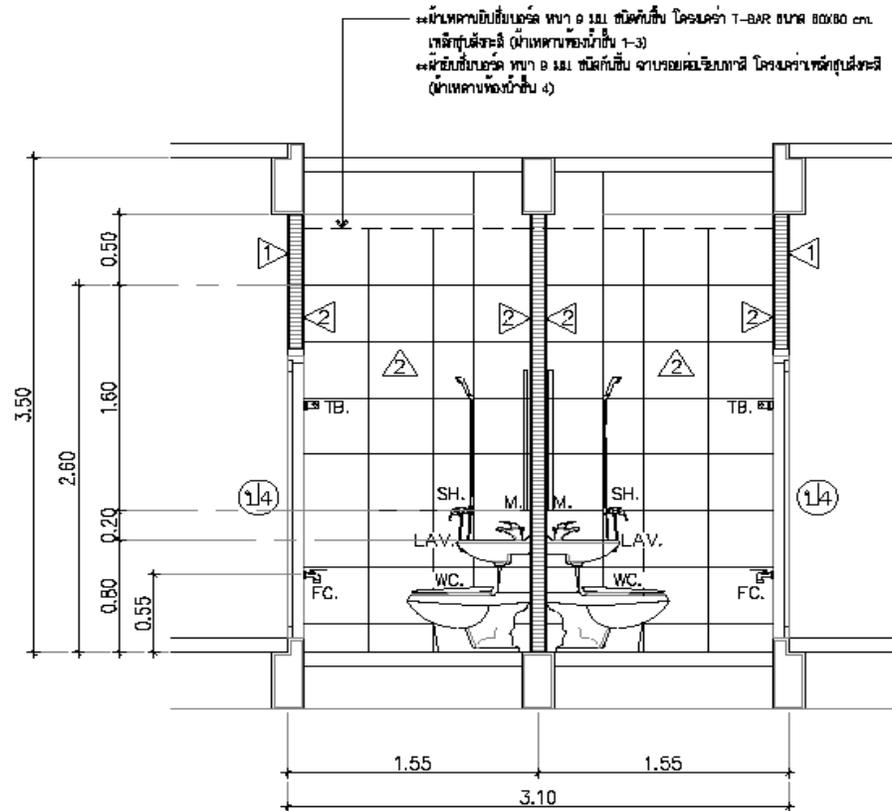

แบบขยายรูปตัด
ขนาดส่วน 1:100

สีภายในห้องพัก อาคาร WU RESIDENCE C

ชั้นที่	ผนัง.1	ผนัง.2	ผนัง.3	ผนัง.4-กั๊	ผนัง.5
ชั้น.1	066-5 Apple Anne	066-1 Vista of Spring	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rari.	031-5 Blue Cadet
ชั้น.2	039-5 Gen's lake	040-3 Seaside Vista	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rari.	031-5 Blue Cadet
ชั้น.3	009-5 Purple Parade	000-4 Purple Mountain	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rari.	031-5 Blue Cadet
ชั้น.4	173-5 Fox Hunt	170-3 Ivory Infinity	140-5 Thorwood	144-1 Emerald E.rari.	031-5 Blue Cadet





โครงการก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C

ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 12





5

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิก และ สถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท คุณทวี จำกัด
61/2567 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 67
65,878,703.73 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



14 มิ.ย. 67 – 8 มิ.ย. 68 (360 วัน)
253 วัน (70.27%)
107 วัน (29.73%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



19.10 %
2/9 งวด
30 คน



5

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์





5

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์



5

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์

ความก้าวหน้างานก่อสร้างเปรียบเทียบระหว่างเดือน





ความก้าวหน้างาน
งานโครงสร้าง

1. งานโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
2. งานระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 95 %
3. งานโครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จ 95 %
4. งานผูกเหล็กคาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 85 %
5. งานเทคอนกรีตคาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 50 %
6. งานพื้น ชั้น 2 อยู่ระหว่างการพลิต เริ่มเข้า
ติดตั้งปลายเดือน ก.พ. 68

หมายเหตุ

งานงวดที่ 3 ส่งได้ประมาณกลาง เดือน มี.ค. 68




โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณ์จำลองทางการแพทย์



- น 48 ย 78
- สำนักงาน ห้องซักประวัติ ห้องปฏิบัติการ
- *พื้นที่ทางเดิน+LAB+ซักประวัติ
- กระบืออง 60*60
- *สำนักงาน +ประชุม กระเบื้องยางลายไม้
- *ฝ้าเพดาน 3.5 ม.

โครงการก่อสร้างอาคารทักษะทางคลินิกและสถานการณจำลองทางการแพทย์

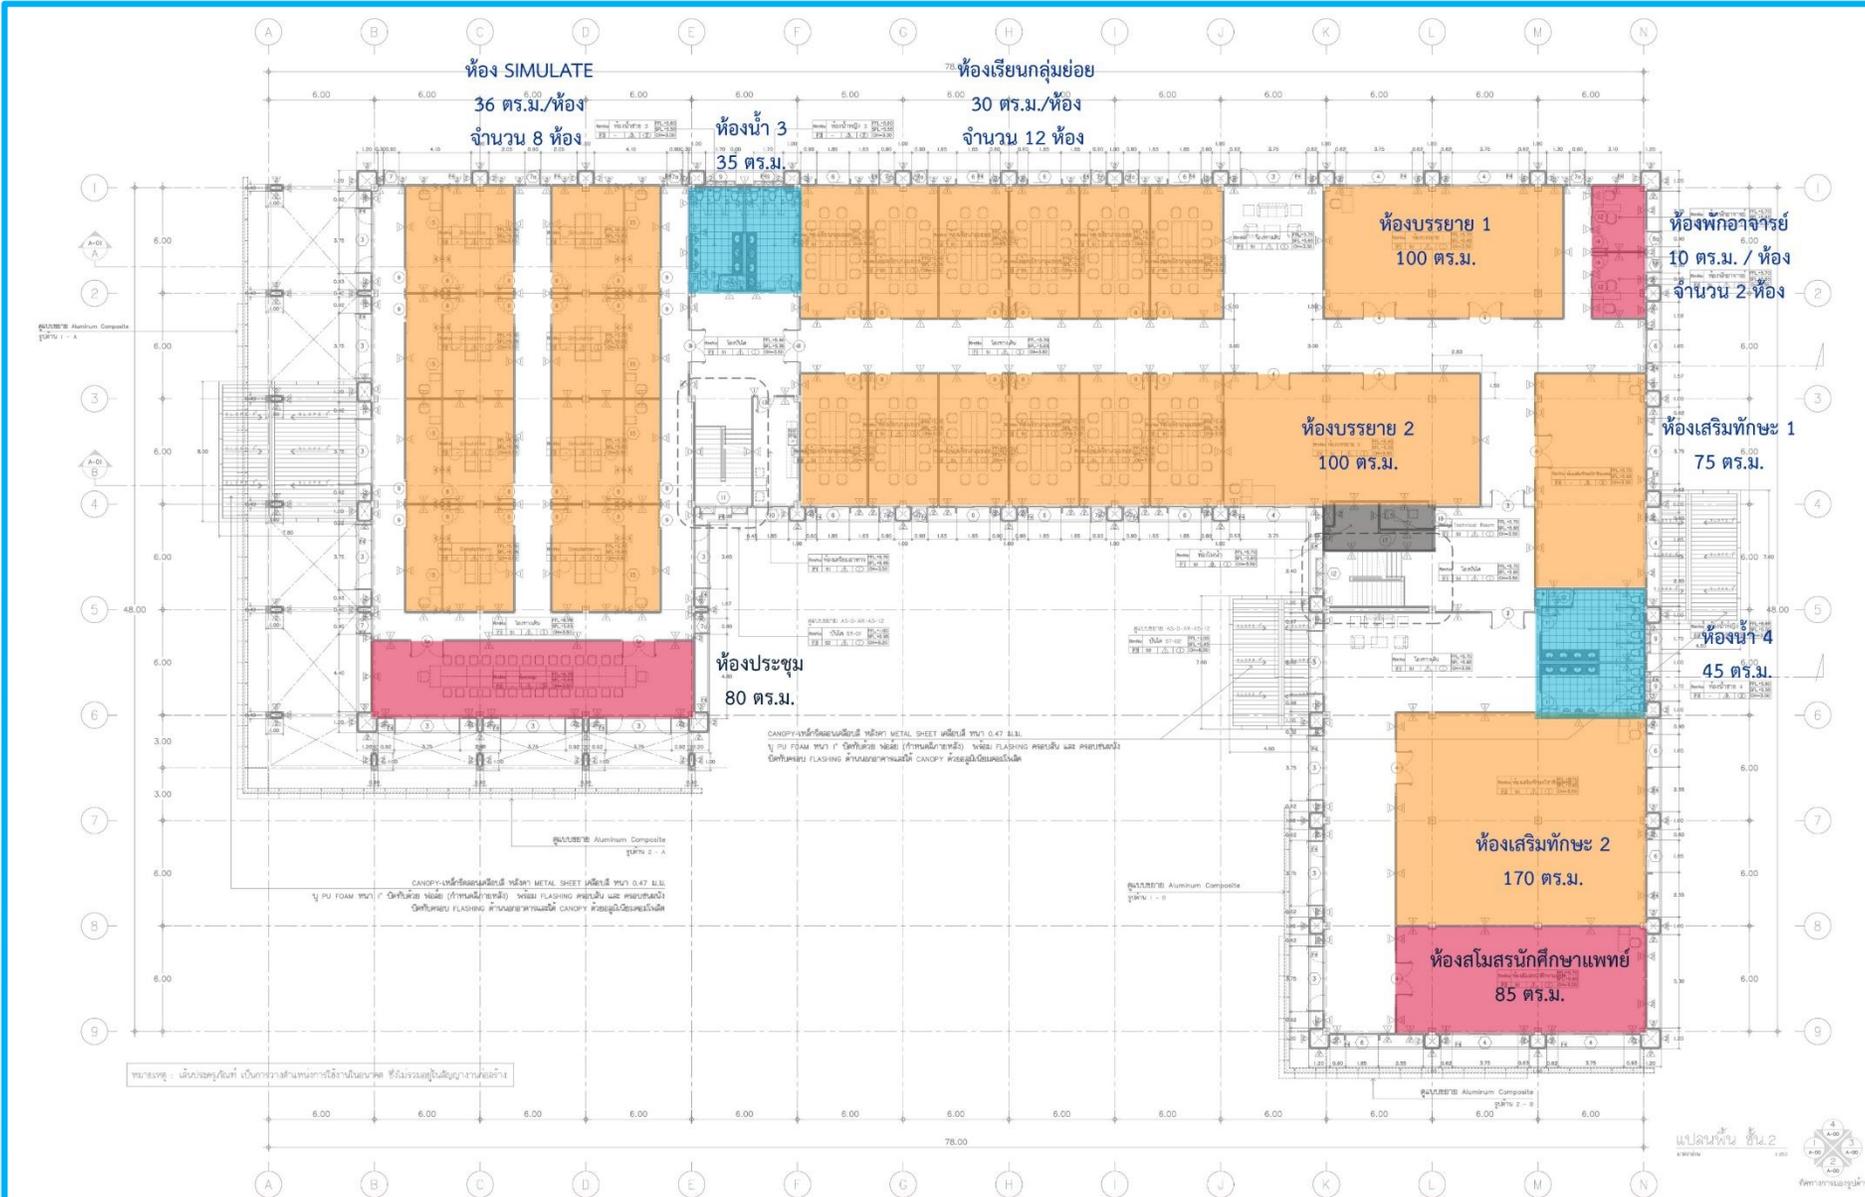

ก 48 ย 78

Simulation ห้องเรียน ห้องบรรยาย

*พื้นทางเดิน กระเบื้อง 60*60

*ห้องเรียน + simulates กระเบื้องยางลายไม้

*ฝ้าเพดาน 3.5 ม.





โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เพอร์เฟค พลัส โซลูชั่น จำกัด
092/2567 ลงวันที่ 04 ก.ค. 67
73,880,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



05 ก.ค. 67 – 08 ส.ค. 68 (400 วัน)
232 วัน (58.00%)
168 วัน (42.00%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



24.10 %
5/12 งวด
18 คน





6

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี




เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน







ความก้าวหน้างาน

1. งานคอนกรีตฐานราก+ตอม่อ แล้วเสร็จ 100 %
2. งานคอนกรีตคาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
3. งานวางท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 95 %
4. งานผูกเหล็กพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จ 100 %
5. งานคอนกรีตพื้น ชั้น 1 แล้วเสร็จ 84 %
6. งานผูกเหล็กเสา ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50 %

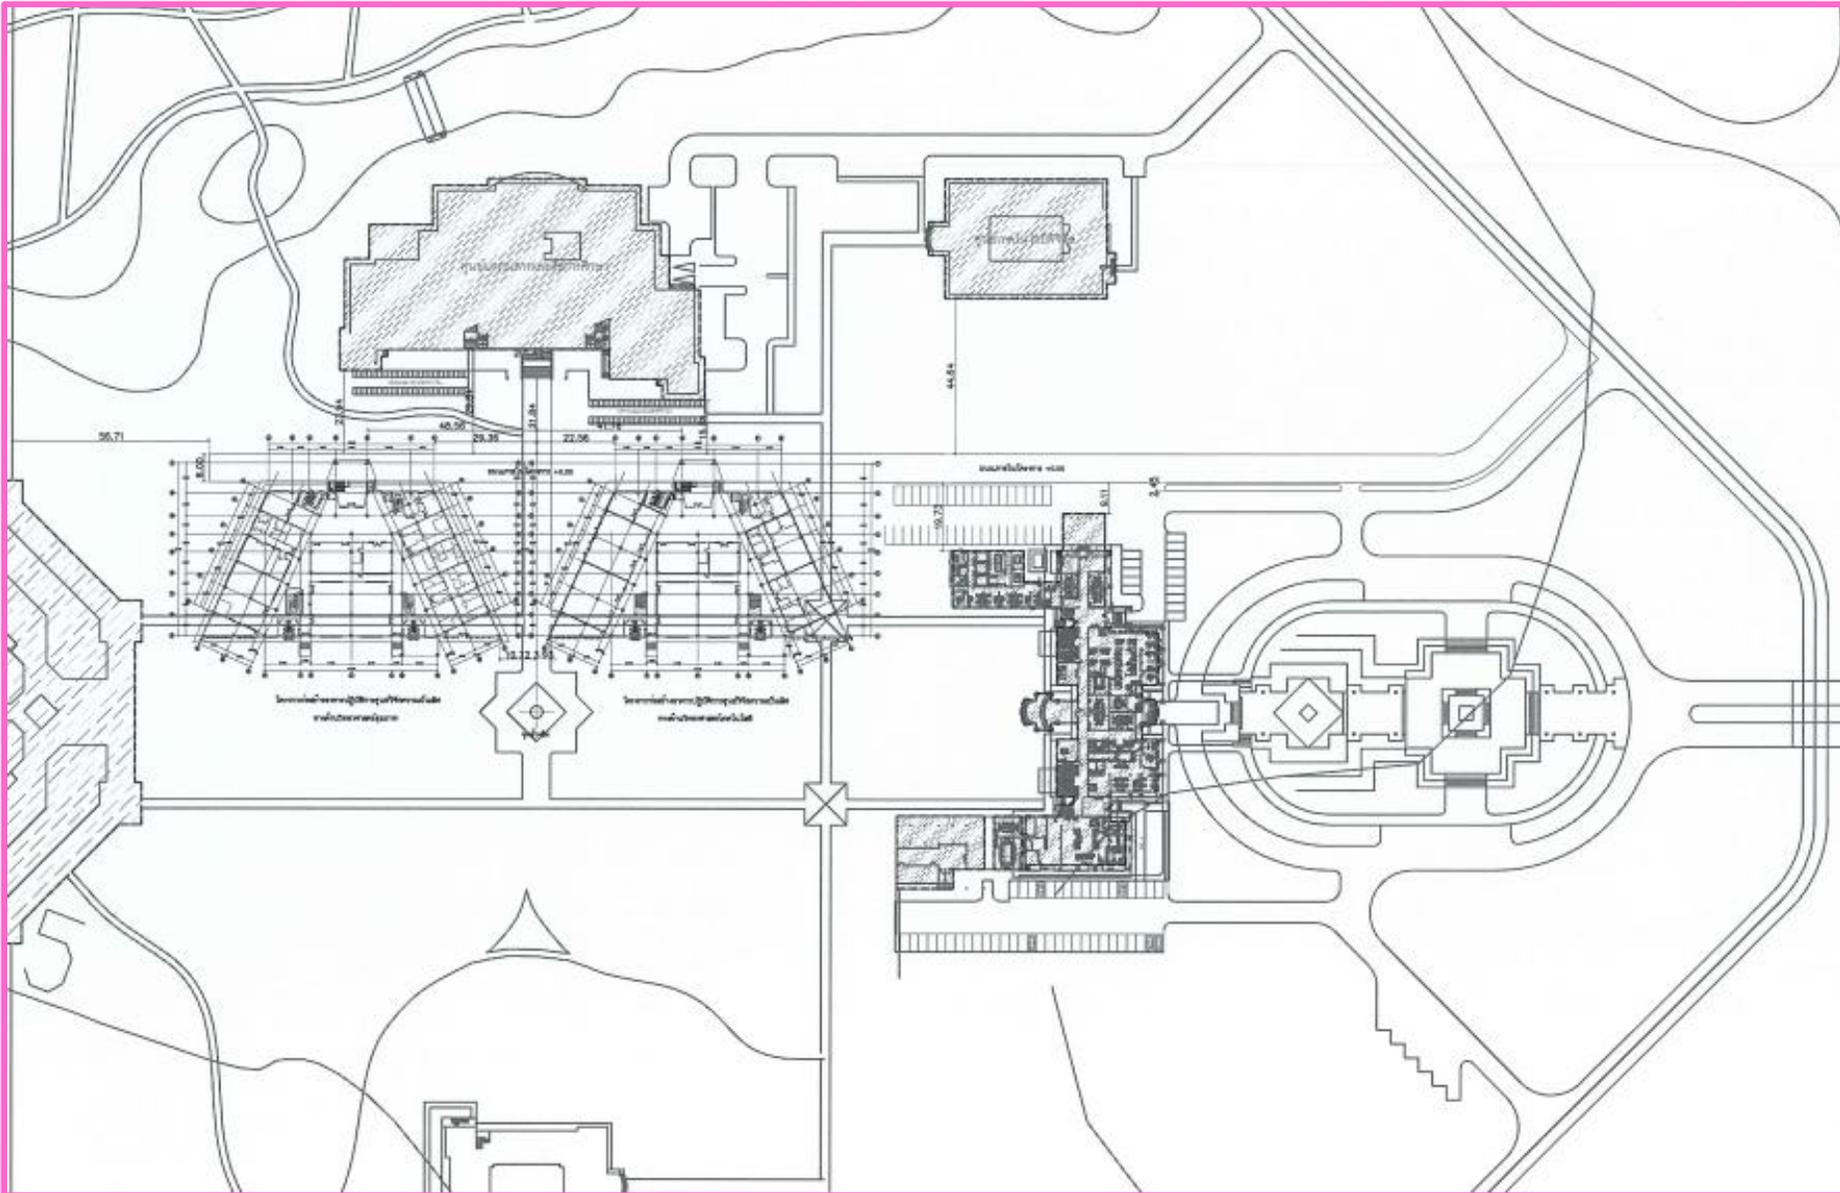

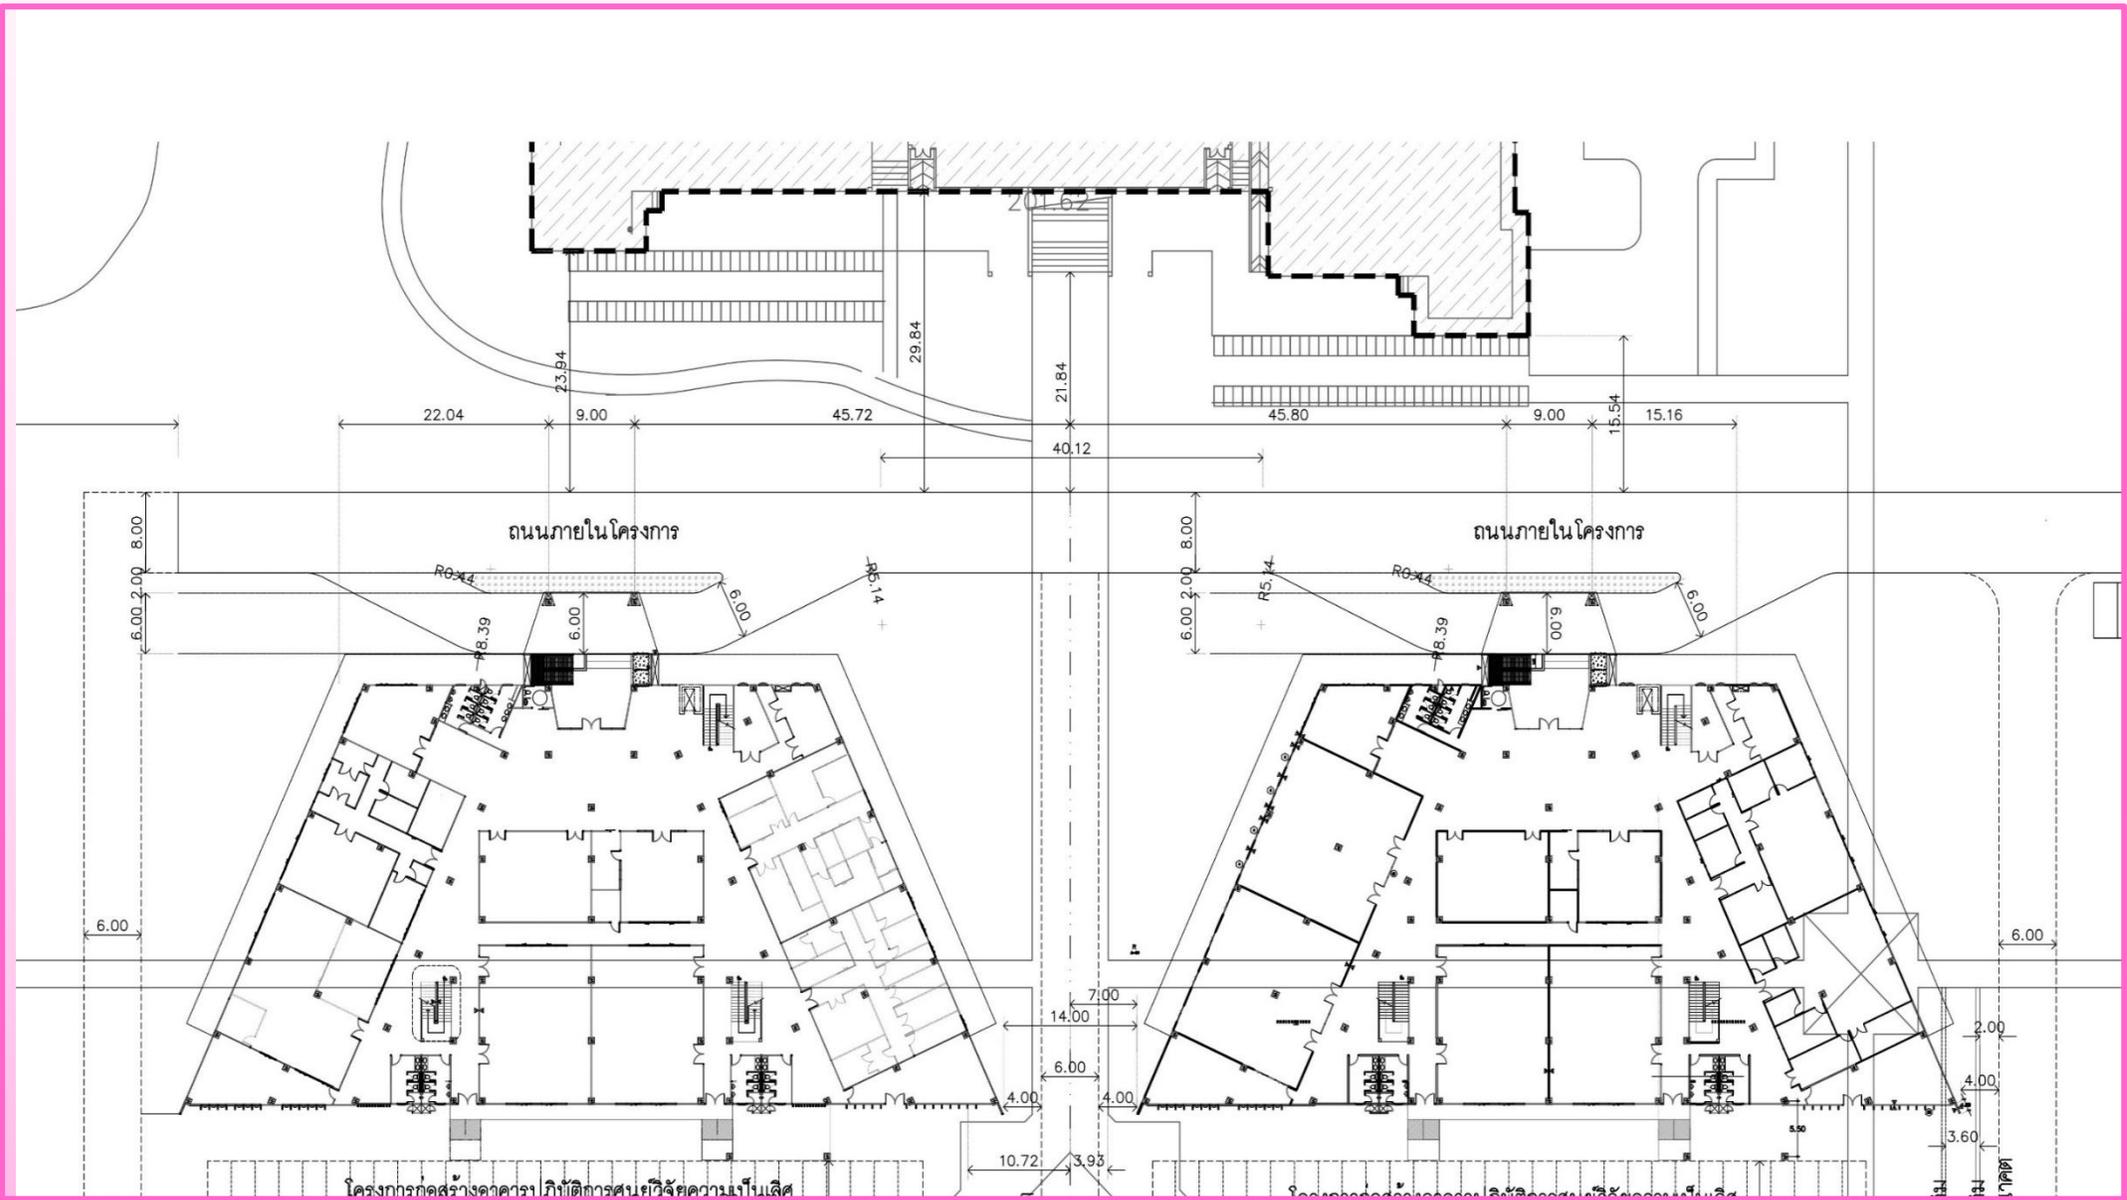

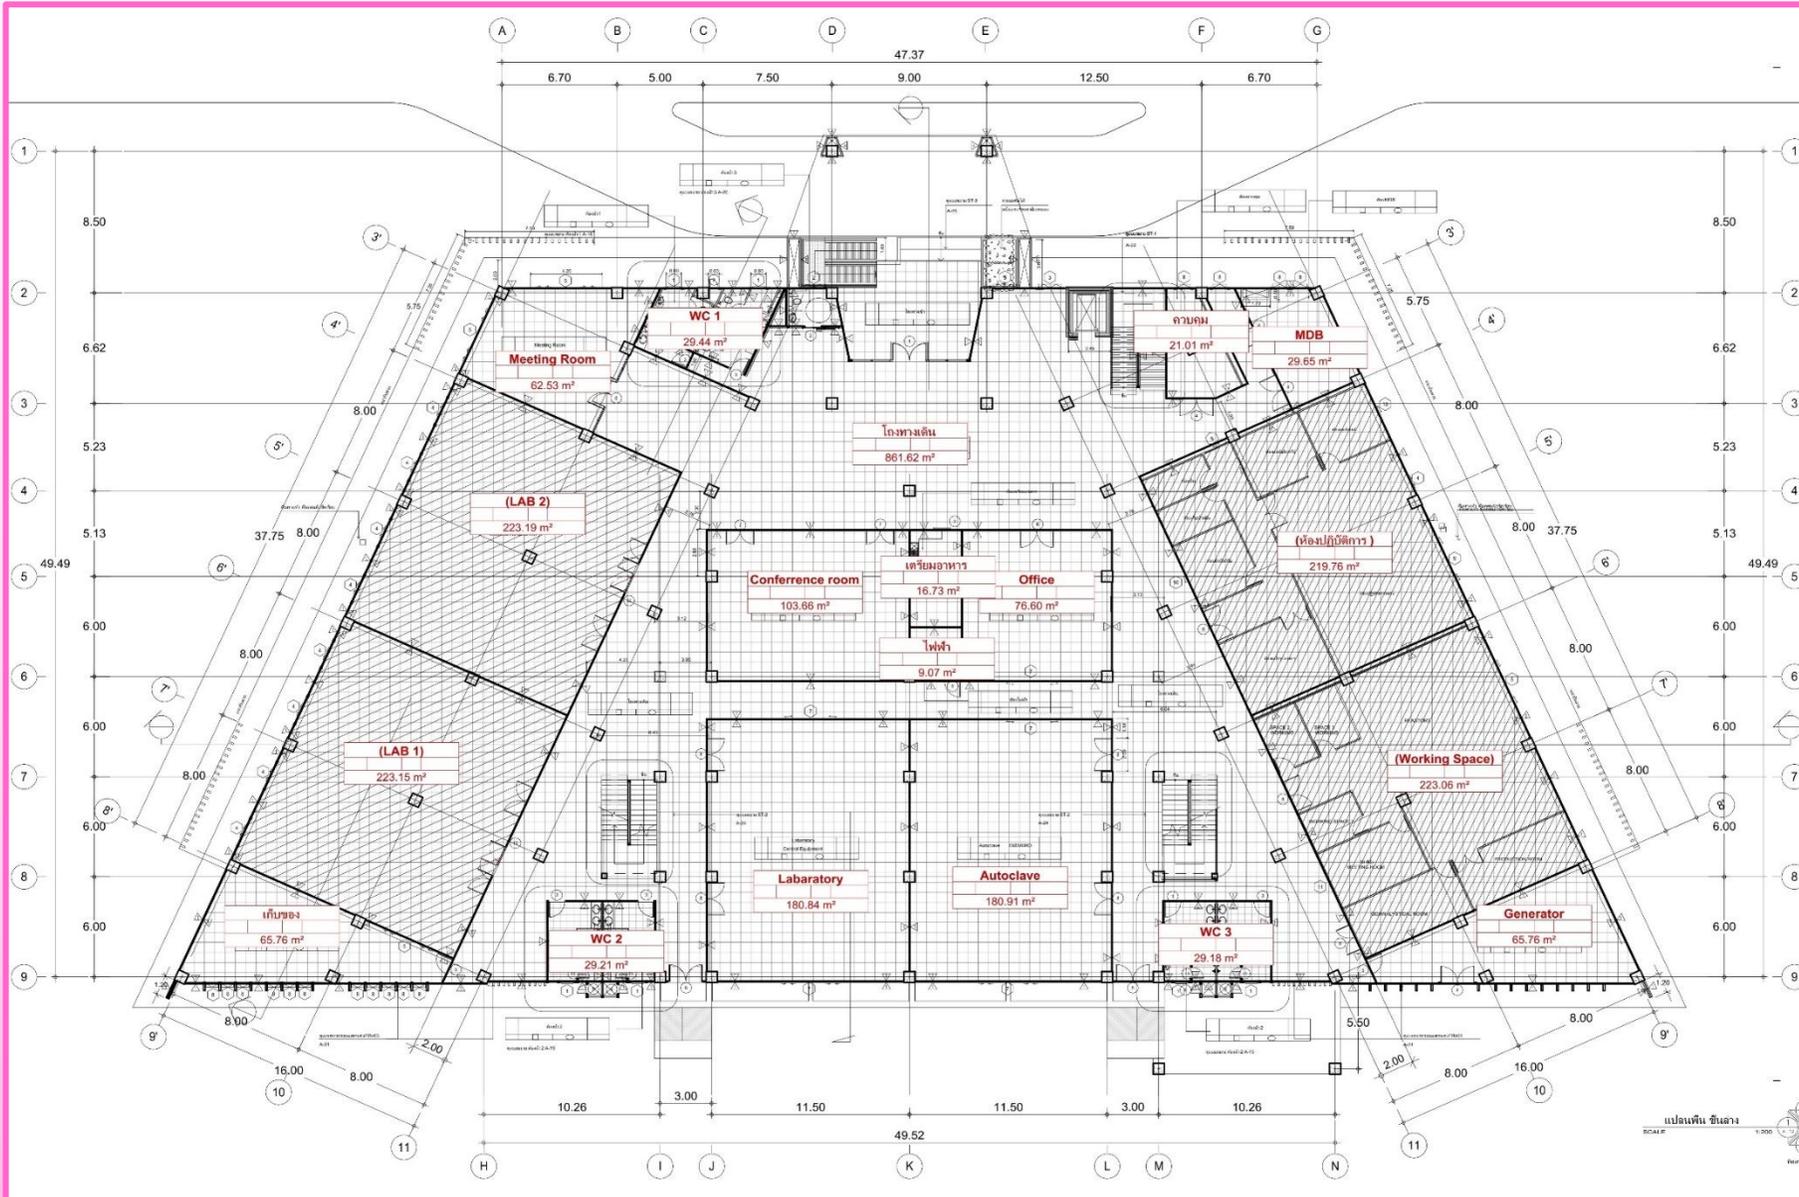

ชั้น 1 พื้นที่ 2300 ตร.ม.

พื้นที่ทางเดิน+LAB กระเบื้อง 60*60
 สำนักงาน +ประชุม กระเบื้องยางลายไม้ทางเข้า แกรนิต
 ไฟฟ้าเดิน ทางเดิน 3.8 ม. ห้อง 3.5 ม.







โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท ชุมพร คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
087/2567 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 67
79,680,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




26 มิ.ย. 67 – 30 ก.ค. 68 (400 วัน)
241 วัน (60.25%)
159 วัน (39.75%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



26.25 %
5/12 งวด
48 คน

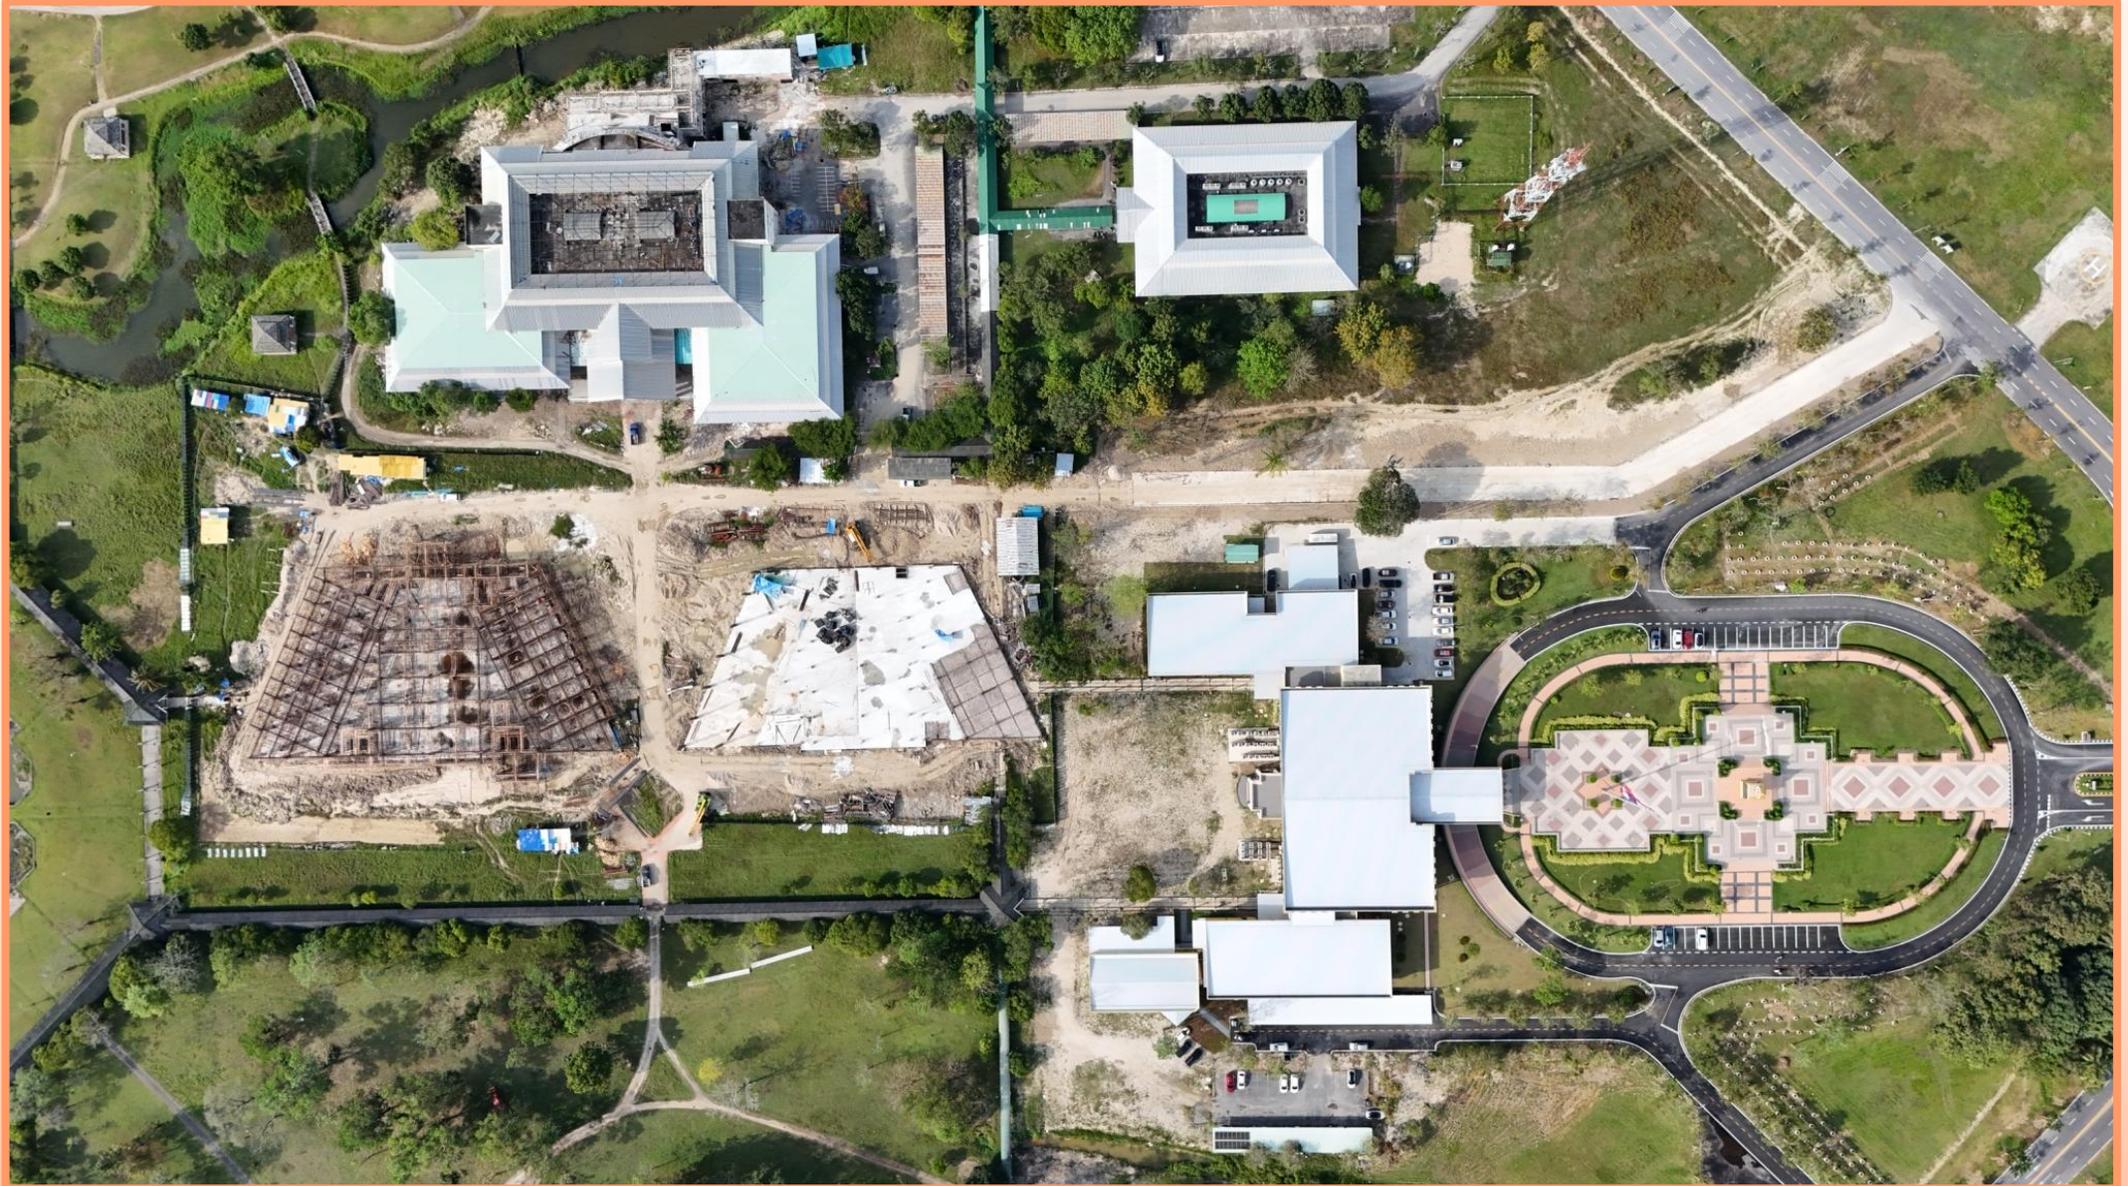

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้าง ระหว่างเดือน





โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ




ความก้าวหน้างาน

1. งานโครงสร้าง ชั้น 1 แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด
2. งานวางท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 90 %
3. งานตั้งนั่งร้านรับคาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100 %
4. งานผูกเหล็กคาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 70 %

หมายเหตุ งานงวดที่ 6 ส่งงานประมาณปลายเดือน มี.ค. 68




โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

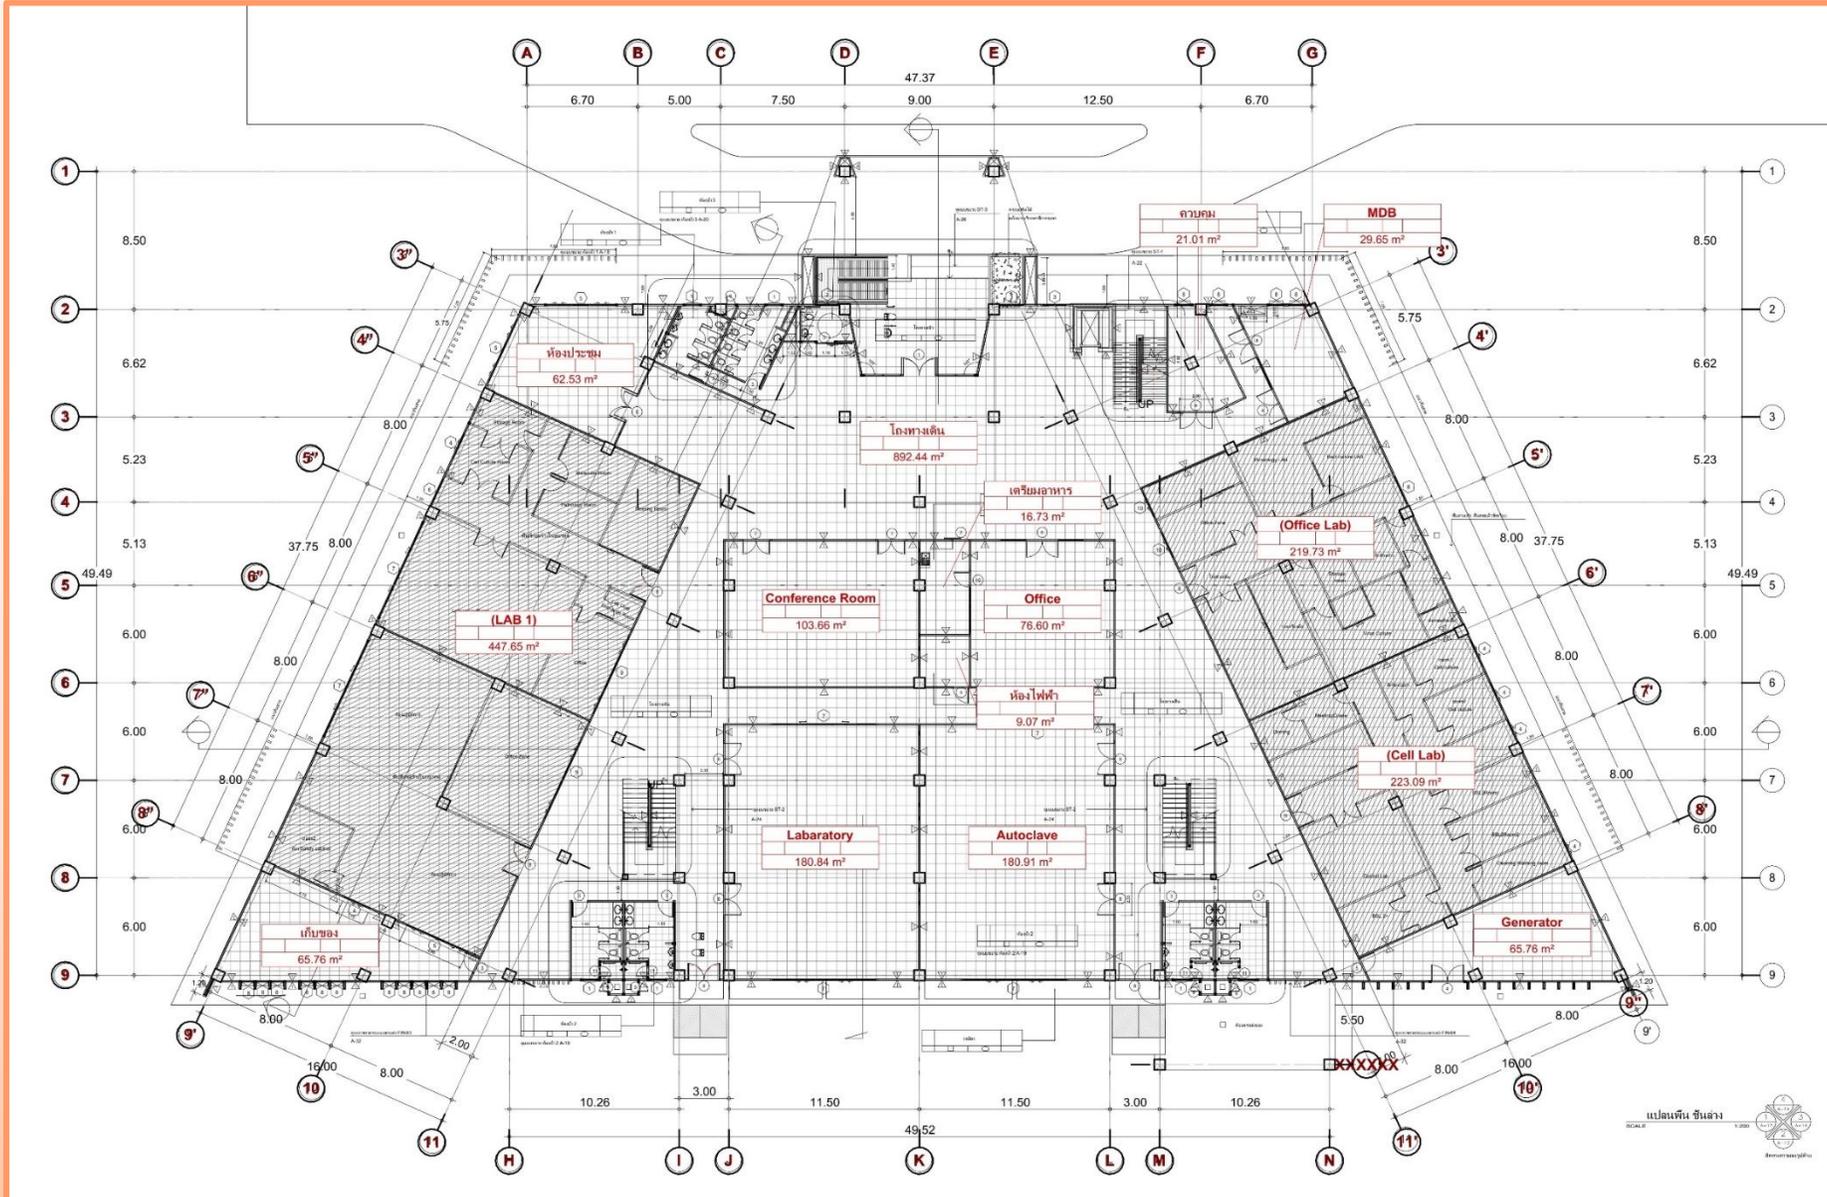



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

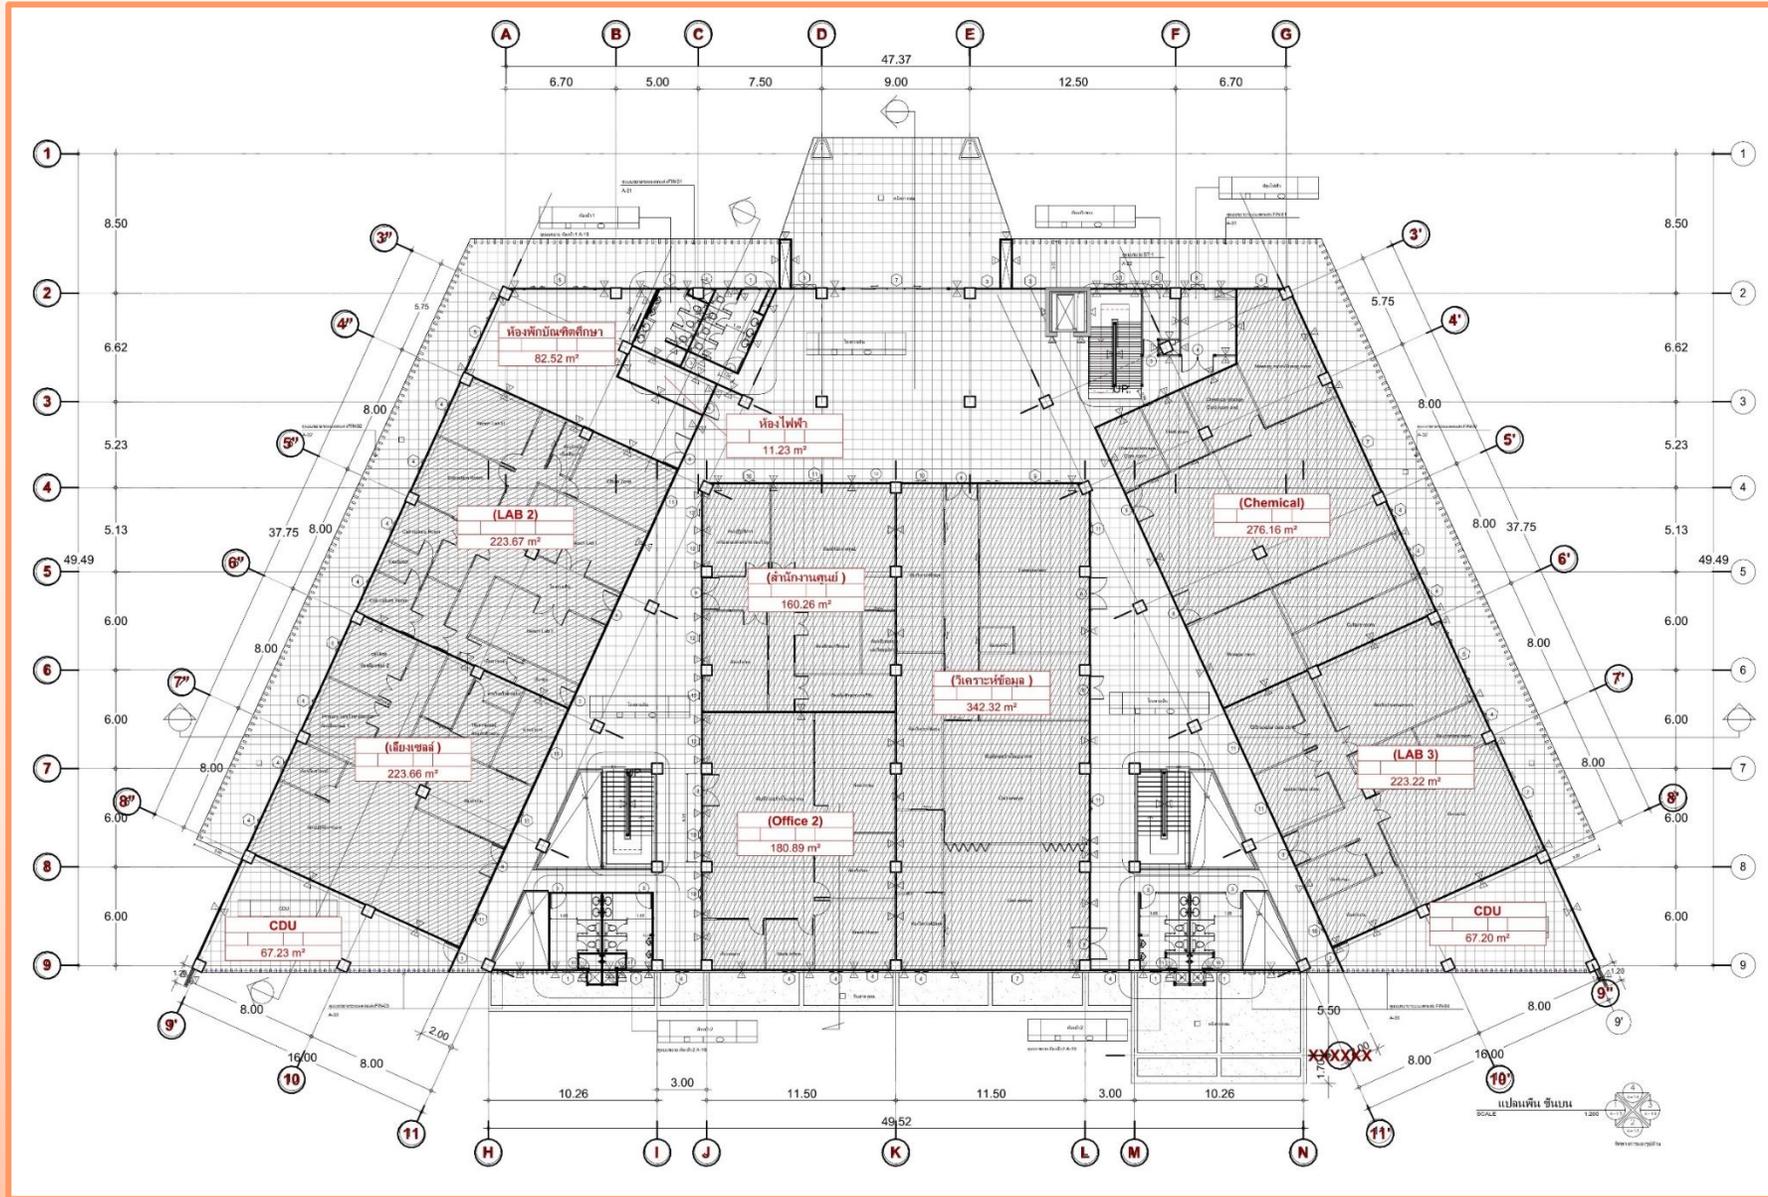



8

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด
145/2567 ลงวันที่ 16 ส.ค. 67
61,200,00.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



17 ส.ค. 67 – 20 ก.ย. 68 (400 วัน)
189 วัน (47.25%)
211 วัน (52.75%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



18.40%
4/12 งวด
30 คน








โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน

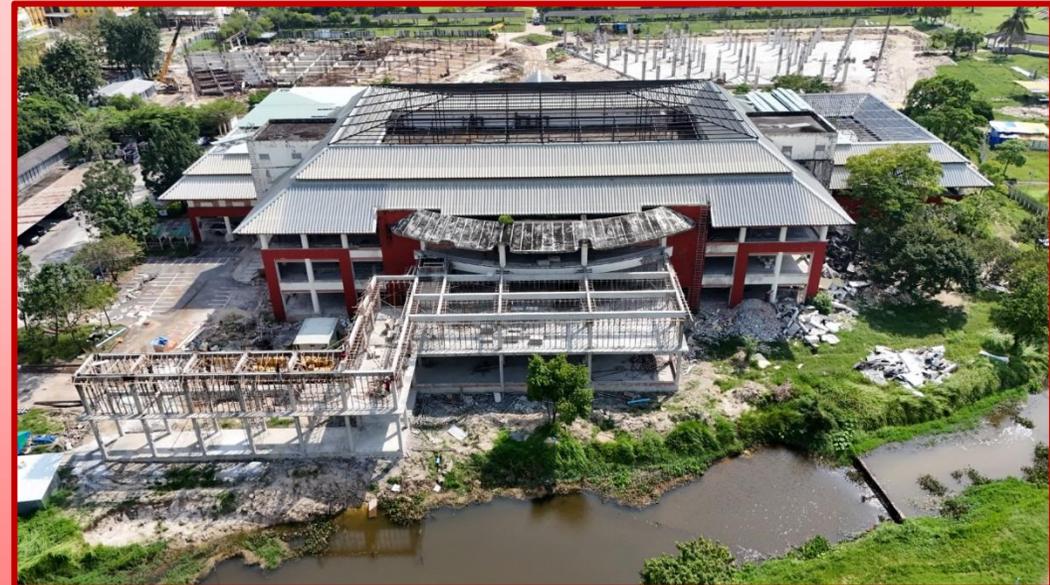



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน





โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา


เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน



7


โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน

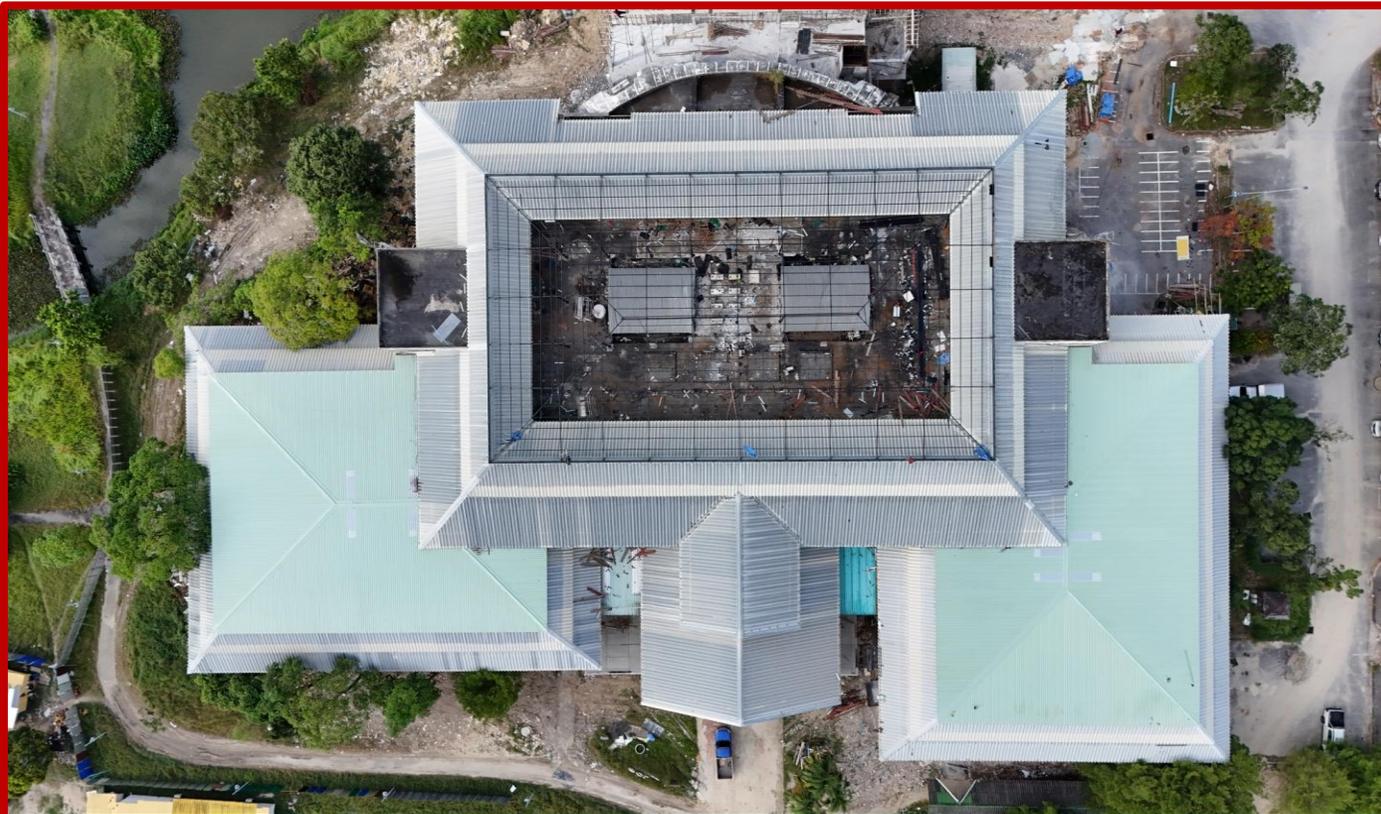



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

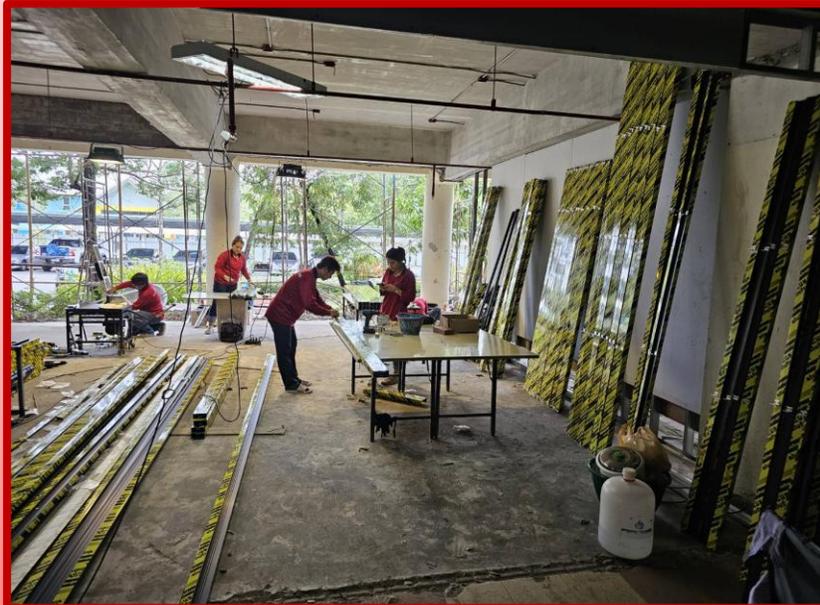

ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 1

1. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 95 %
2. งานจัดทำโครงสร้างเพิ่มเติมพื้นที่ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%
3. งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูน แล้วเสร็จ 95 %
4. งานสทิมท้องพื้นฟ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
5. งานผนังเบา แล้วเสร็จ 70 %
6. งานติดตั้งผนัง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม กำลังดำเนินการ



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 2

1. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 95 %
2. งานจัดทำโครงสร้างเพิ่มเติมพื้นที่ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
3. งานก่ออิฐผนัง+ฉาบปูน แล้วเสร็จ 95 %
4. งานสกิมท้องพื้นฟ้าเพดานชั้น 2 แล้วเสร็จ 80 %
5. งานผนังเบา แล้วเสร็จ 60 %




ความก้าวหน้างาน

งานปรับปรุง ชั้น 3

1. งานรื้อถอน //แล้วเสร็จ 95 %
2. งานจัดทำโครงสร้างเพิ่มเติมพื้นที่ชั้น 3 //แล้วเสร็จ 100%
3. งานก่ออิฐผนัง+ฉาบ //แล้วเสร็จ 95 %
4. งานสกิมท้องพื้นฟ้าพาดานชั้น 3 //แล้วเสร็จ 80 %
5. งานผนังงา //แล้วเสร็จ 60 %
6. งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก+มุงหลังคา //แล้วเสร็จ 98 %



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

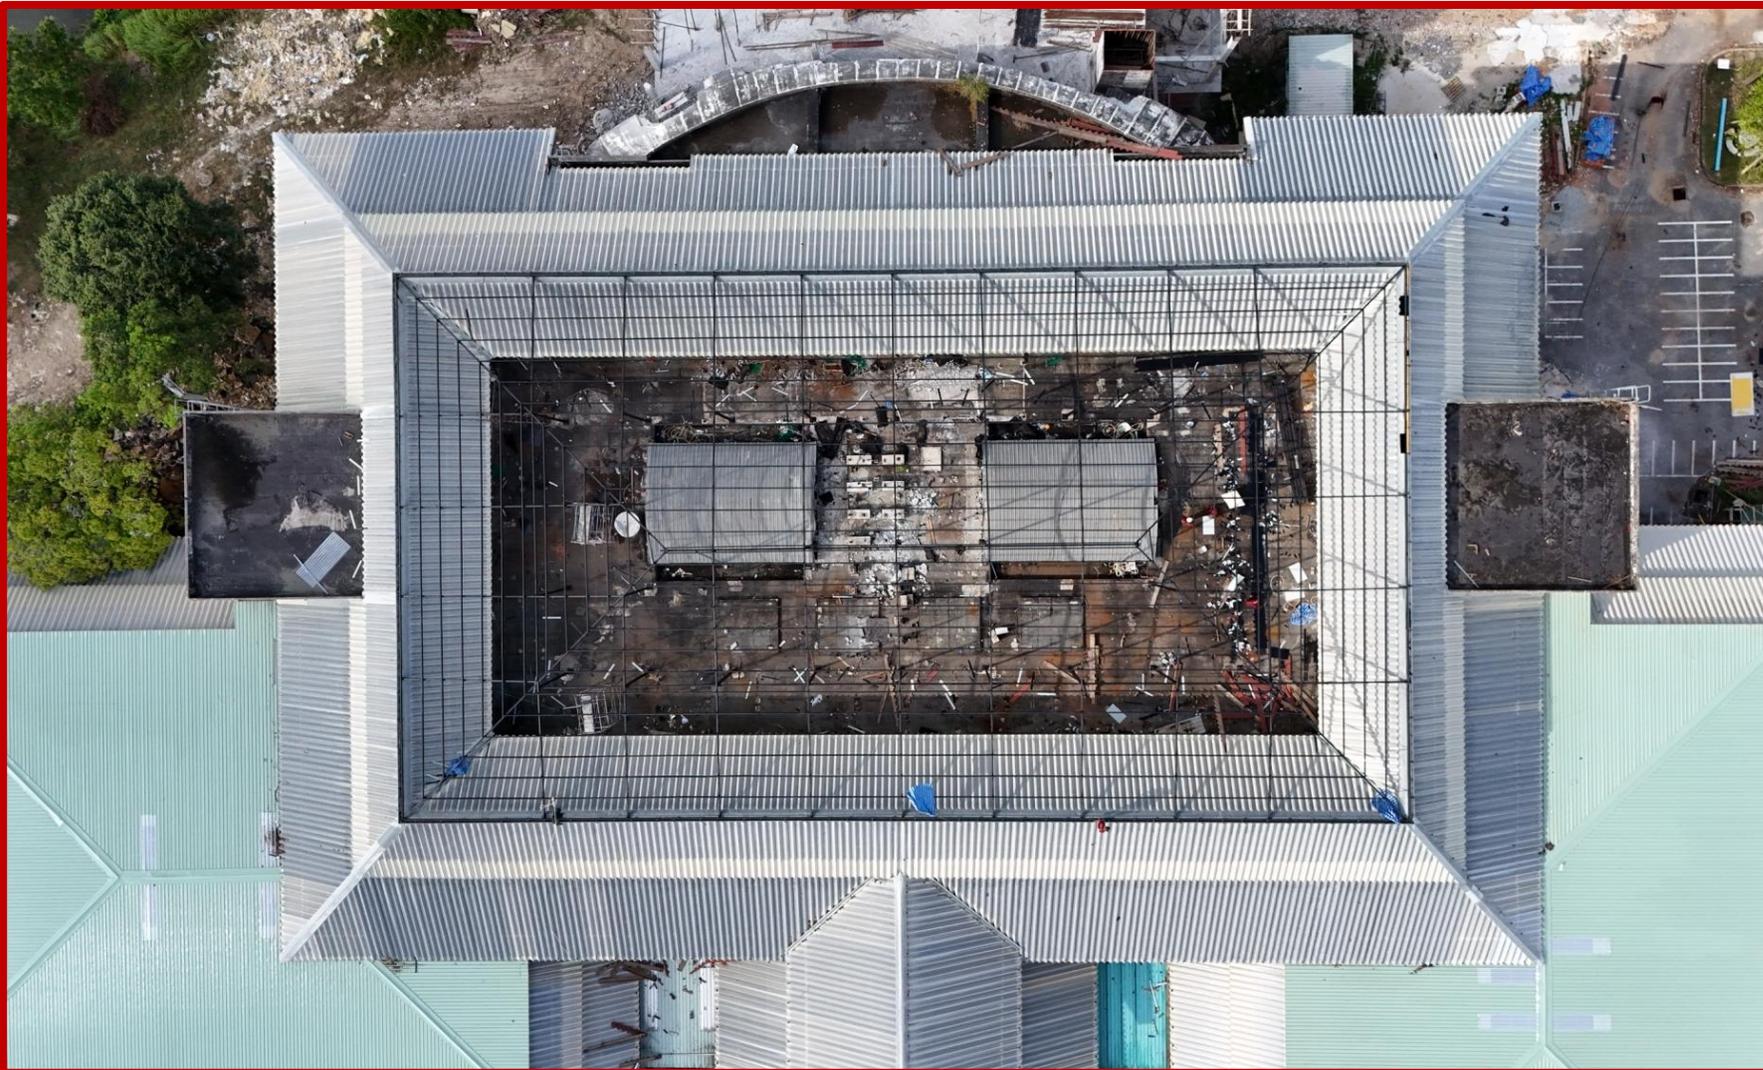

ความก้าวหน้างาน
งานปรับปรุง ชั้น 4

1. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 98 %
2. งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ 100 %
3. งานติดตั้งเชิงชาย METAL SHEET
แล้วเสร็จ 100 %
4. วัสดุบุหลังคาสังกะสีแล้ว เริ่มติดตั้งปลาย เดือน ก.พ. 68 นี้



โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา



ความก้าวหน้างาน

งานก่อสร้างส่วนต่อเติมด้านทิศเหนือ

1. งานเทคอนกรีตฐานราก+เสาตอม่อ
แล้วเสร็จ 100 %
2. วางท่อระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ 90 %
3. งานเทคอนกรีต คาน+ พื้น+เสา ชั้น 1+2+3
แล้วเสร็จ 100 %
4. งานตั้งแบบคานรับหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
5. งานผูกเหล็กคานหลังคา อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. งานผนังก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 20 %

งานงวดที่ 5 ส่งประมาณปลายเดือน มี.ค. 68

อาคาร 10*25 บันได 3.5*25


โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผังพื้นที่ 1


- พื้นที่ก่อสร้างใหม่
- พื้นที่อ่านหนังสือ-กิจกรรม
- พื้นที่นิทรรศการ
- พื้นที่สำนักงาน-ประชุม
- พื้นที่ห้องน้ำ
- พื้นที่ทางเดิน-โถง
- พื้นที่ไม่มีปรับปรุง



- พื้นที่ก่อสร้างใหม่
- พื้นที่อ่านหนังสือ-กิจกรรม
- พื้นที่นิทรรศการ
- พื้นที่สำนักงาน-ประชุม
- พื้นที่ห้องน้ำ
- พื้นที่ทางเดิน-โถง
- พื้นที่ไม่มีกรปรับปรุง

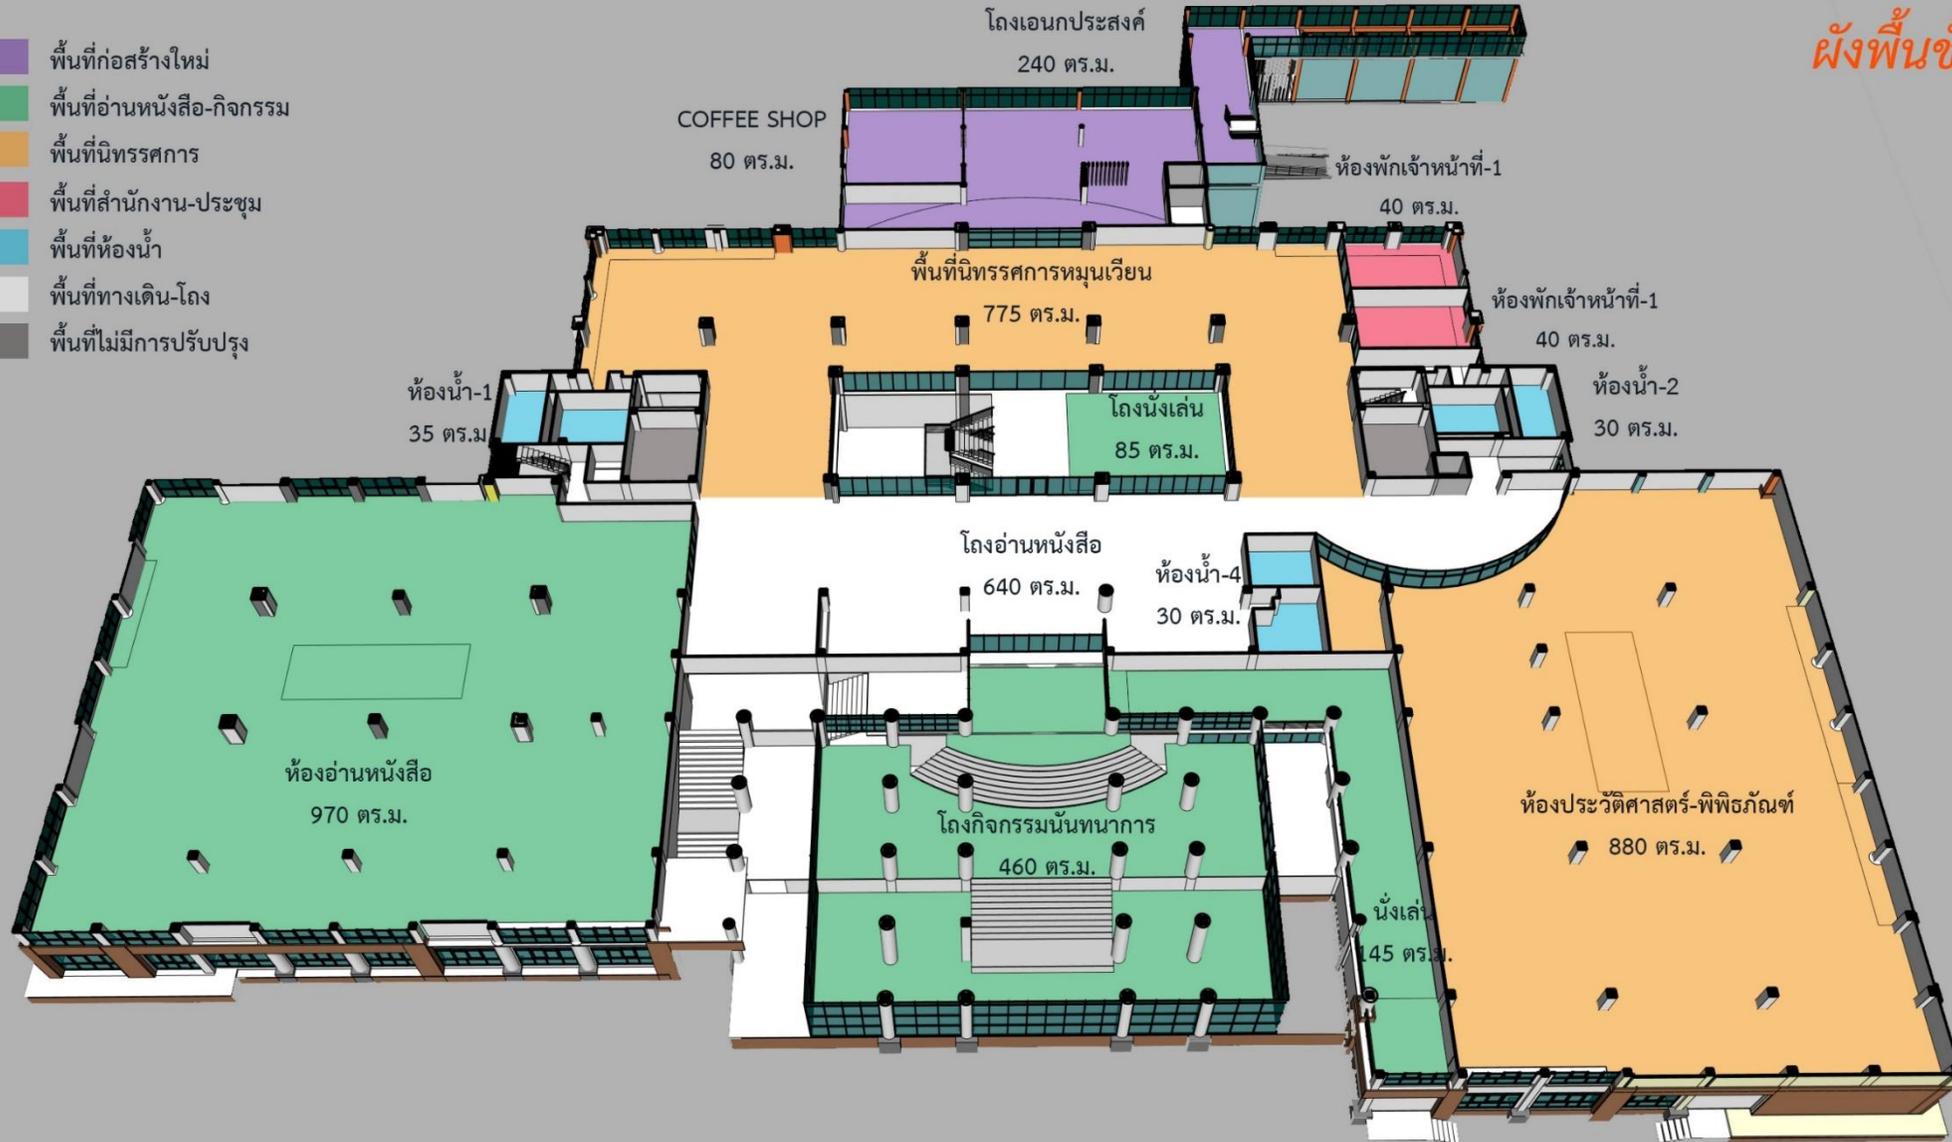

โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

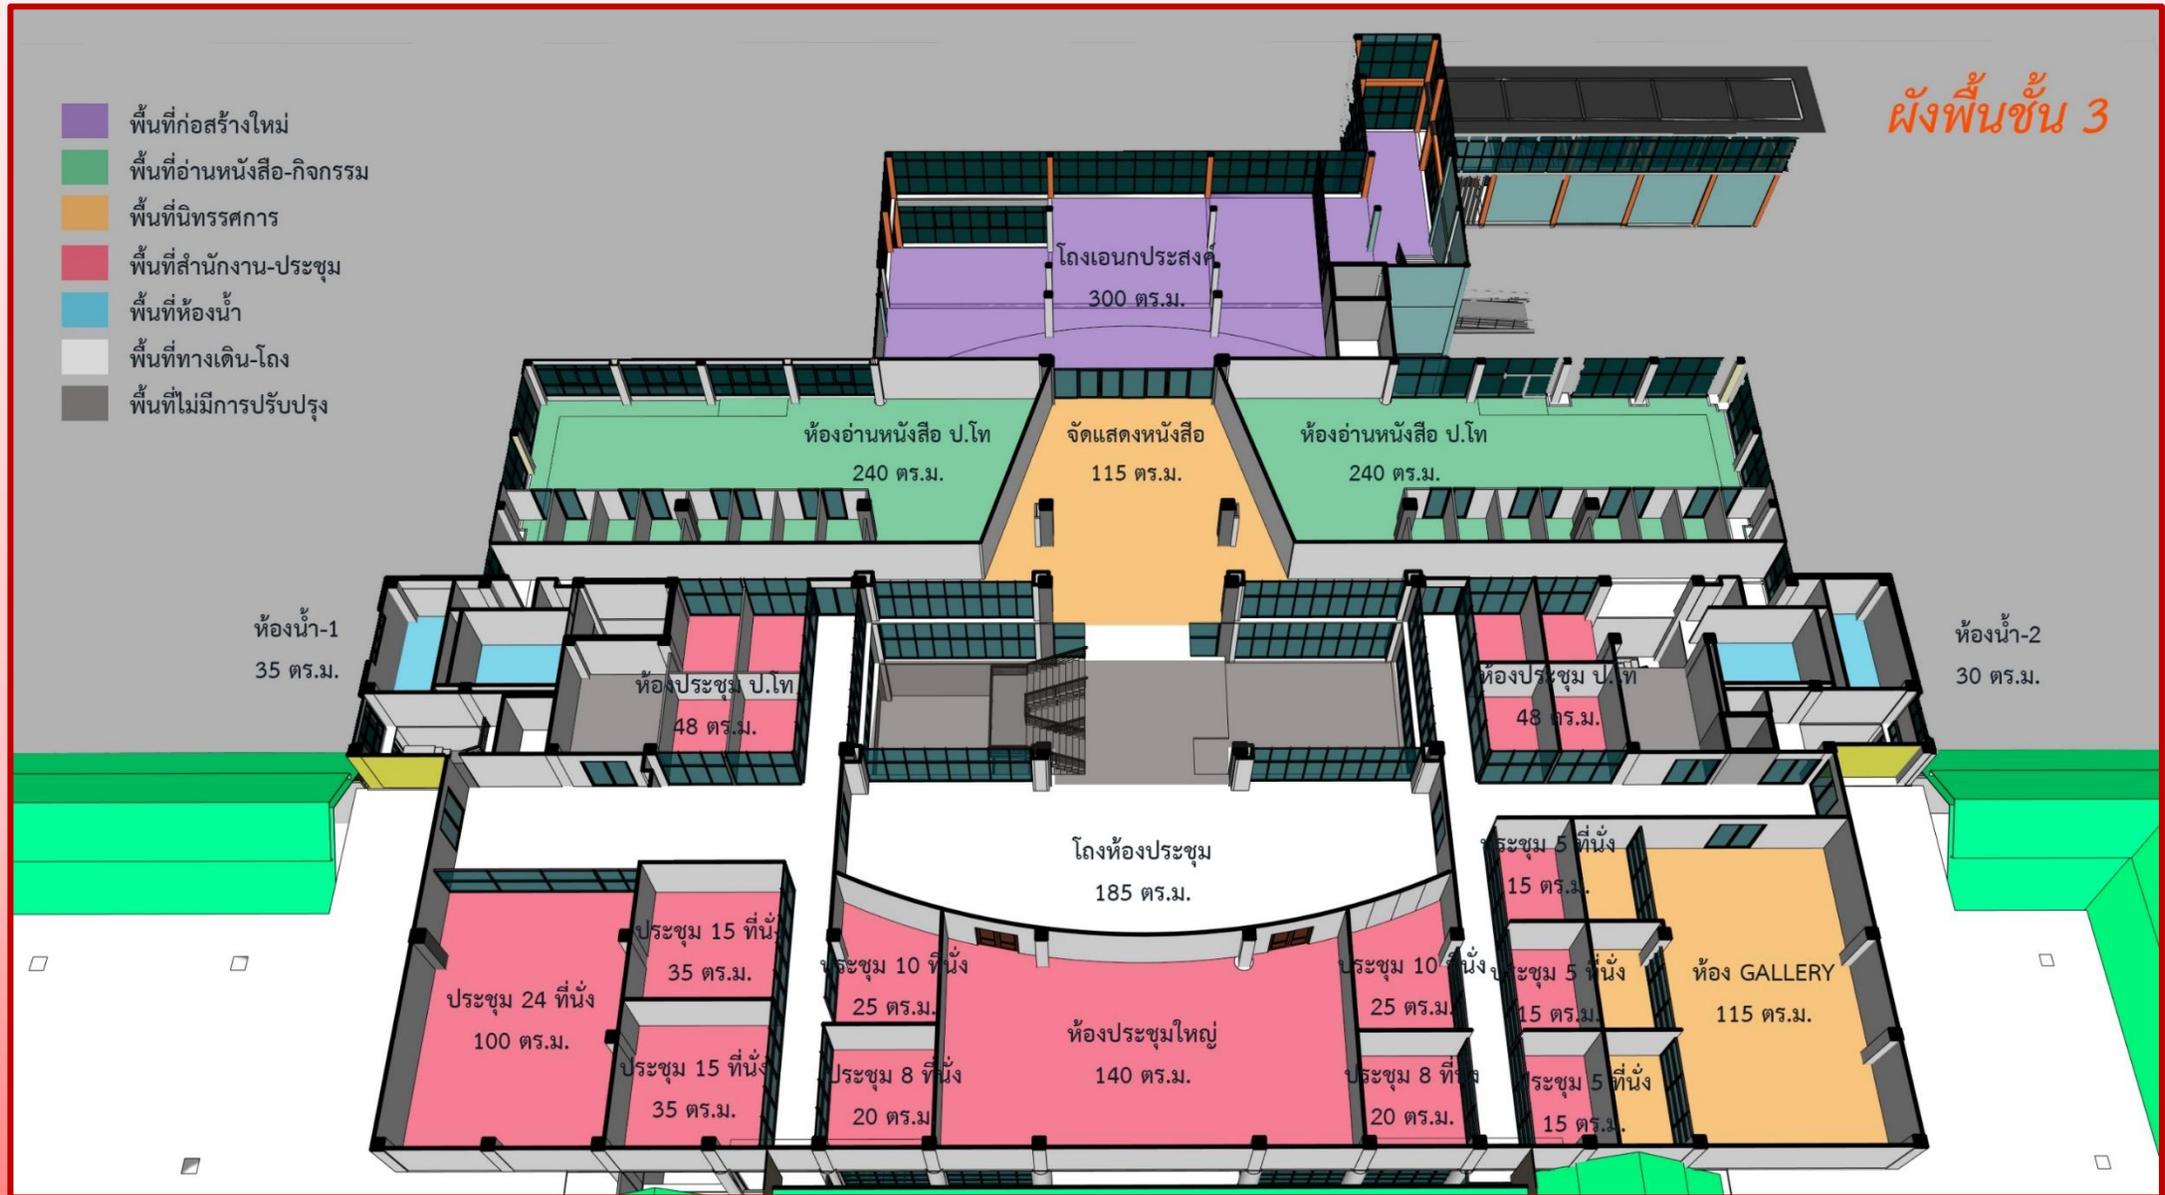







โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ตรวจการจ้างงาน งวดที่ 4



9

โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท ซี.ซี.จัทกรกลและก่อสร้าง จำกัด
148/2567 ลง 12 ส.ค. 67
27,414,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



13 ส.ค. 67 – 27 พ.ค. 68 (278 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1)
193 วัน (96.42%)
80 วัน (30.58%)


ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



100.00%
6/6 งวด (พรจ. ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ)
28 คน



โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด

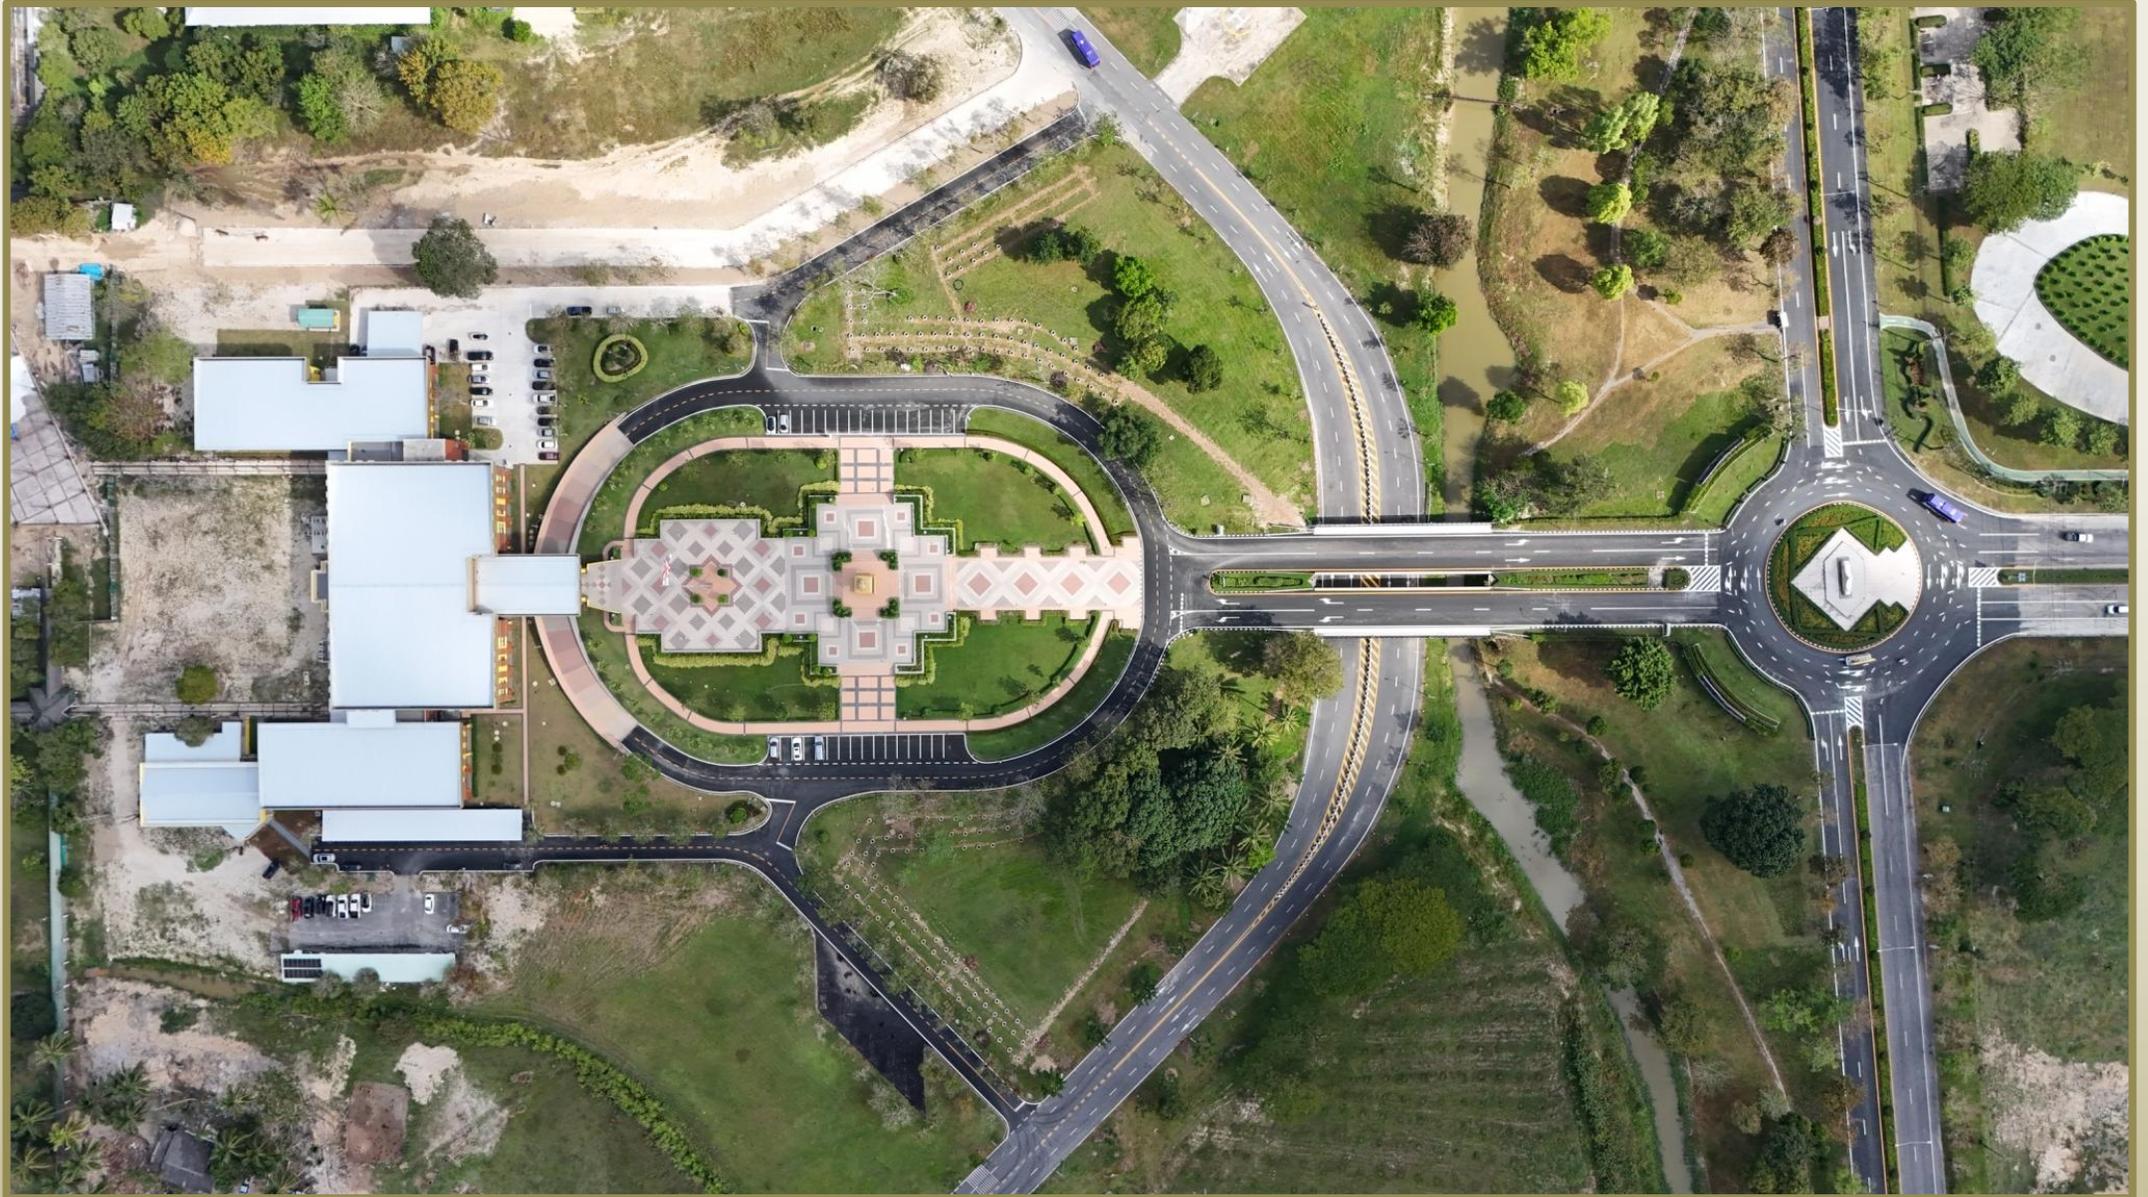



โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด





โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด





โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด





โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด





โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด





โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด













โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด





โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด





โครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด











โครงการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนขยายของอาคารสถาปัตยกรรม และการออกแบบ จำนวน 34 ห้อง พร้อมห้องประกอบ

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี
179/2567 ลงวันที่ 30 ก.ย. 67
43,171,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



1 ต.ค. 67 – 30 เม.ย 68 (212 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1)
144 วัน (67.92%)
68 วัน (32.08%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



58.38%
3/5 งวด
40 คน







เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน



เปรียบเทียบความก้าวหน้างานก่อสร้างระหว่างเดือน












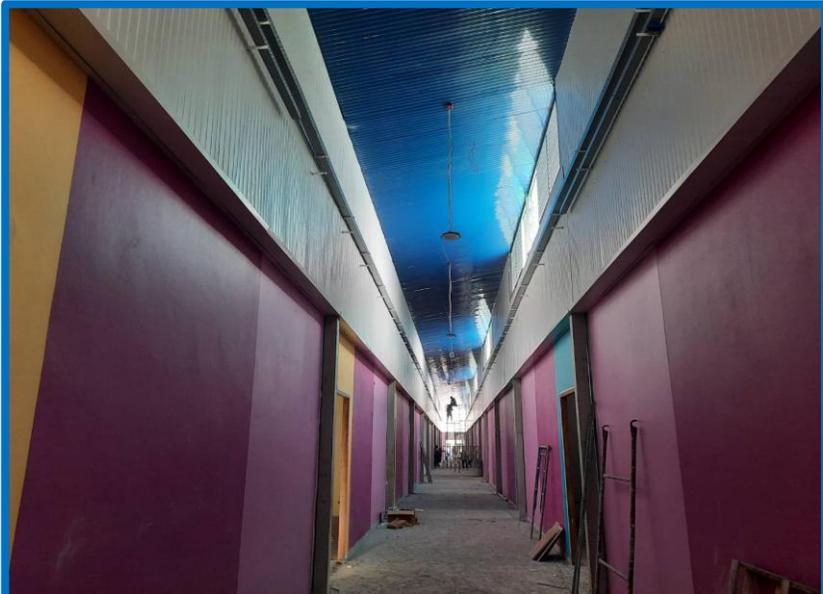


ความก้าวหน้างาน
โถงทางเดิน

1. งานทาสี แล้วเสร็จ 90 %
2. งานติดตั้งผนัง ฝ้าเพดาน METAL SHEET แล้วเสร็จ 90 %
3. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 80 %
4. งานปูหินแกรนิตพื้นทางเดิน เข้า ต้นเดือน มี.ค.





ความก้าวหน้างาน
โถงทางเดิน

- งานปูกระเบื้องเคลือบโถงทางเดินรอบนอกอาคาร
แล้วเสร็จ 35 %
- งานฝ้าเพดาน METAL SHEET ทางเดินด้านนอก
แล้วเสร็จ 30 %

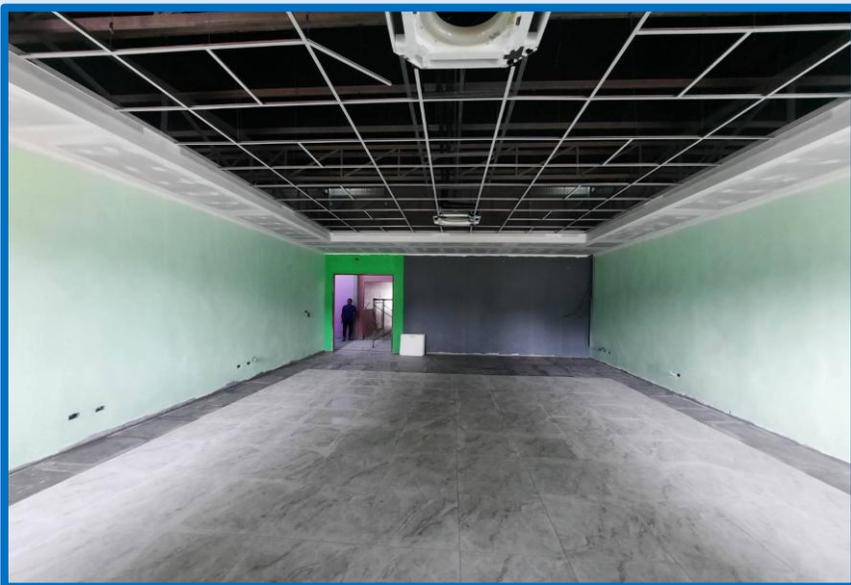

ความก้าวหน้างาน
ห้องเรียน

1. งานพินิจพาดานภายในห้อง แล้วเสร็จ 75 % (34 ห้อง)
(แผ่นอคูสติคติดตั้งภายหลัง)
2. งานปูกระเบื้องพื้นห้อง แล้วเสร็จ 85 % (29 ห้อง)
แล้วเสร็จ ภายใน 28 มี.ค.
3. งานติดตั้งประตู หน้าต่าง
 - ประตู วงกบ 100 % บานติดตั้ง 20 มี.ค.
 - หน้าต่าง วงกบ 100 % บาน ต้น มี.ค.
4. งานทาสีภายในห้อง แล้วเสร็จ 50 %
5. งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 60 %
(FCU+เดินท่อ 34 ห้อง หรือ CDU)
ระบบ CENTRAL CONTROL เริ่มเข้าต้นเดือน มี.ค. แล้วเสร็จ
กลางเดือน เม.ย.
6. งานติดตั้งดวงโคมเริ่มติดตั้ง ต้นเดือน มี.ค.
7. ตู้ MDB เข้า ปลายเดือน มี.ค.

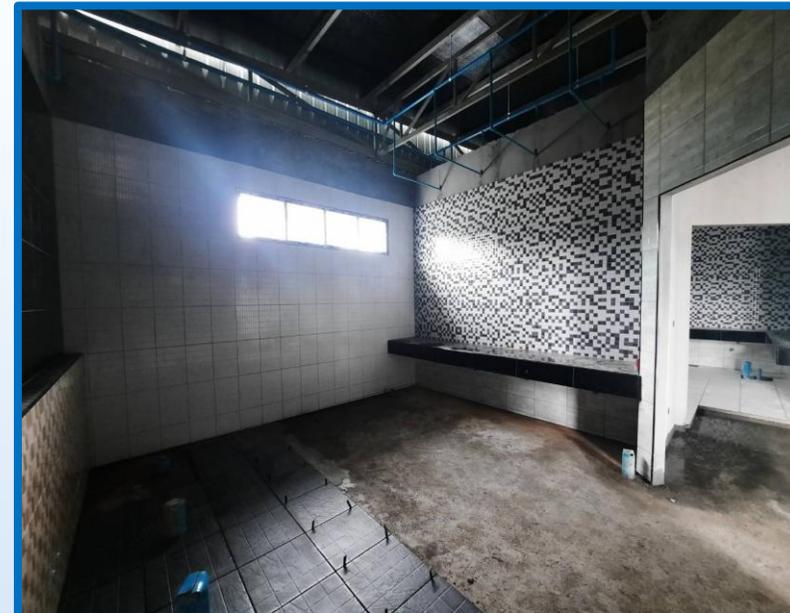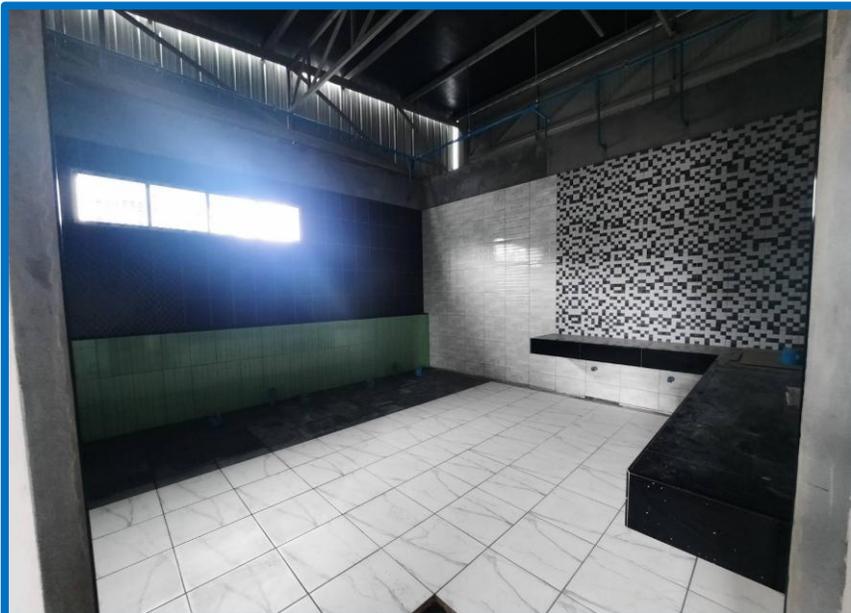

ความก้าวหน้างาน
ห้องน้ำ

1. งานปูกระเบื้องผนัง แลวเสร็จ 90 %
2. งานปูกระเบื้องพื้น แลวเสร็จ 40 %
3. สุขภัณฑ์ เข้า ต้นเดือน มี.ค.



ความก้าวหน้างาน
ภายนอกอาคาร

1. งานติดตั้งผนัง SIDING METAL SHEET แล้วเสร็จ 95 %
2. งานตกแต่งกริดลานหน้าอาคาร แล้วเสร็จ 85 %
3. งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 100 %
4. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ 95 %
5. งานติดตั้งท่อ คสล. ระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ 85%






ความก้าวหน้างาน งานทางเชื่อมอาคาร

1. งานหลังคา+รางน้ำ+ฟ้าเพดาน+ติดตั้ง คอมโพสิท ลแล้วเสร็จ 100 %
2. งานเดินท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ 100 %
3. อยู่ระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

กว้าง 15 ยาว 22 สูง 4.6

งานงวดที่ 4 ส่งประมาณ กลางเดือน มี.ค. 68

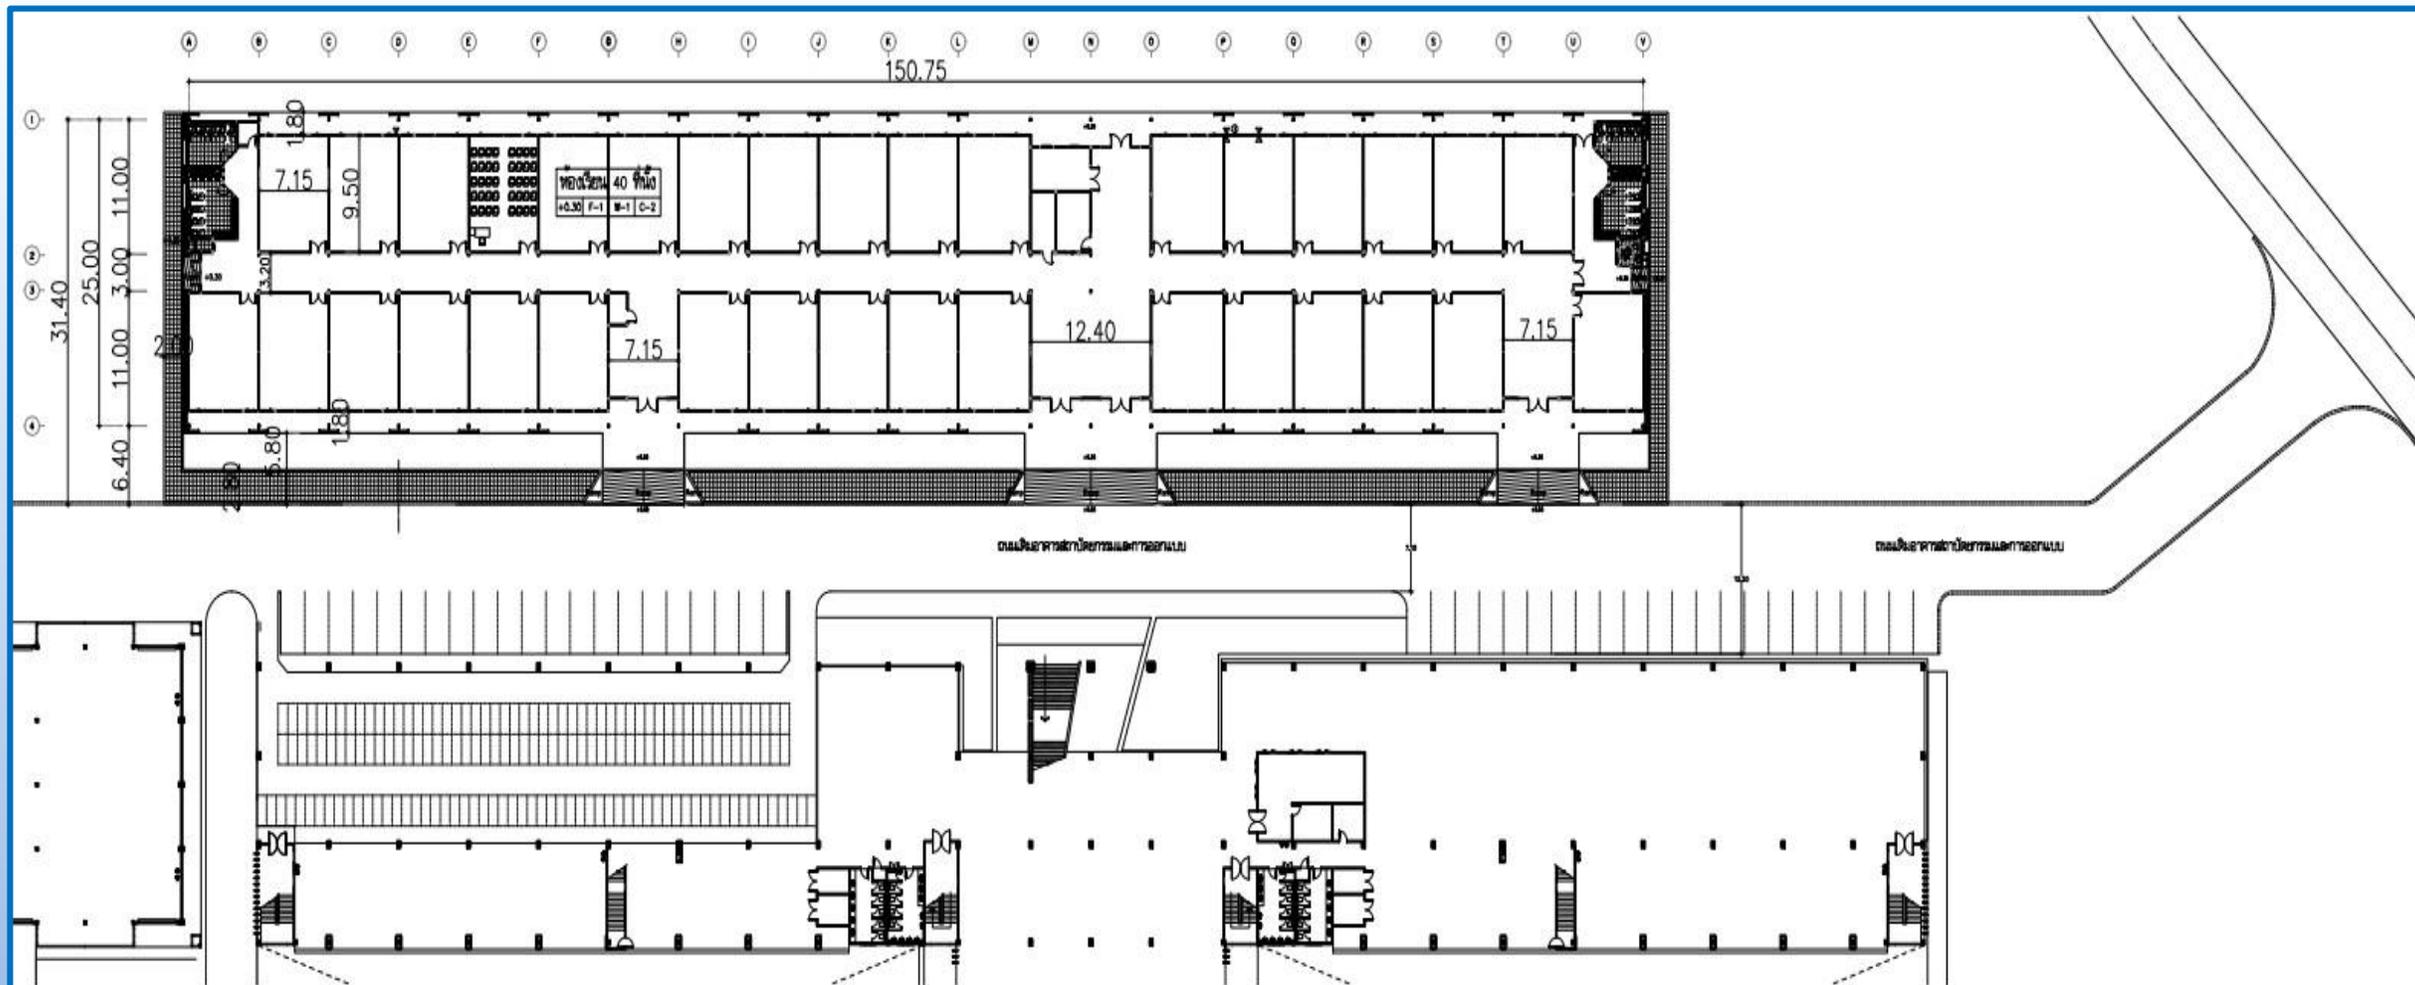

อาคาร 26*151 ม.

พื้นที่ห้องเรียน 7.15*9.50 ม =68 ตร.ม. 34 ห้อง

ห้องเรียน ปูกระเบื้อง 60*60

ทางเดินกลาง หินแกรนิต ทางเท้าโดยรอบ กระเบื้อง 40*40









โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

<p>ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง</p>		<p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค. คอนสตรัคชั่น (2007) 150/2567 ลงวันที่ 26 ส.ค. 67 322,000,000.00 บาท</p>
<p>ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา</p>		<p>27 ส.ค. 67 – 12 ก.ย. 70 (900 วัน) 179 วัน (19.88%) 721 วัน (80.12%)</p>
<p>ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย</p>		<p>0.86 % 0/30 งวด 10 คน</p>
<p>จำนวนเครื่องจักร</p>		<p>รถแมคโคร 2 คัน ,รถเกรด 1 คัน, รถไถ 1 คัน,รถสิบล้อ 4 คัน</p>






ความก้าวหน้างาน

1. งานเจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ 100 %
2. งานถมดินปรับระดับ แล้วเสร็จ 55 %
แผนถมดินถึงระดับ -1.00 และ -2.00
ปลายเดือน และจะเริ่มตอกเสาเข็มก่อน
เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้าง
3. ได้วางผังอาคาร
และ จะทำเสาเข็ม PILOT PILE โดยได้สั่ง
ผลิตแล้วและตอกในวันที่ 25 ก.พ. 68
จำนวน 10 ต้น







โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล


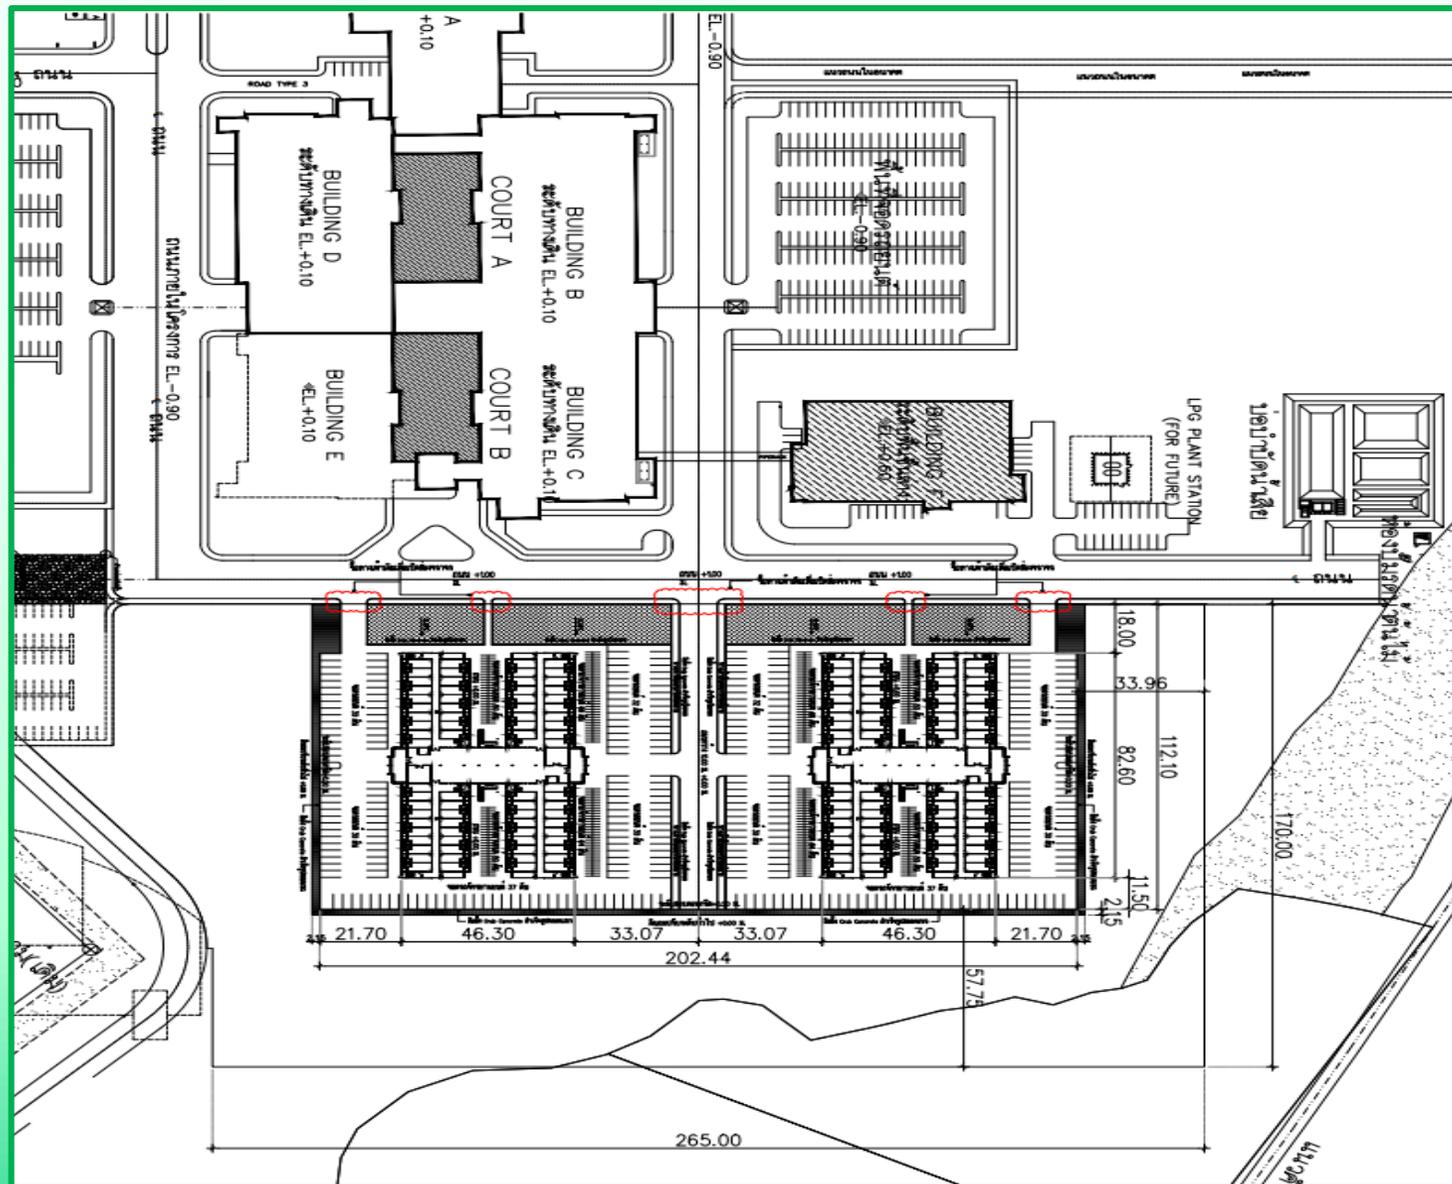


ดินถม 100000 ลบ.ม. ดินเดิม - 4.00 ดมสูง 3 ม.
 ดินถมระดับ -1.00
 บ่อขี้ม -2.60 ห่างแนวกำแพง 3 ม.

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

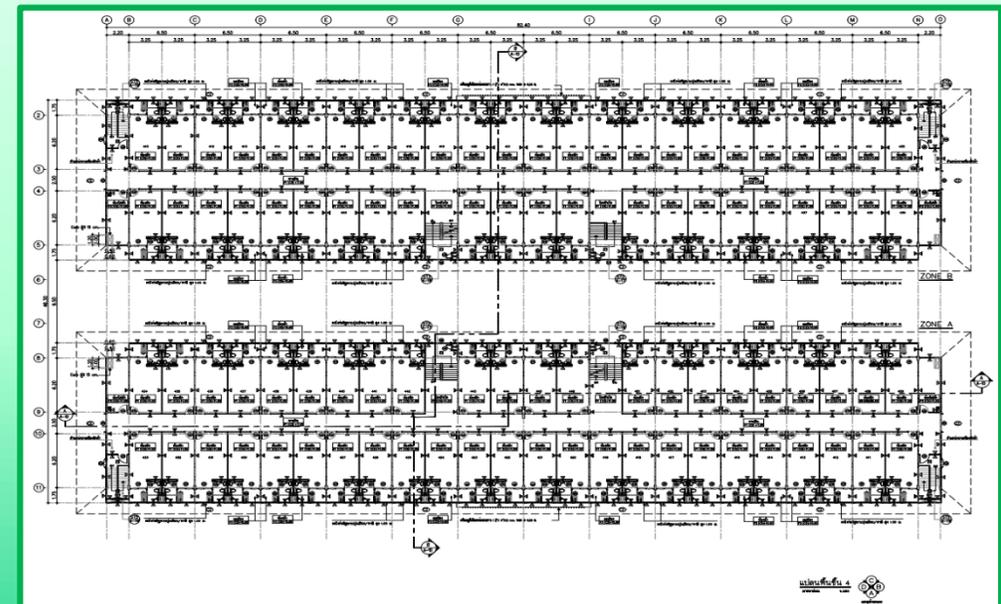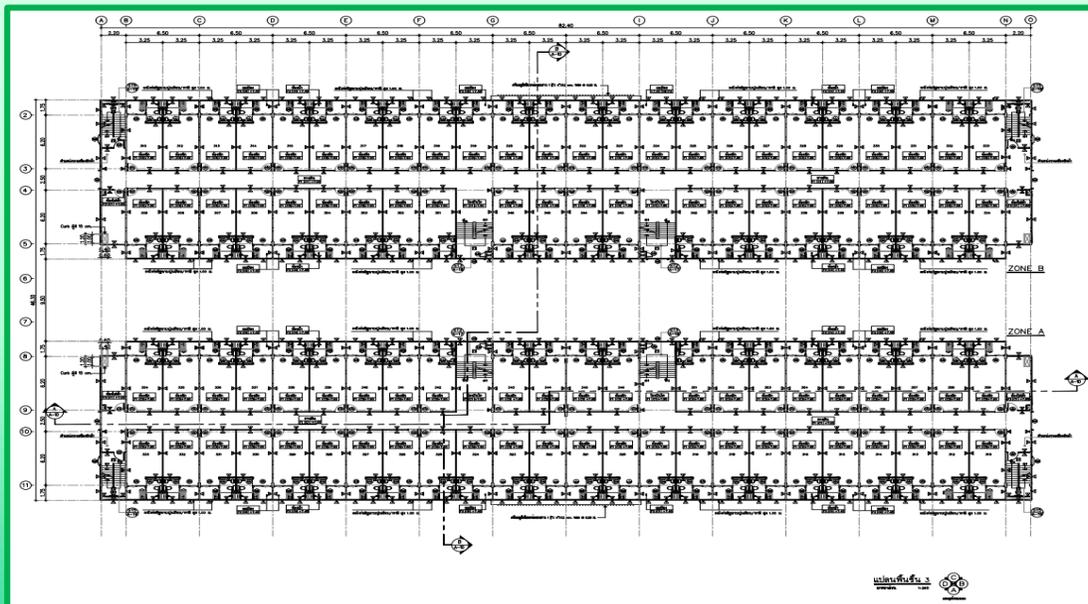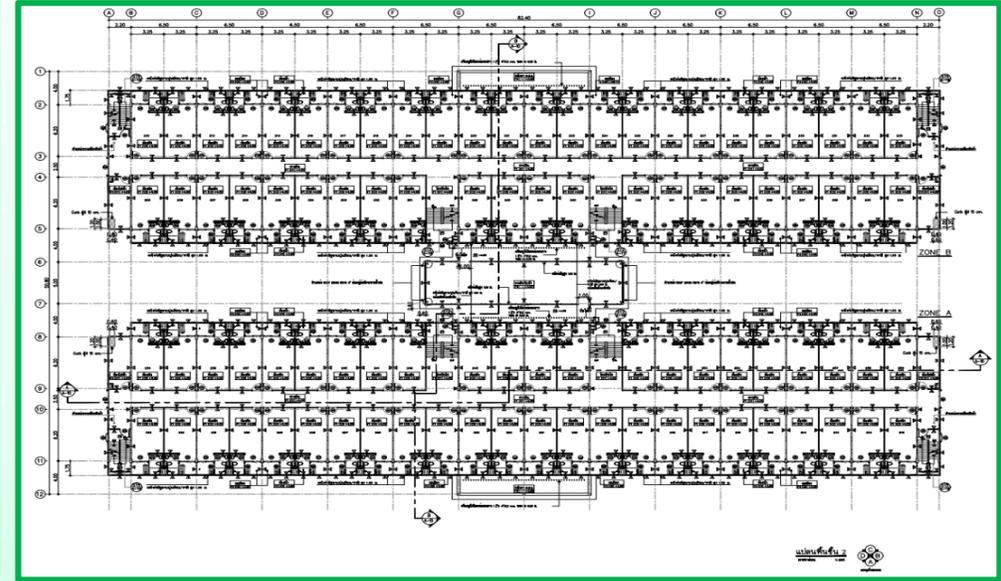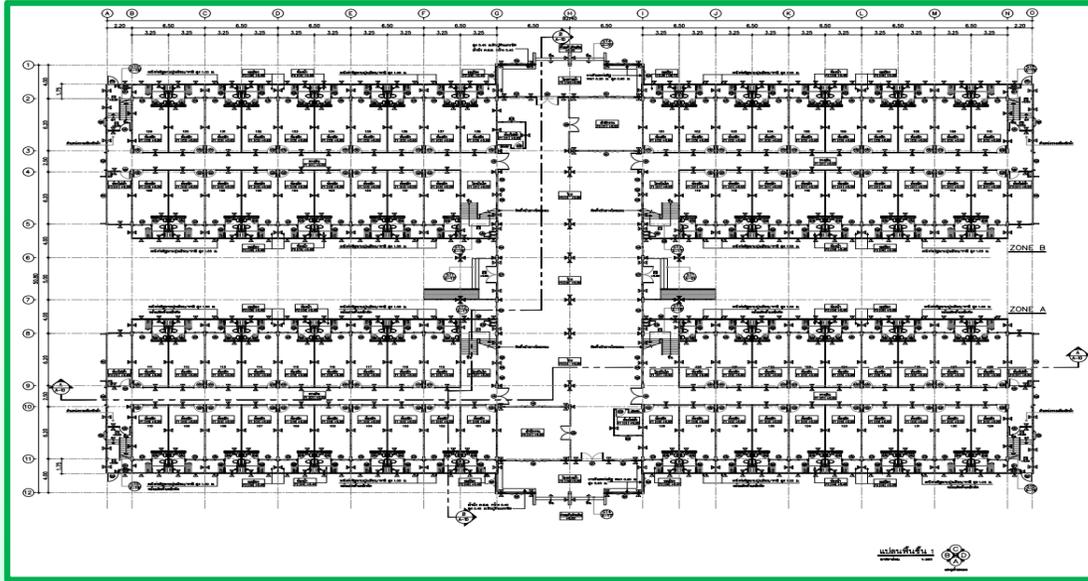

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

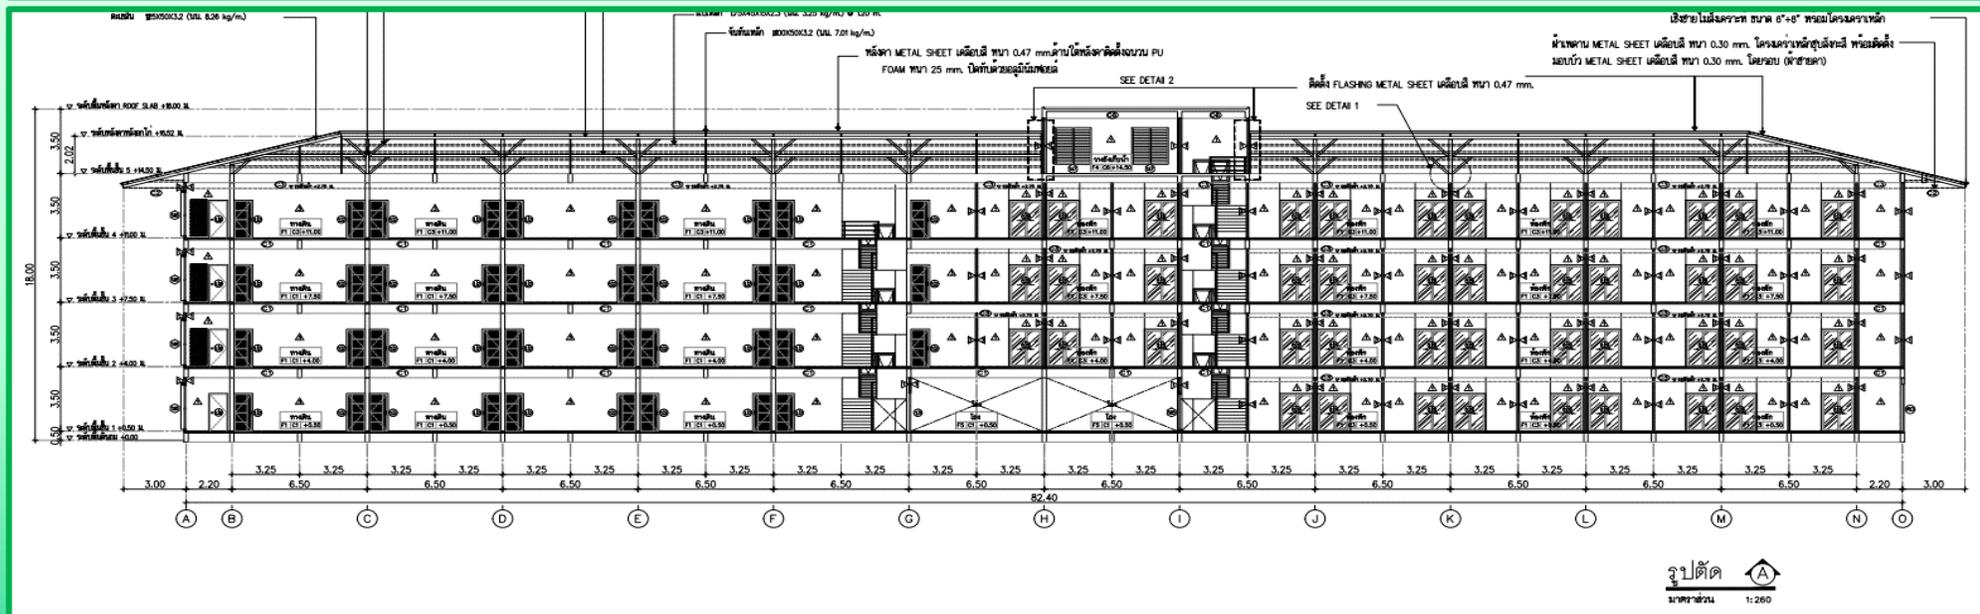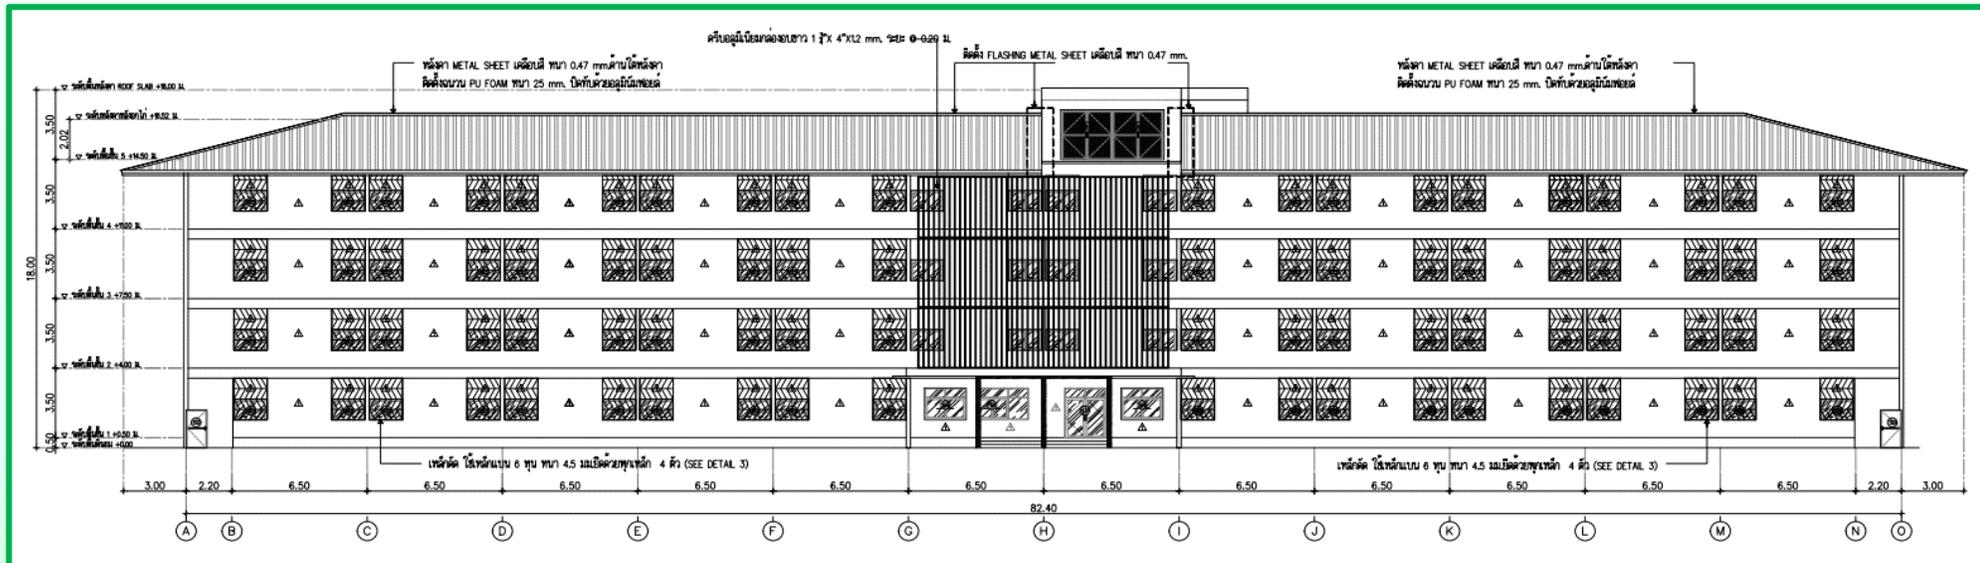




12

โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไป เชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษาด้านทิศตะวันตก

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		บริษัท สันยาคอนกรีต จำกัด 027/2568 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2567 4,000,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		14 ธ.ค. 67 – 12 เม.ย. 68 (120 วัน) 70 วัน (58.33%) 50 วัน (41.67%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		24.86% 0/3 งวด 3

โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไปเชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษาด้านทิศตะวันตก

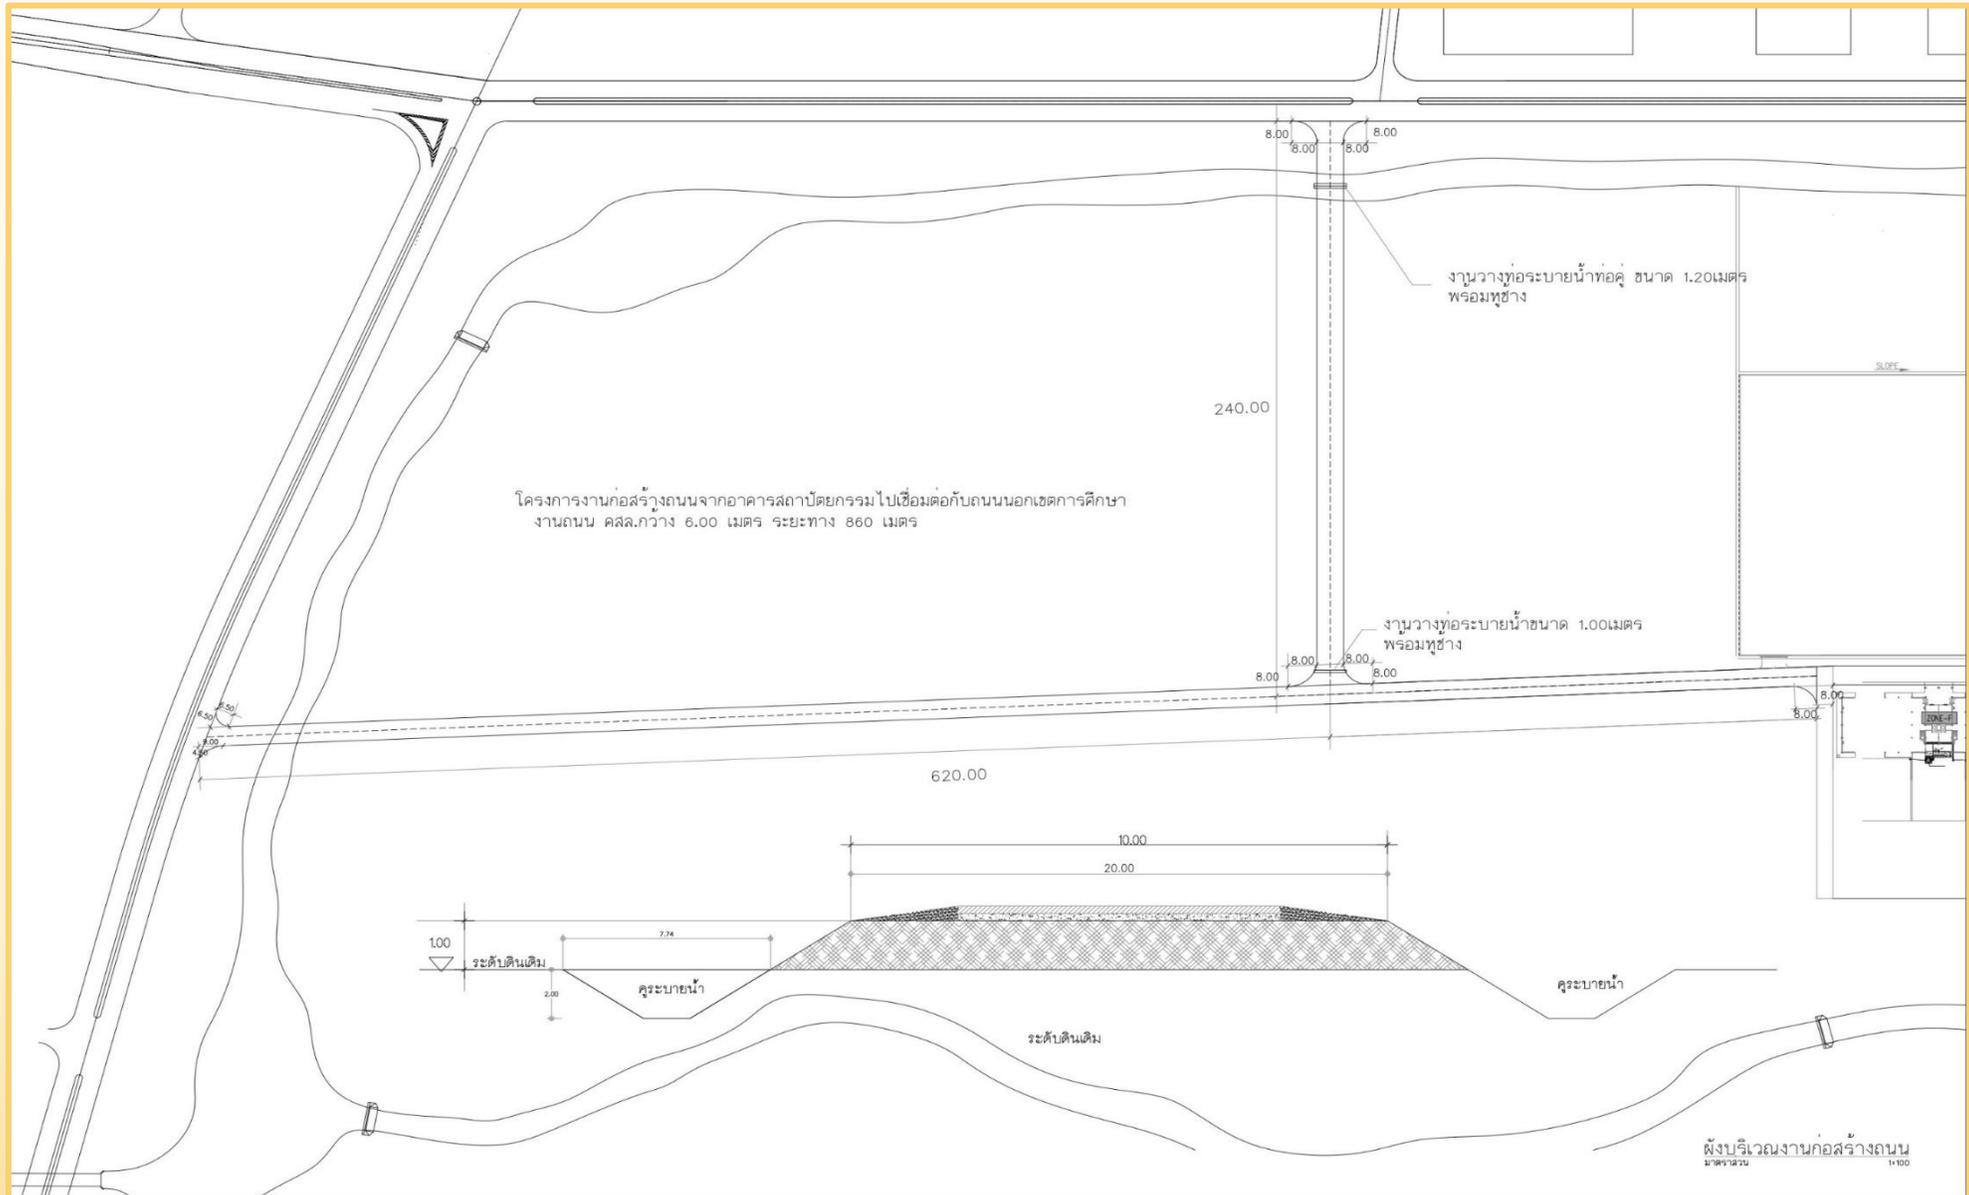





โครงการก่อสร้างถนนจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบไปเชื่อมต่อกับถนนนอกเขตการศึกษาด้านทิศตะวันตก



ความก้าวหน้างาน

งานถนนแนวนอน 620 เมตร

1. งานปรับเกรดหินคลุกเดิม พร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 90 %
2. งานเทคอนกรีตพื้นถนน ได้ 200 ม. แล้วเสร็จ 33 %
3. งานติดตั้งท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ 80 %








ความก้าวหน้างาน


งานถนนแนวตั้ง 240 เมตร


1. งานขุดร่องระบายน้ำ แล้วเสร็จ 90 %
2. งานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 70 %
3. งานติดตั้งท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ 70 %



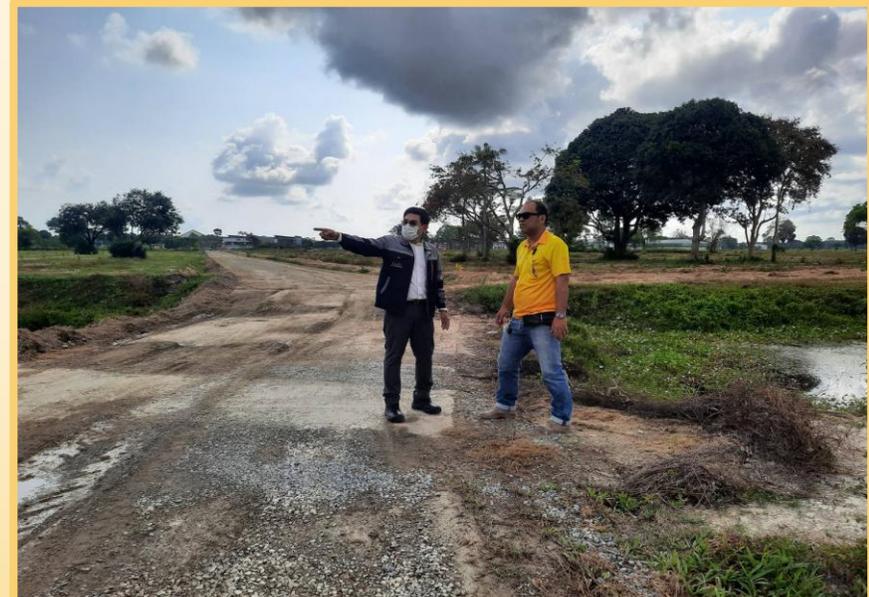

ผู้รับจ้าง เลขที่สัญญา วงเงินก่อสร้าง		บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 068/2568 ลงวันที่ 10 ม.ค. 68 60,000,000.00 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว เหลือระยะเวลา		11 ม.ค. 68 – 6 ม.ค. 69 (360 วัน) 42 วัน (11.66%) 304 วัน (88.34%)
ความก้าวหน้างาน งวดงาน จำนวนแรงงานเฉลี่ย		3.92% 0/9 งวด 30 คน

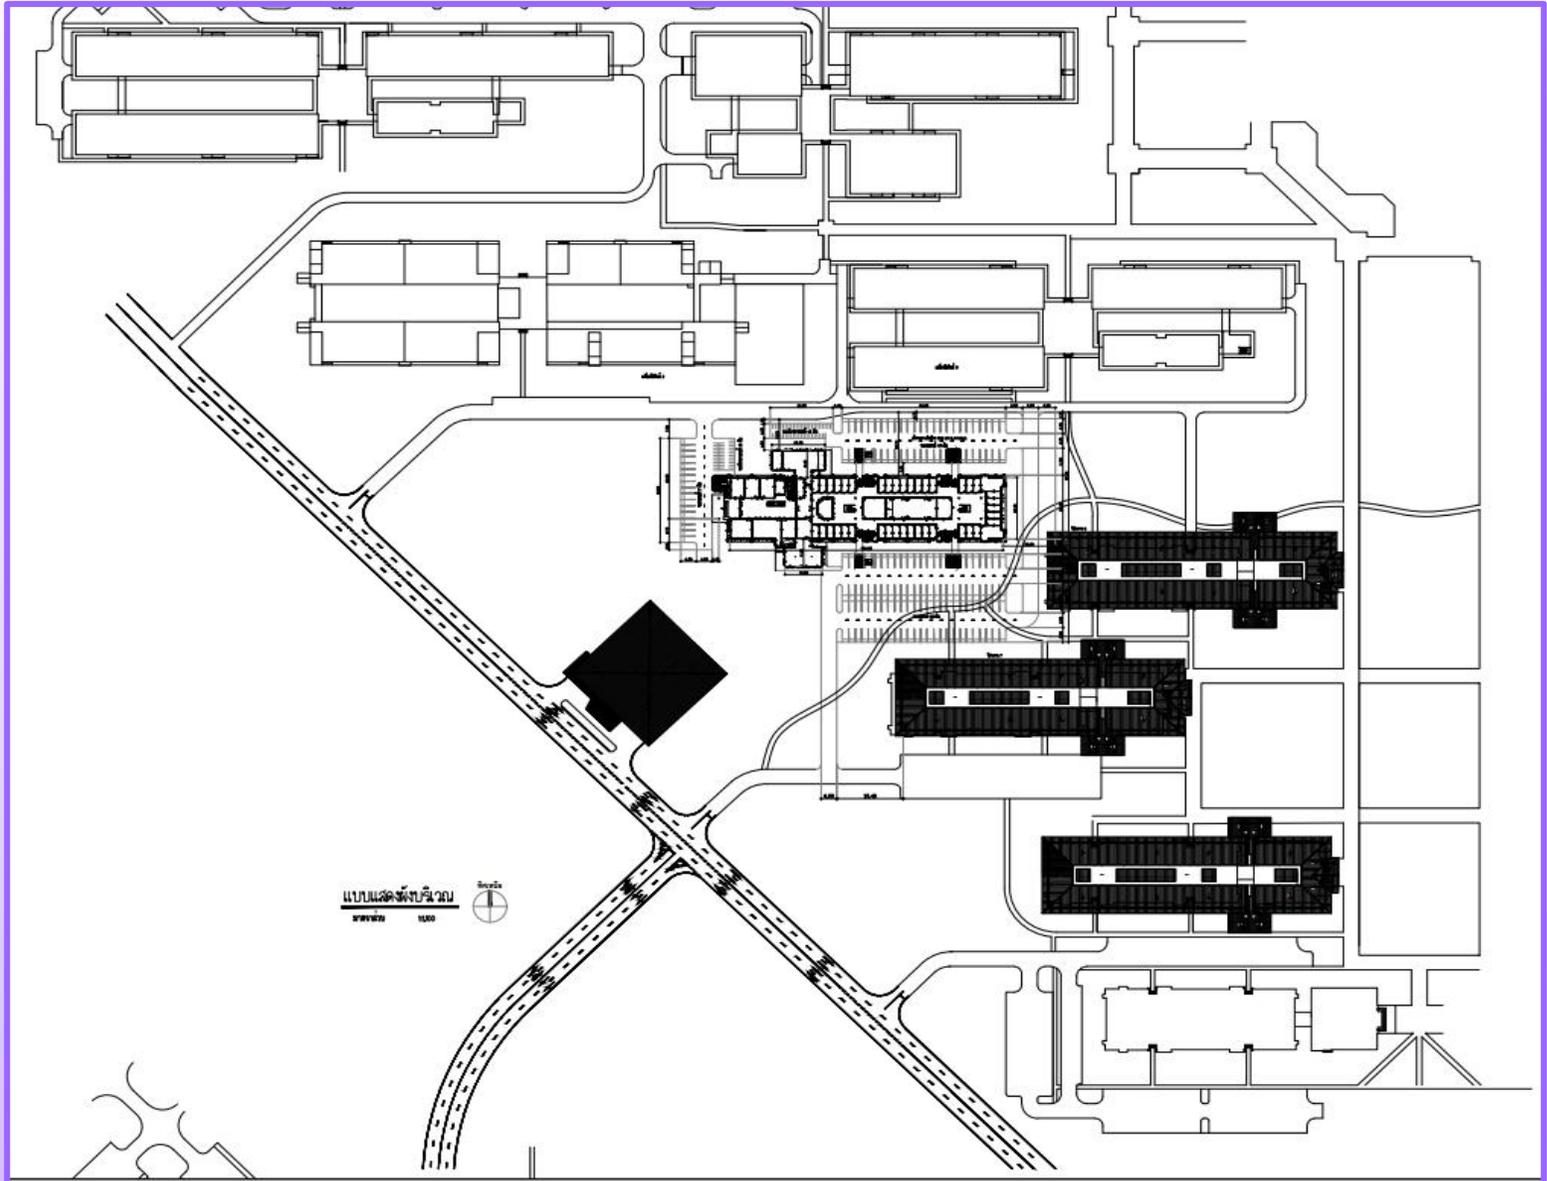

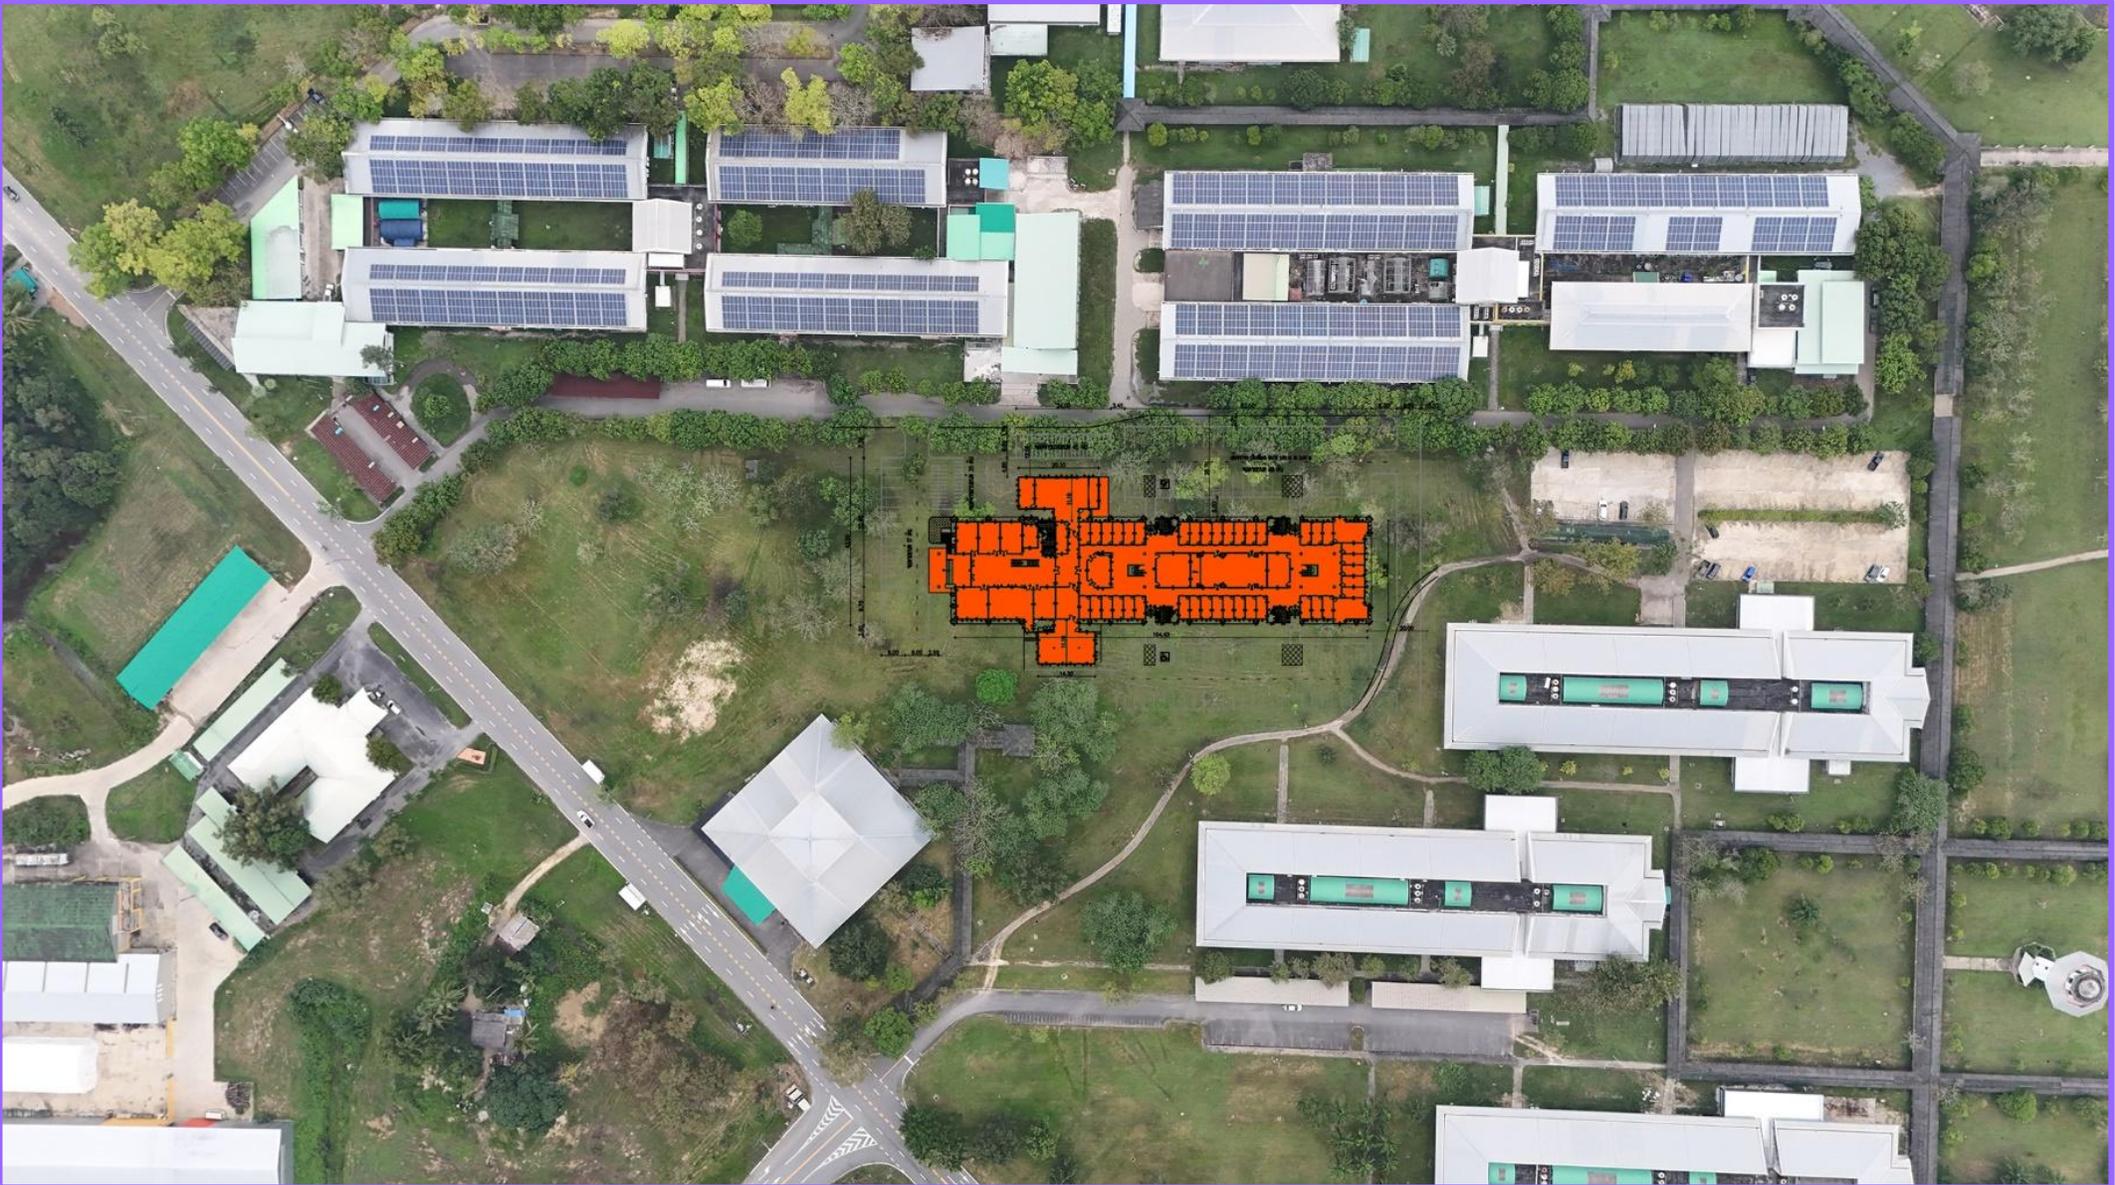









ความก้าวหน้างาน

1. งานวางผังอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
2. งานตอกเสาเข็ม 309 ต้น แล้วเสร็จ 172 ต้น 55 %
(งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด ต้นเดือน มี.ค. 68)
3. งานตัดเสาเข็มที่ระดับ PILE CUT OFF แล้วเสร็จ 18 %
4. งานเทคอนกรีตฐานราก 94 ฐาน แล้วเสร็จ 10 ฐาน 10.64 %

งานงวดที่ 1 จะส่งได้ประมาณ ต้นเดือน มี.ค. 68





14

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านสังคม

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
124/2568 ลงวันที่ 21 ก.พ. 68
79,500,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา




22 ก.พ. 68 – 28 มี.ค. 69 (400 วัน)
0 วัน (0.00%)
400 วัน (100.00%)


ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย




0.00 %
0/12 งวด
-

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านสังคม

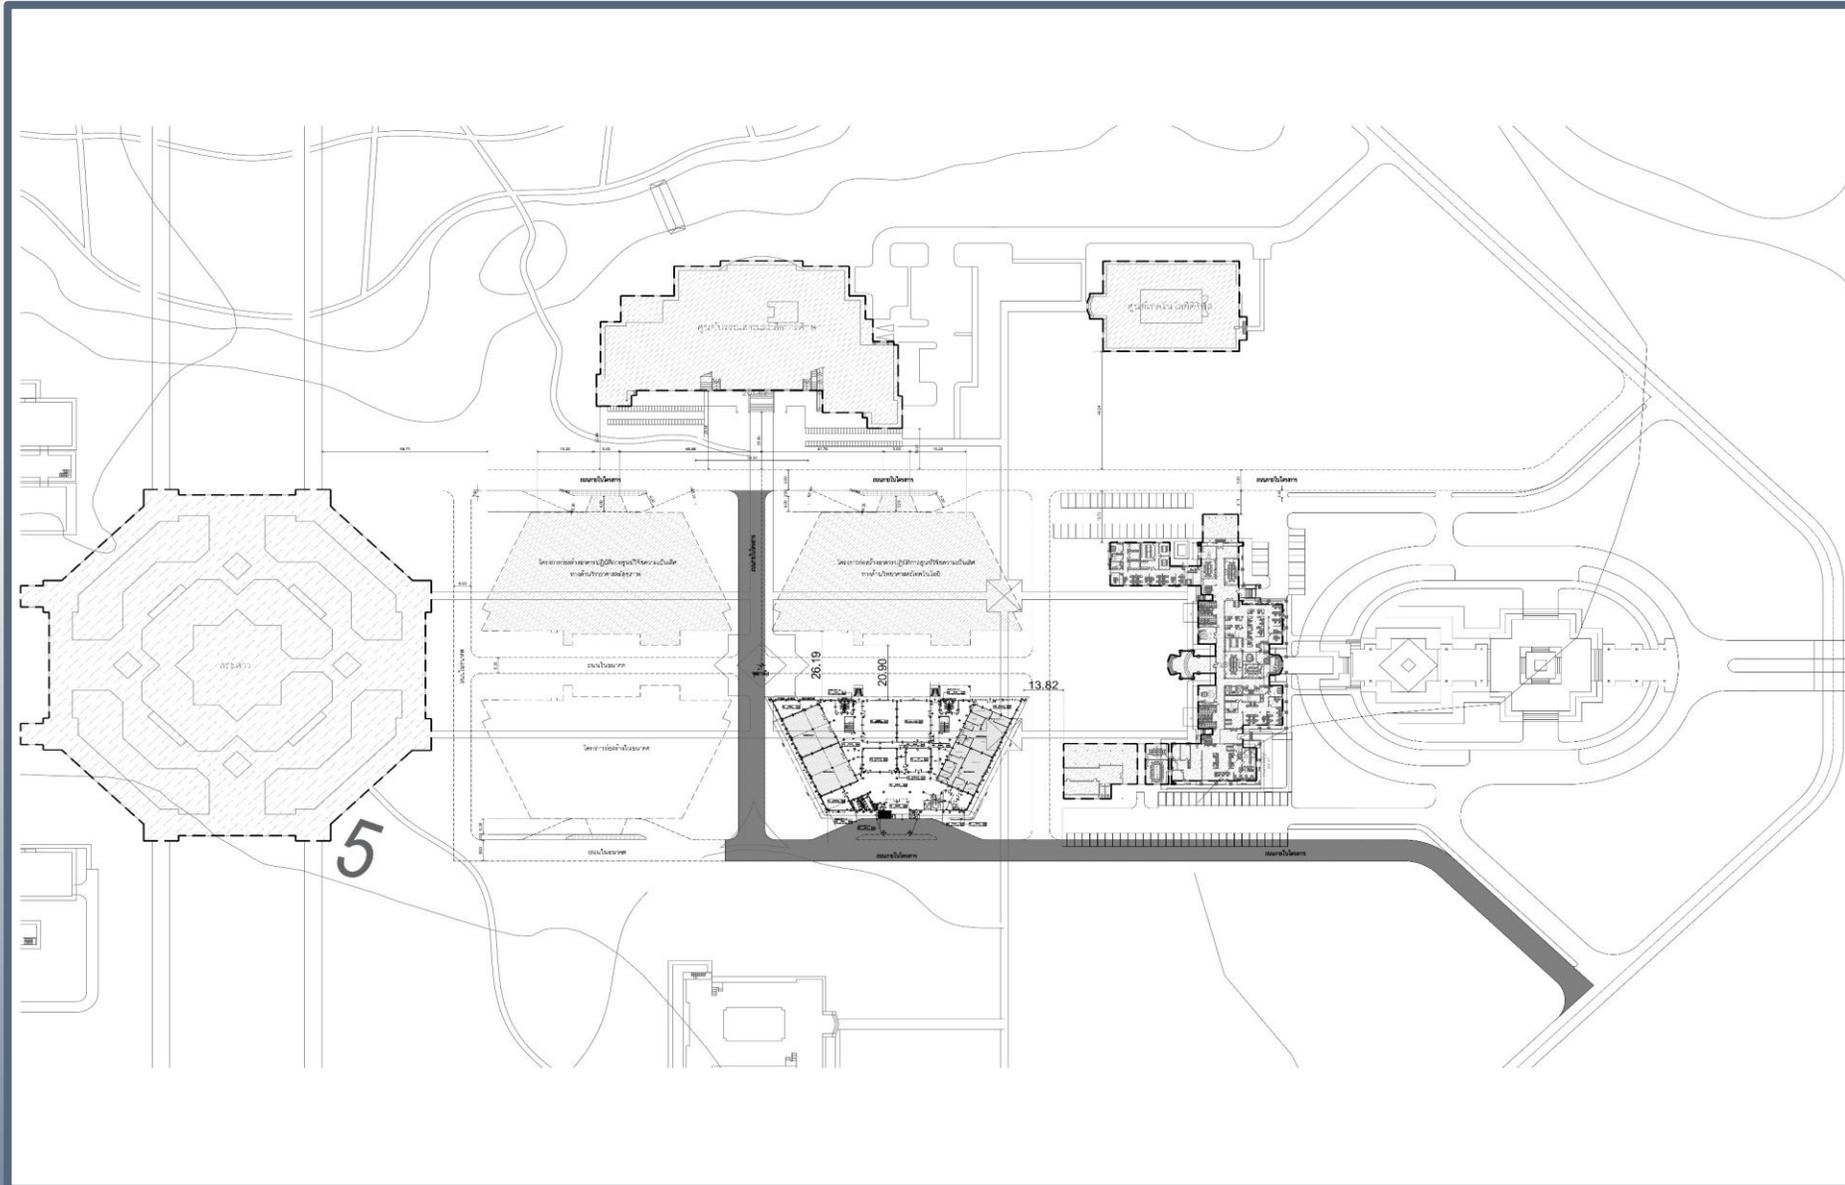

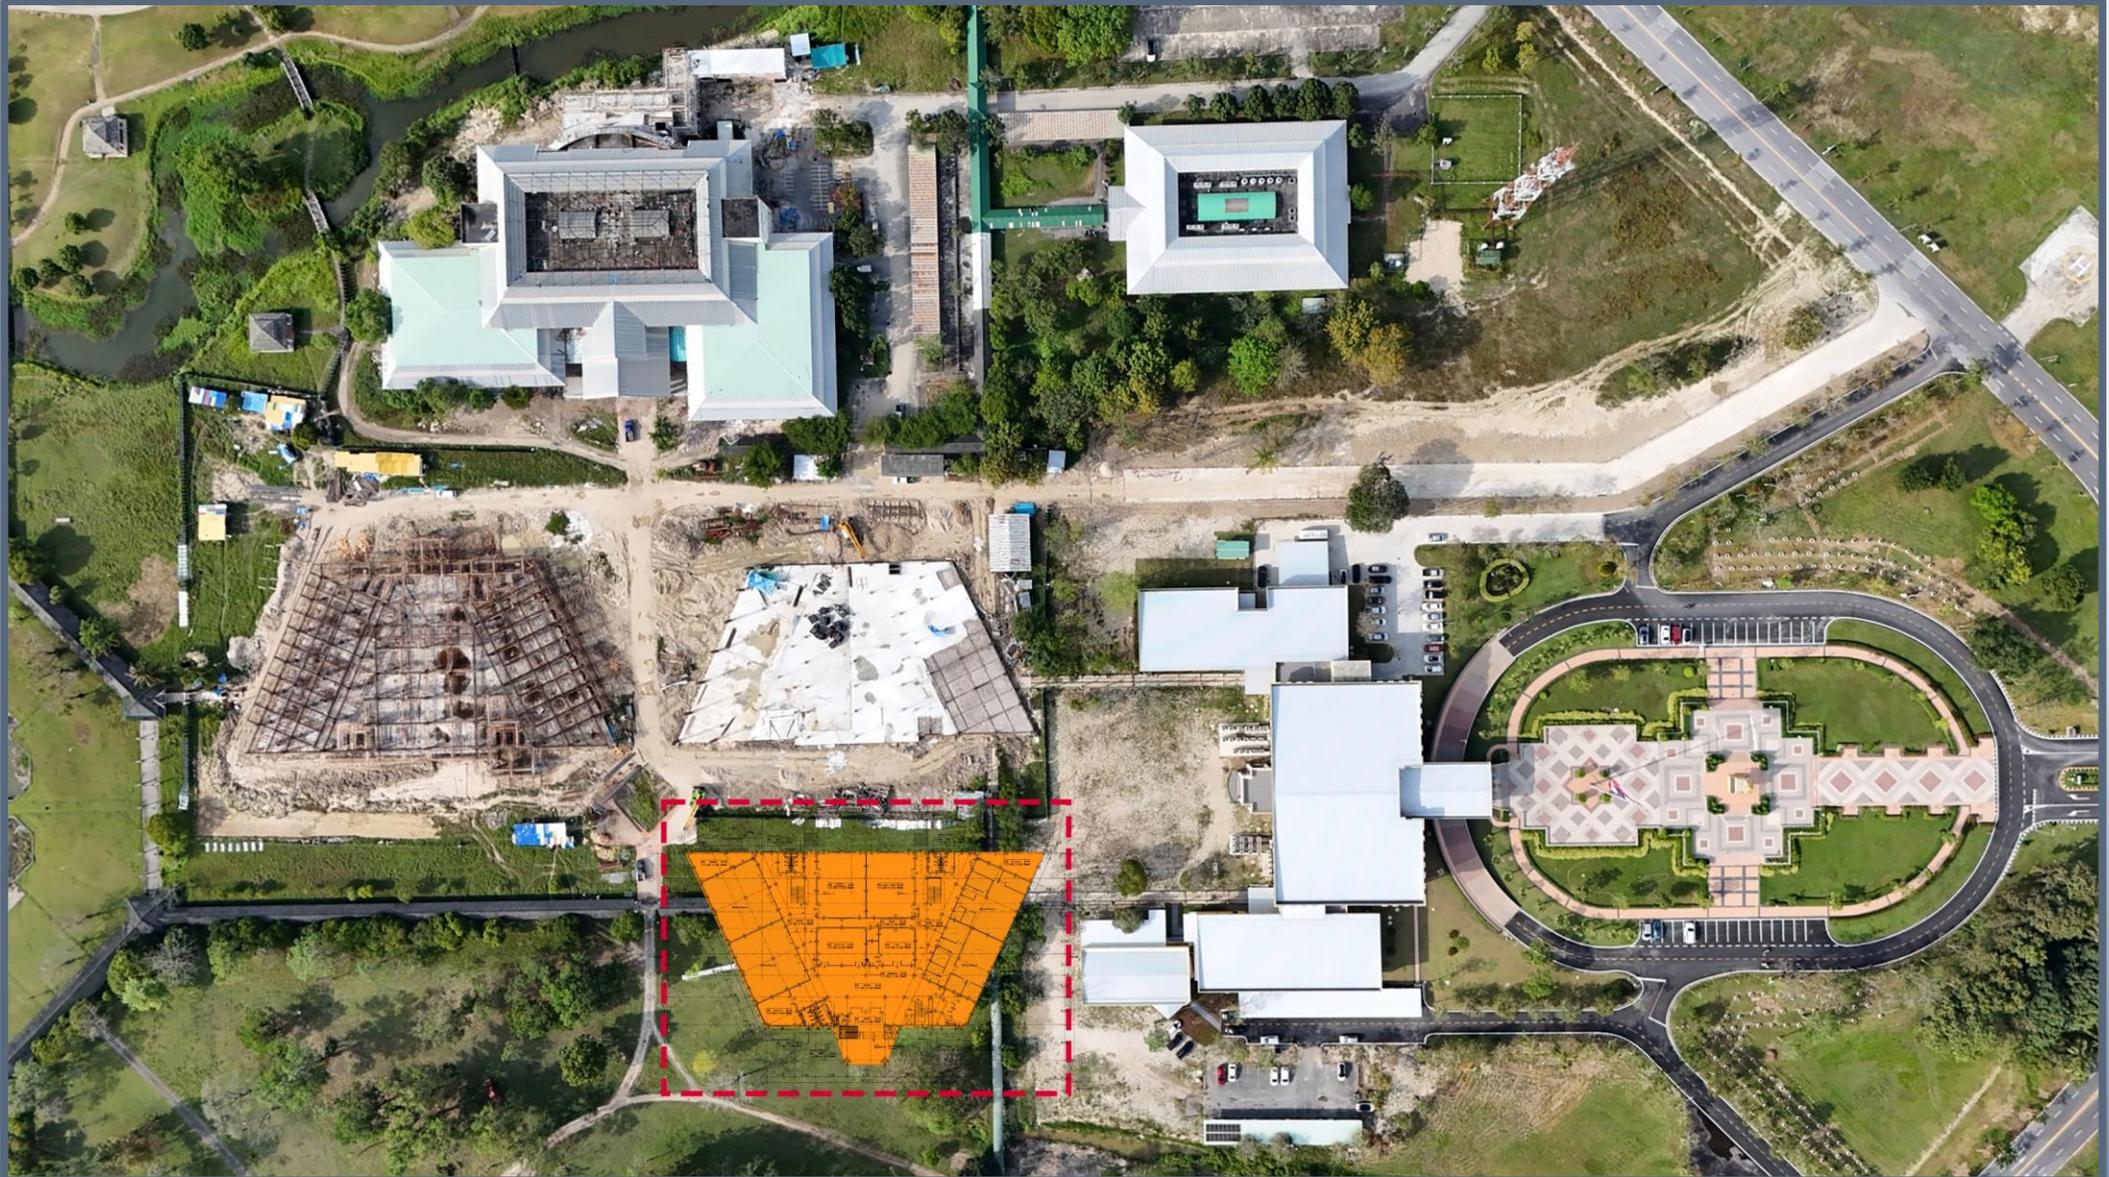



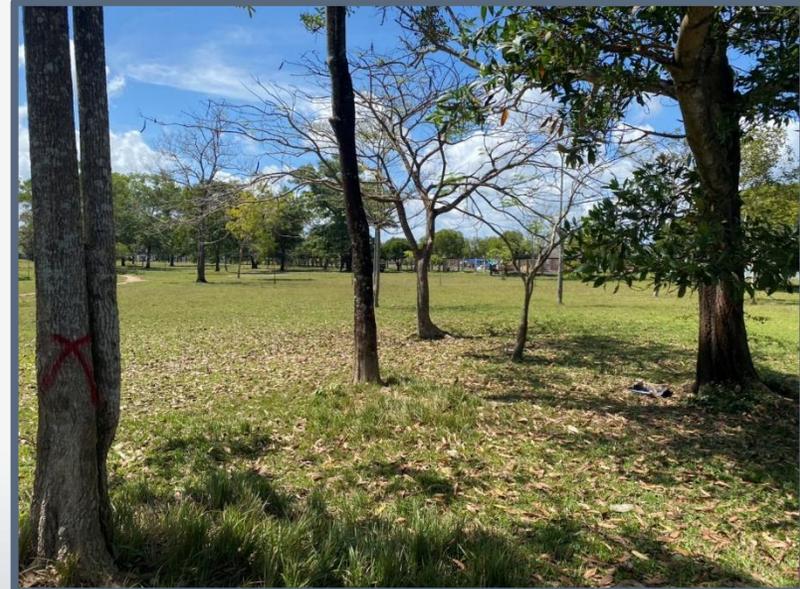

15

โครงการก่อสร้างศูนย์ธุรกิจชุมชน

ผู้รับจ้าง
เลขที่สัญญา
วงเงินก่อสร้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อยก่อสร้าง
023/2568 ลงวันที่ 27 พ.ย. 67
1,550,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง
ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้ว
เหลือระยะเวลา



28 พ.ย. 67 – 9 เม.ย. 68 (133 วัน) (แบบท้ายครั้งที่ 1)
86 วัน (64.66%)
49 วัน (32.34%)

ความก้าวหน้างาน
งวดงาน
จำนวนแรงงานเฉลี่ย



58.00 %
1/3 งวด
10 คน







ความก้าวหน้างาน

1. งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 98 %
2. งานระบบสุขาภิบาล+ไฟฟ้า ของโรงเรือน อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. งานระบบเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100 %






ความก้าวหน้างาน

1. งานโครงสร้าง+มุงหลังคา+ก่ออิฐ+ฉาบปูน แล้วเสร็จ 100 %
2. งานระบบสุขาภิบาลในผนัง แล้วเสร็จ 100 %
3. งานที่กำลังดำเนินการ
 - * งานปูกระเบื้องผนัง พื้น
 - * งานติดตั้งสุขภัณฑ์
 - * งานระบบไฟฟ้า

งานงวดที่ 2 ส่งต้นเดือน มี.ค. 68

* งานจะแล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 15 มี.ค. 68

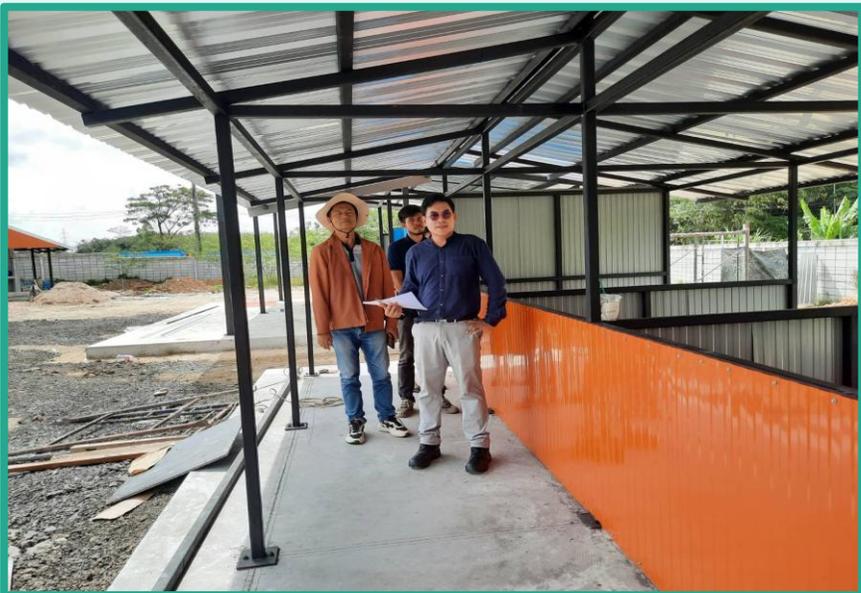















THANK YOU



WALAILAK UNIVERSITY

CONSTRUCTION INSPECTOR
TEAM

